


柏崎刈羽原子力発電所6号機 耐震強化工事実施状況

平成20年10月9日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

項目※	実施状況※
1. 配管等サポート (配管、空調ダクト、電線管など)	実施中 (平成20年7月4日～)
2. 原子炉建屋屋根トラス	実施中 (平成20年9月3日～)
3. 排気筒	実施中 (平成20年9月5日～)
4. 原子炉建屋天井クレーン	準備中 (平成20年10月20日～予定)
5. 燃料取替機	実施中 (平成20年8月22日～)

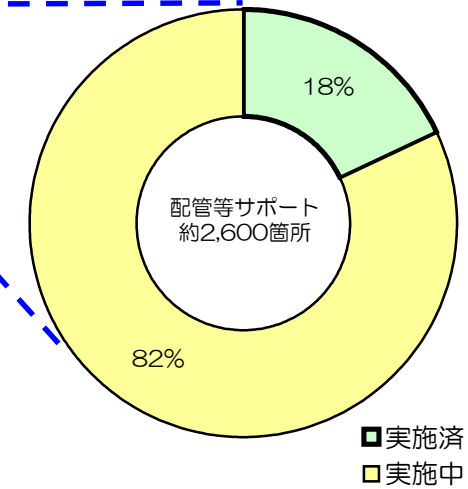


※ 耐震強化対象箇所の評価を引き続き実施中であるため、項目、対象箇所数等は変わる可能性がある。
また、今後の基準地震動（ S_s ）の審議状況を適切に反映し、必要に応じて耐震強化対象箇所・内容の見直しの対応を行う。

柏崎刈羽原子力発電所7号機 耐震強化工事実施状況

平成20年10月9日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

項目※	実施状況※
1. 配管等サポート (配管、空調ダクト、電線管など)	実施中 (平成20年6月16日～)
2. 原子炉建屋屋根トラス	完了 (平成20年9月30日)
3. 排気筒	実施中 (平成20年9月5日～ 10月15日予定)
4. 原子炉建屋天井クレーン	実施中 (平成20年9月16日～ 10月27日予定)
5. 燃料取替機	実施中 (平成20年8月8日～ 11月2日予定)

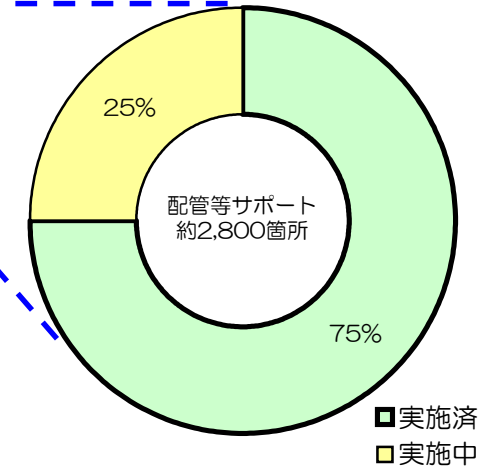

※ 耐震強化対象箇所の評価を引き続き実施中であるため、項目、対象箇所数等は変わる可能性がある。
また、今後の基準地震動（Ss）の審議状況を適切に反映し、必要に応じて耐震強化対象箇所・内容の見直しに対応を行う。
