


# 柏崎刈羽原子力発電所1号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機能試験に係る進捗状況

別紙

平成22年6月15日  
東京電力株式会社

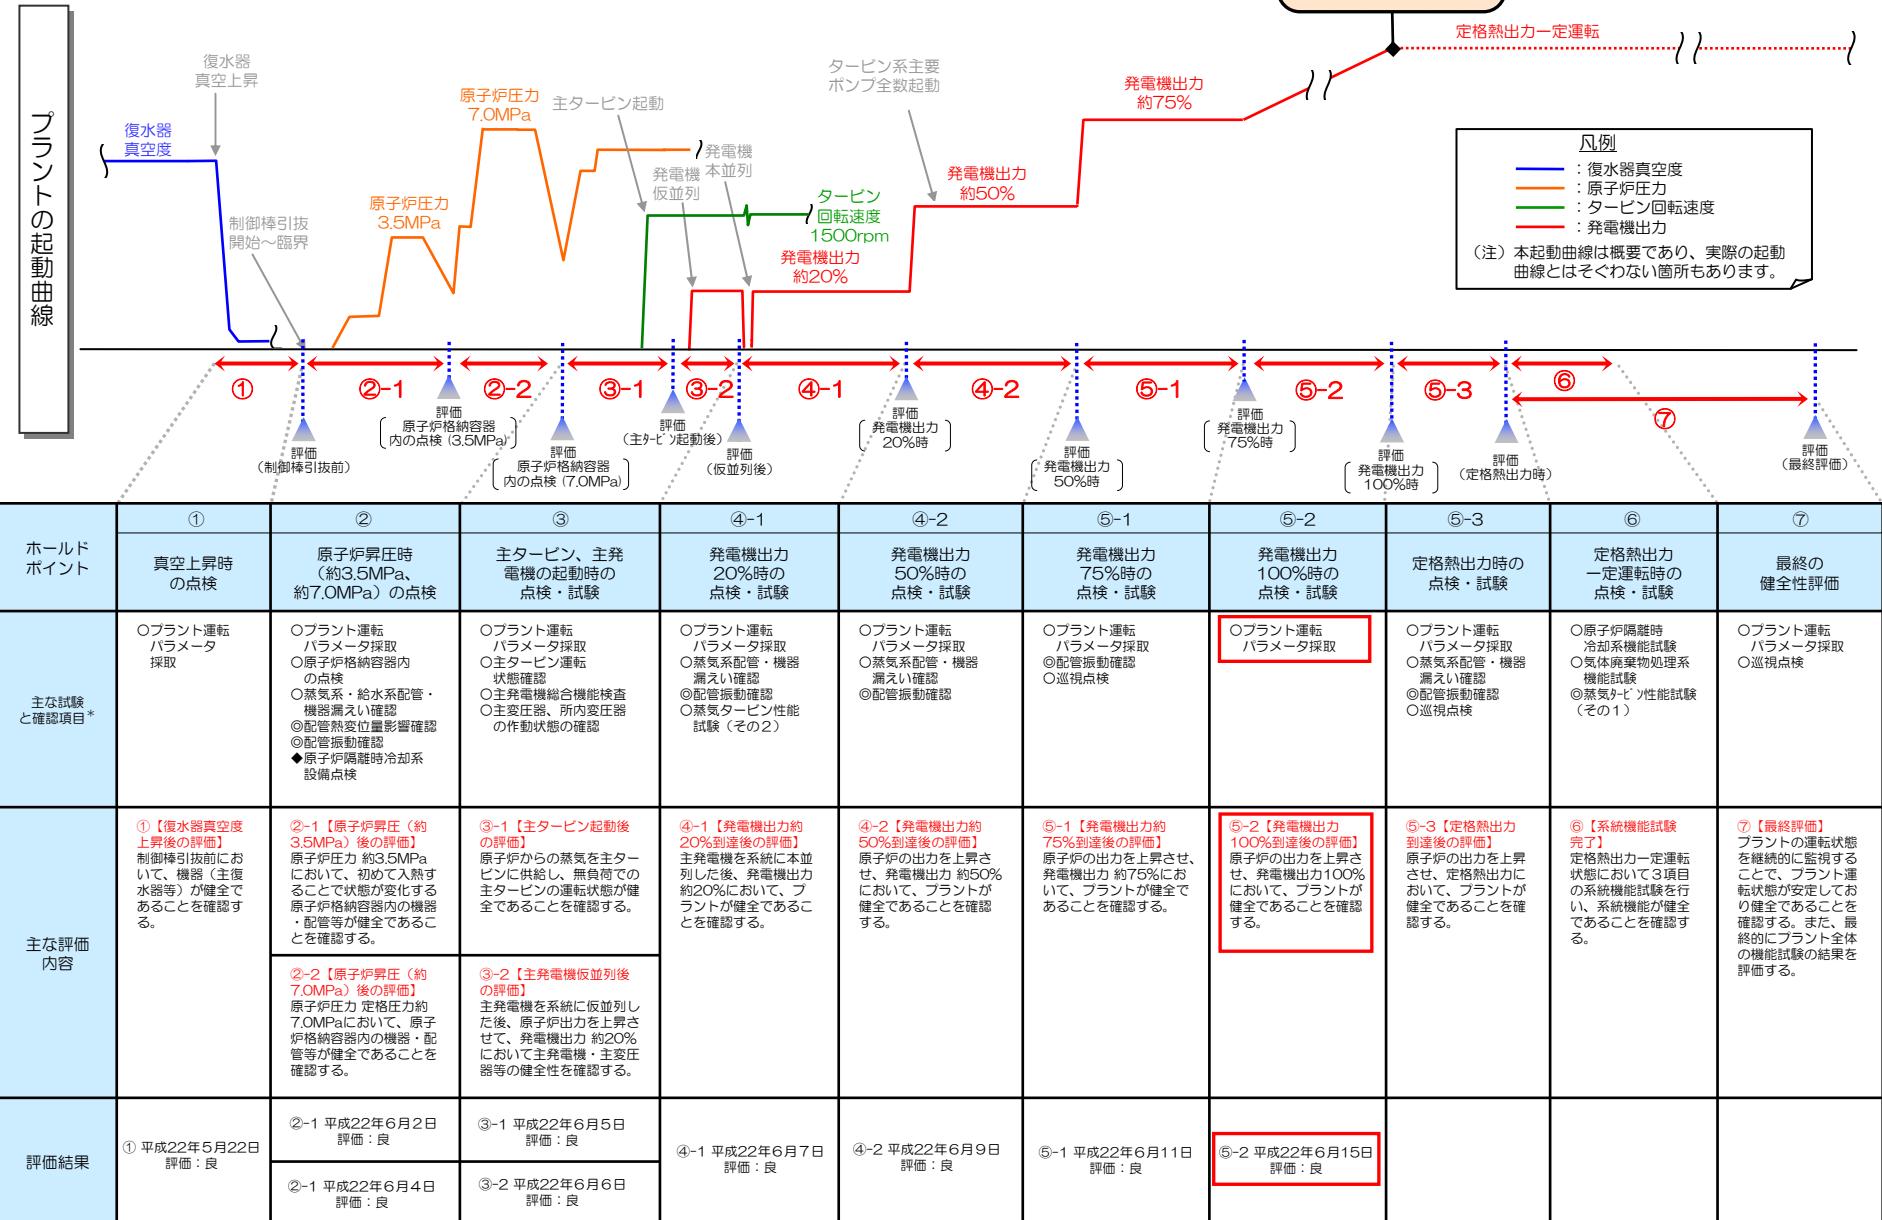

# 評価結果 ⑤-2 発電機出力100%到達後の評価

平成22年6月15日 評価完了：良

## < 主な評価内容 >


原子炉の出力を上昇させ、発電機出力 100%において、プラントが健全であることを確認する。

## < 主な試験・確認項目 >

プラント運転パラメータ採取 等

## < 次工程 >

原子炉の出力を上昇させ、原子炉熱出力を定格にする。

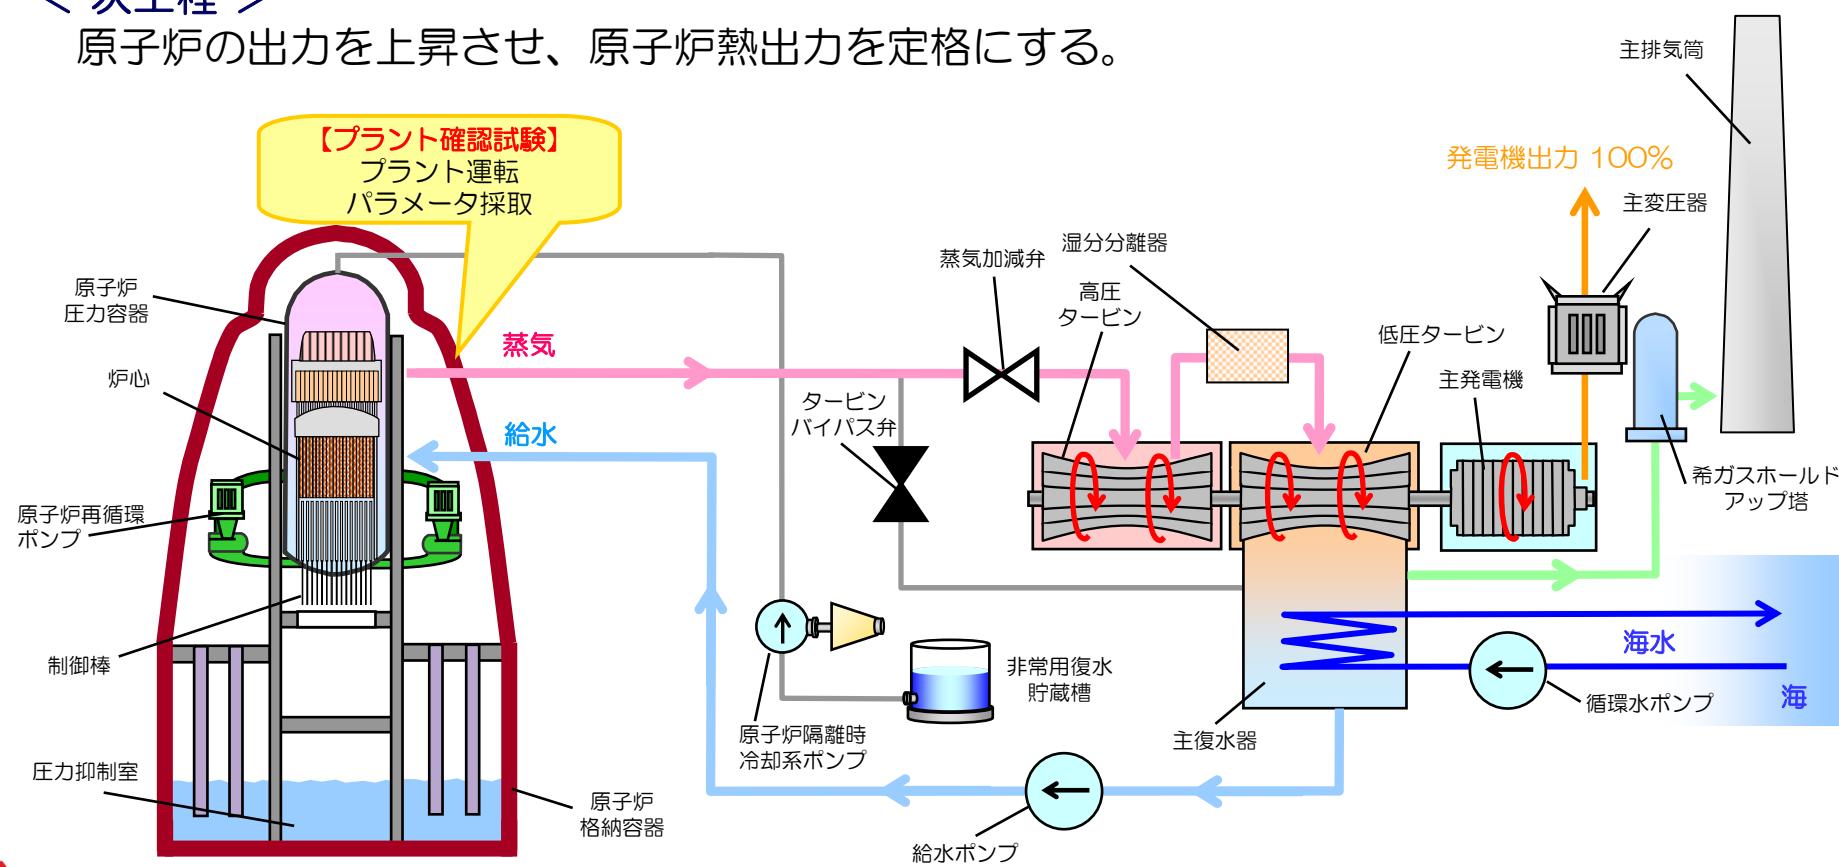

## 次工程 ⑤-3 定格熱出力到達後の評価

### < 主な評価内容 >

原子炉の出力を上昇させ、定格熱出力において、プラントが健全であることを確認する。

### < 主な試験・確認項目 >

プラント運転パラメータ採取、蒸気系配管・機器漏えい確認、  
配管振動確認、巡視点検 等

