


使用済燃料プール対策 スケジュール


分野	項目	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	スケジュール												備考										
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	以降														
使用済燃料プール対策	燃料取り出し用カバリの撤去	燃料取り出し用カバリの詳細設計の検討 原子炉建屋上部のガレキの撤去 燃料取り出し用カバリの設置工事	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	15	22	29	5	12	19	26	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
			検討・設計	大型カバリ、ガレキ撤去の検討・設計 (2026年度完了予定)																						
			現場作業	①現地調査等(13/7/25~) ②作業ヤード整備、構外ヤード地組、外壁調査等 ③-1:大型カバリ仮設構台等設置 ③-2:R/B壁面アンカー設置、ベースプレート設置 ③-3:本構鉄骨建方等 【構外】大型カバリ換気設備他準備工事																						
			現場作業	【主要工程】 ○ガレキ撤去 ・ガレキ撤去:18/1/22~20/11/24(大型カバリ設置後に再開予定) ・Xプレス撤去:18/9/19~18/12/20 ・屋根ハッチ養生:19/1/11~19/3/6 ・屋根鉄骨分断:19/2/5~19/2/22 ・SFP周辺ガレキ撤去:19/3/18~20/9/18 ・フェルフラグ調査:19/7/17~19/8/26 ・SFP内干渉物等調査:19/8/2、19/9/4~6、9/20、27 ・フェルフラグ上のH鋼撤去:19/8/28 ・FHM下部支障物撤去:20/3/3~20/3/14 ・SFPゲートカバリ設置:20/3/16~20/3/18 ・SFP養生設置(準備作業含む):20/3/20~20/6/18 ・FHM支保設置(準備作業含む):20/9/15~20/10/23 ・天井クレーン支保設置(準備作業含む):20/10/28~20/11/24 ○大型カバリ設置 ・残置カバリ解体(準備作業含む):20/11/25~21/6/19 ・大型カバリ仮設構台等設置:21/8/28~ ・外壁調査:21/10/20~ ・大型カバリ換気設備他準備工事:21/10/19~ ・大型カバリアンカー及びベースプレート設置:22/4/13~ 【規制庁関連】 ・オペレーティングフロア床上加レキの一部撤去等 実施計画変更認可(19/3/1) ・大型カバリ 実施計画変更申請(21/6/24) ・大型カバリ換気設備他 実施計画変更認可(22/10/27) ※○番号は、別紙配置図と対応																						
			検討・設計	燃料取り出し用構台の検討・設計 (2024年度完了予定)																						
			現場作業	【構外】燃料取り出し用構台設置(鉄骨地組) 構台鉄骨準備工事(ヤード整備等) 構台鉄骨工事 ⑤燃料取扱機操作室撤去(片付) 最新工程反映 ⑤オヘフロ南側取設備撤去(準備・撤去・片付) ⑤オヘフロ南側取設備撤去(準備・撤去・片付) ⑤原子炉建屋オヘフロ除染(その2)(準備・撤去・片付)																						
			現場作業	【主要工程】 ○ヤード・構台作業関連 ・燃料取り出し計画の選択:19/10/31 ・ヤード整備工事:15/3/11~16/11/30 ・西側構台設置工事:16/9/28~17/2/18 ・前置設備工事:17/3/9~17/5/16 ・屋根保護撤去(遠隔重機作業):18/1/22~18/5/11 ・オペレーティングフロア西側外壁開口:18/4/16~18/6/21 ・鉄骨トラス状況確認:18/2/28~18/3/17 ・西側構台設備点検:19/2/13~19/3/26 ・地盤改良工事:21/10/28~22/4/19 ・構台基礎工事:22/6/16~22/11/29 ・構台鉄骨建方:23/1/23~24/1/末 ○オヘフロ作業関連 ・オペレーティングフロア調査:18/6/25~21/3/10 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け:18/8/23~20/12/11 ・SFP内調査:20/4/27~20/6/30(調査:20/6/10~20/6/11) ・【構外】原子炉建屋オヘフロ除染作業検証:21/3/15~21/7/21 ・原子炉建屋オヘフロ除染(その1):21/6/22~22/1/31 ・原子炉建屋オヘフロ遮蔽体設置(その1):21/9/21~22/5/27 ・燃料交換機移動:22/5/30~22/6/30 ・燃料取扱機操作室撤去:22/7/1~22/11/29 追加 ・オヘフロ南側取設備撤去:22/12/上旬~23/3/下旬 ・原子炉建屋オヘフロ除染(その2):23/4/上旬~ 【規制庁関連】 ・西側外壁開口設置 実施計画変更認可(17/12/21) ・燃料取り出し用構台・付帯設備 実施計画変更認可(22/4/22) ・燃料取扱設備 実施計画変更申請(20/12/25) 実施計画変更申請(22/3/22) 実施計画変更認可(22/12/23) ※○番号は、別紙配置図と対応																						
			検討・設計	燃料取り出し設備の検討・設計 (2026年度完了予定)																						
			検討・設計	燃料取り出し設備の検討・設計 (2024年度完了予定)																						
			現場作業	燃料取り出し 6号機使用済燃料の撤去 使用済燃料撤出作業 (2025年度完了予定)																						
燃料取り出し	燃料受け入れ	燃料受け入れ	燃料受け入れ	使用済燃料受け入れ作業 (2025年度完了予定)																						
			乾式キャスク製作	乾式キャスク製作・検査 継続製作用中																						
			共用プール	共用プール空き容量確保(既設仮保管設備受入) 乾式キャスク撤出作業 乾式キャスク仮保管設備エリア増設 (2023年4月完了予定)																						
			乾式保管設備(共用プール用)検討・設計・設置工事	乾式保管設備(共用プール用)検討 継続検討中																						
			高線量機器取り出し	高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作 (2025年度完了予定) プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去 輸送作業確認(ワンスルー確認) 高線量機器取り出し (2024年度完了予定) 高線量機器取り出し (2025年度完了予定)																						
燃料取り出し	制御棒等高線量機器取り出し	制御棒等高線量機器取り出し	高線量機器取り出し方法の検討	高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作 (2024年度完了予定)																						
			高線量機器取り出し方法の検討	高線量機器取り出し方法の検討																						

廃炉中長期実行プラン2022

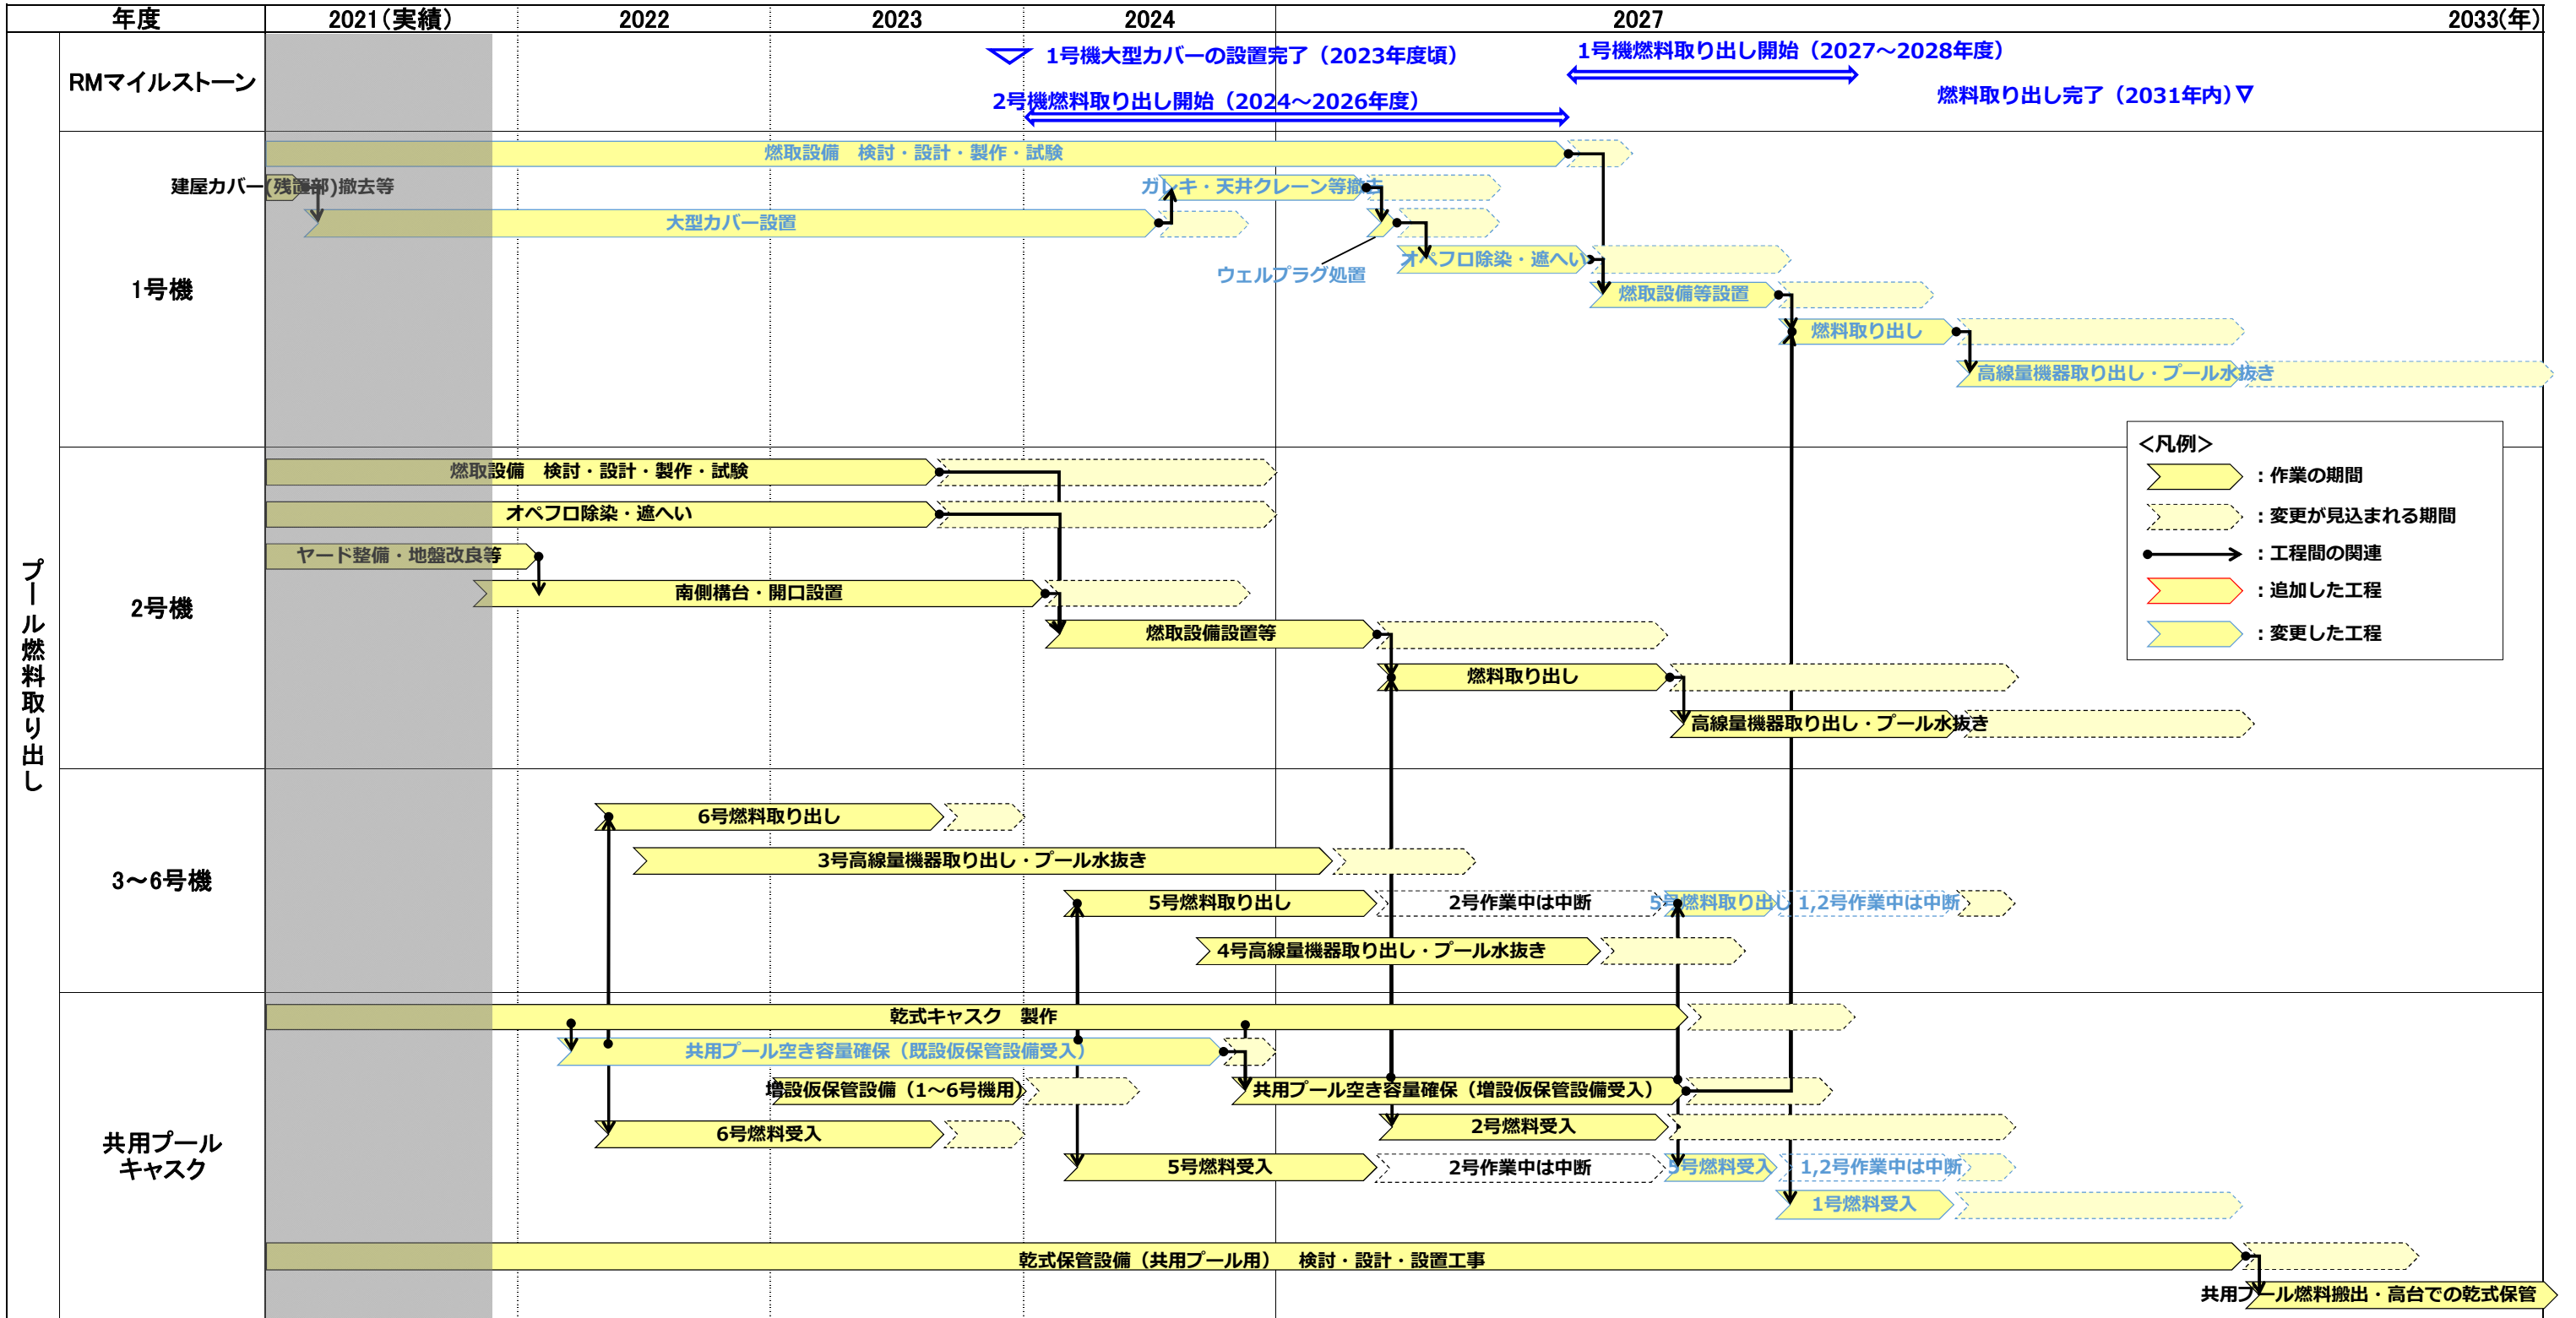

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

1, 2, 3号機 原子炉建屋上部瓦礫撤去工事 燃料取り出し用カバー工事 他 作業エリア配置図

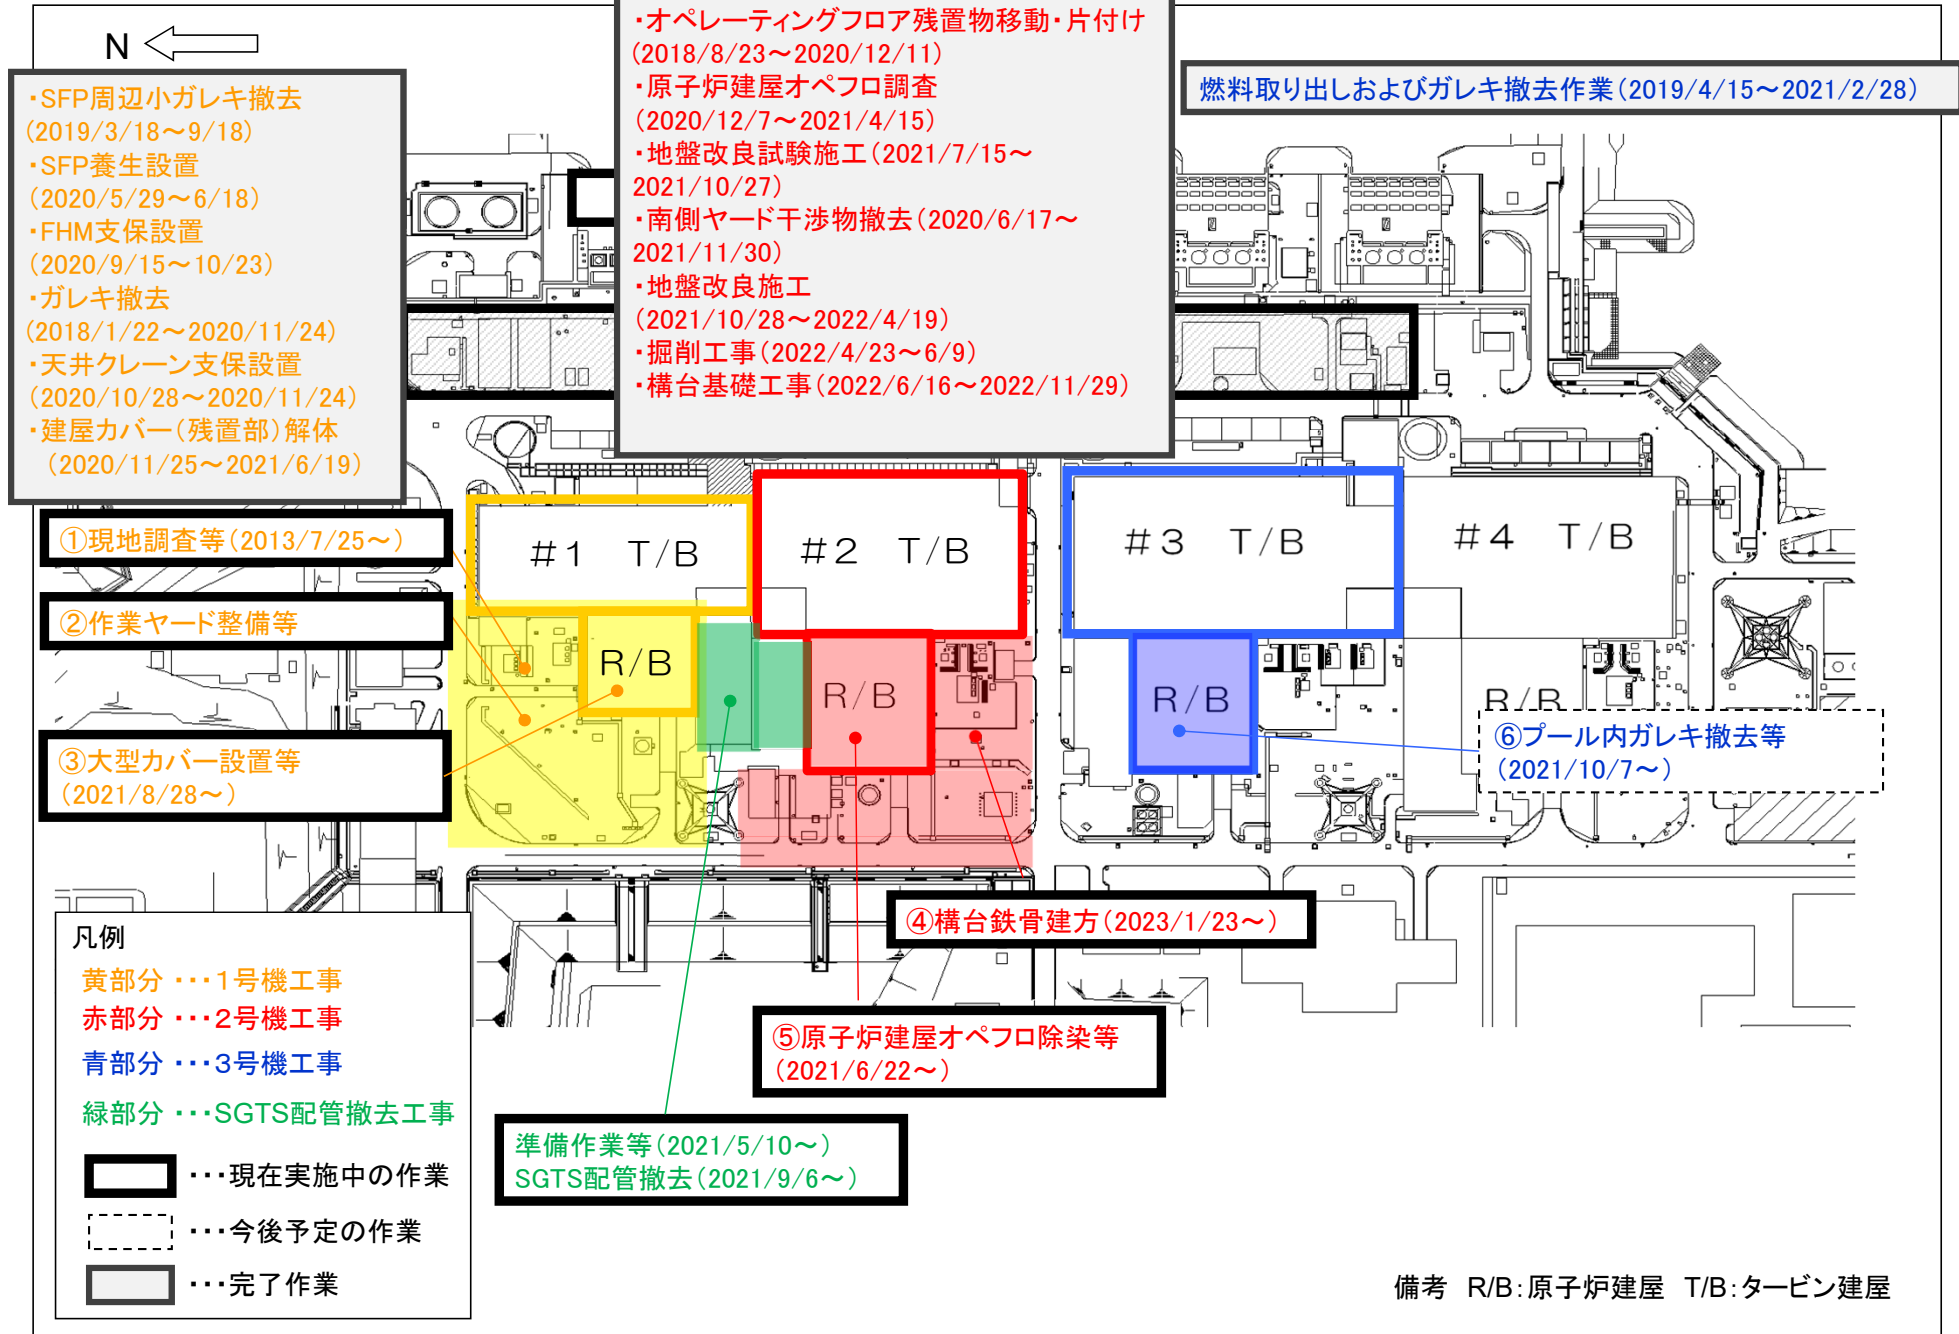

1号機燃料取り出しに向けた工事の進捗について

2023年2月22日

TEPCO





東京電力ホールディングス株式会社

燃料取り出し計画の概要

- 原子炉建屋を覆う大型カバーを先行設置し、大型カバー内のガレキ撤去用天井クレーンや解体重機を用いて、ガレキ撤去を実施する。
- その後、オペレーティングフロアの除染・遮蔽を実施し、燃料取扱設備（燃料取扱機、クレーン）を設置した上で、使用済燃料プールから燃料取り出しを実施する。

大型カバー設置完了
(2023年度頃)


燃料取り出し開始
(2027~2028年度)

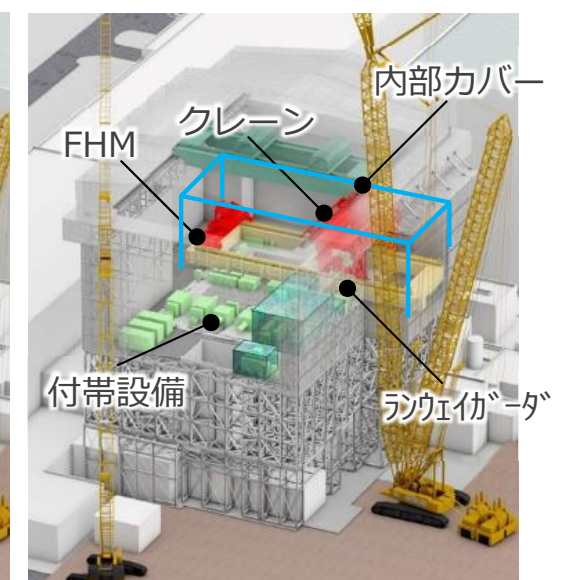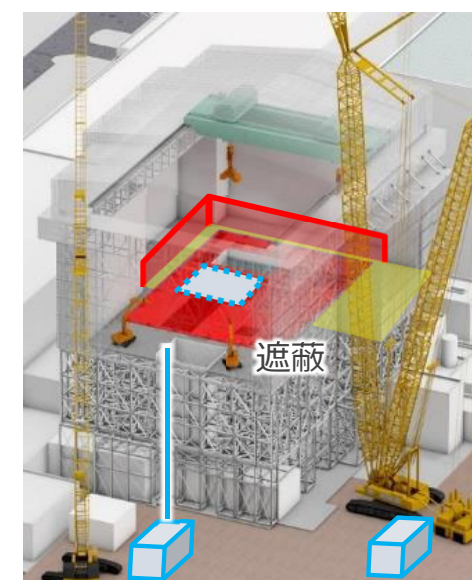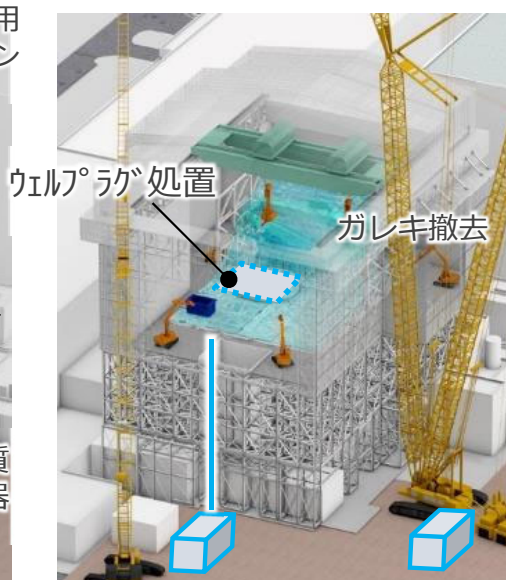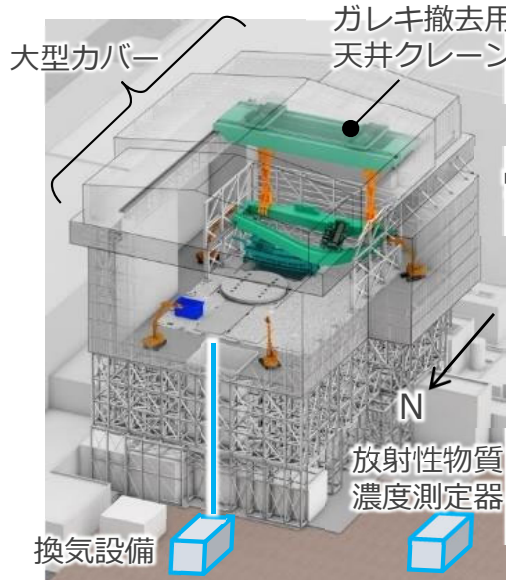


※イメージ図につき実際と異なる部分がある場合がある

大型カバー設置工事の進捗状況（構外）

- 大型カバー設置へ向けた鉄骨等の地組作業等を，構外ヤードで実施中である。
- 現在，仮設構台，下部架構の地組が完了し，上部架構の地組が約83%完了している。

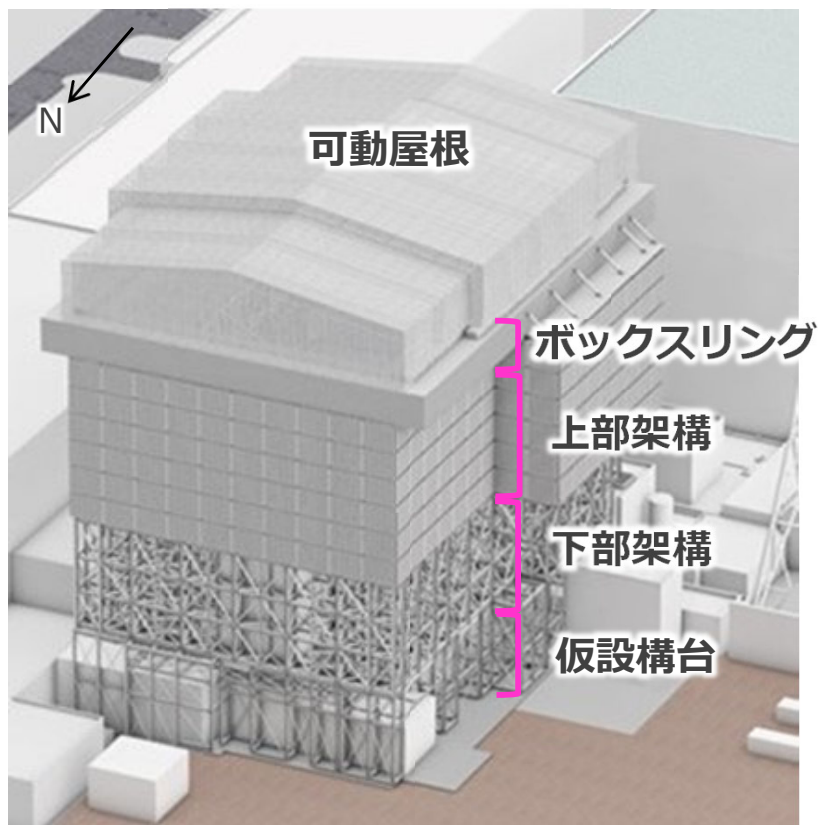


大型カバー全体の概要図

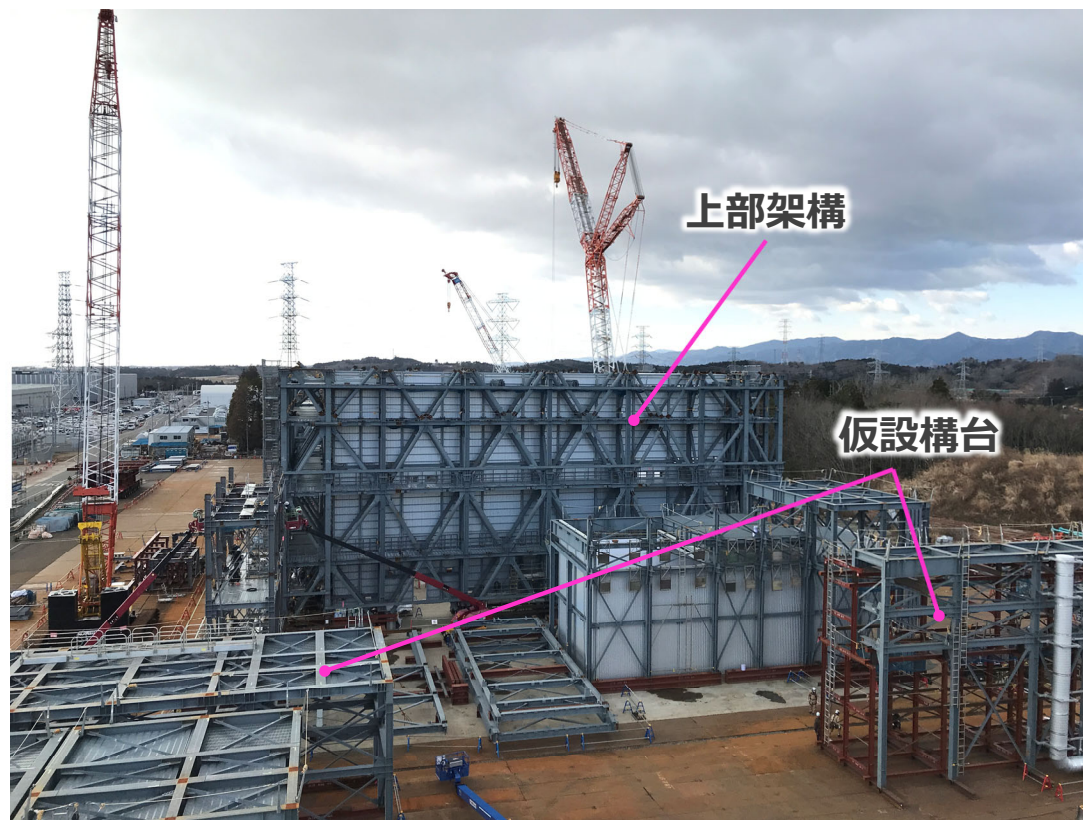


構外ヤード全景（撮影：2023年2月20日）

- 仮設構台の頂部と近接するアンカーおよびベースプレートの設置を終えた箇所より、仮設構台を設置している。
- 今後実施予定である、オペレーティングフロアレベル近傍でのアンカー削孔作業において、作業に干渉するガレキ※1の撤去を3月より先行して開始する。


※1 以下、はみ出しガレキという



※2 南面4箇所の外壁調査はSGTS配管撤去等が完了次第実施

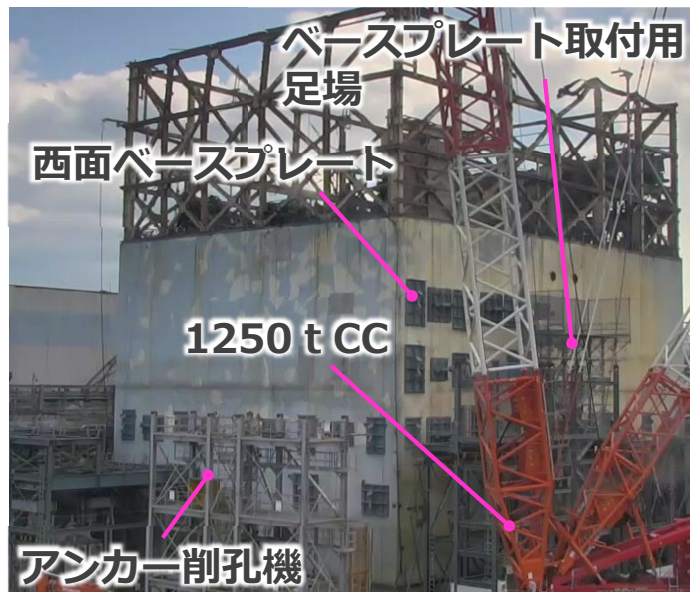


現場状況（北西面）
(撮影：2023年2月9日)

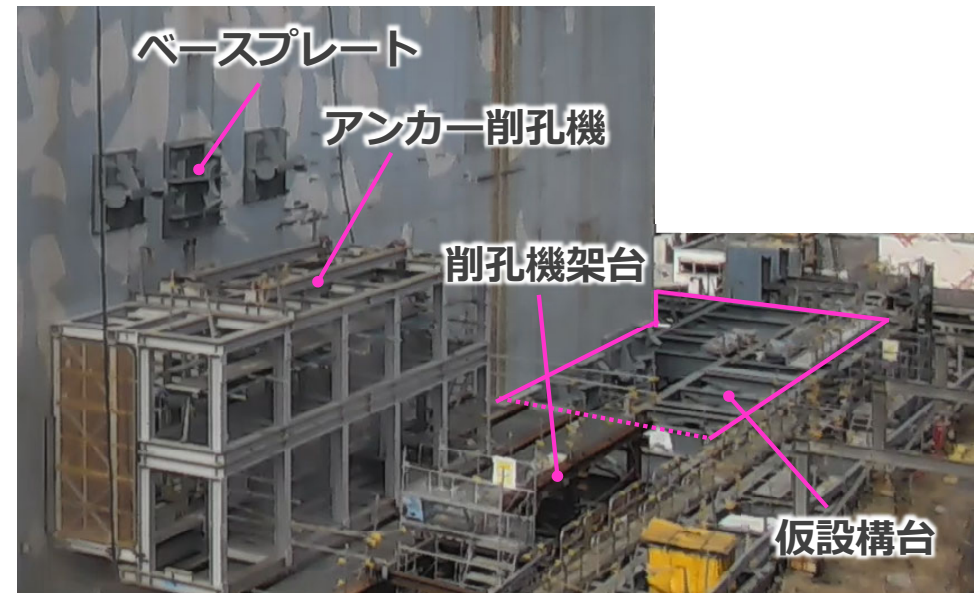

アンカー削孔状況（東面）
(撮影：2023年2月9日)

- はみ出しガレキ撤去範囲については、①西面⇒②北面⇒③東面⇒④南面の順番※に行い、3月中旬から西面の撤去を開始する。
- 撤去対象の はみ出しガレキ状況の詳細について、北面・西面より抜粋して以下に示す。撤去対象物については、主に鉄骨付帯のピース材（アングル材等含む）や電線などである。

※ 工事範囲の順番については変更する可能性がある。

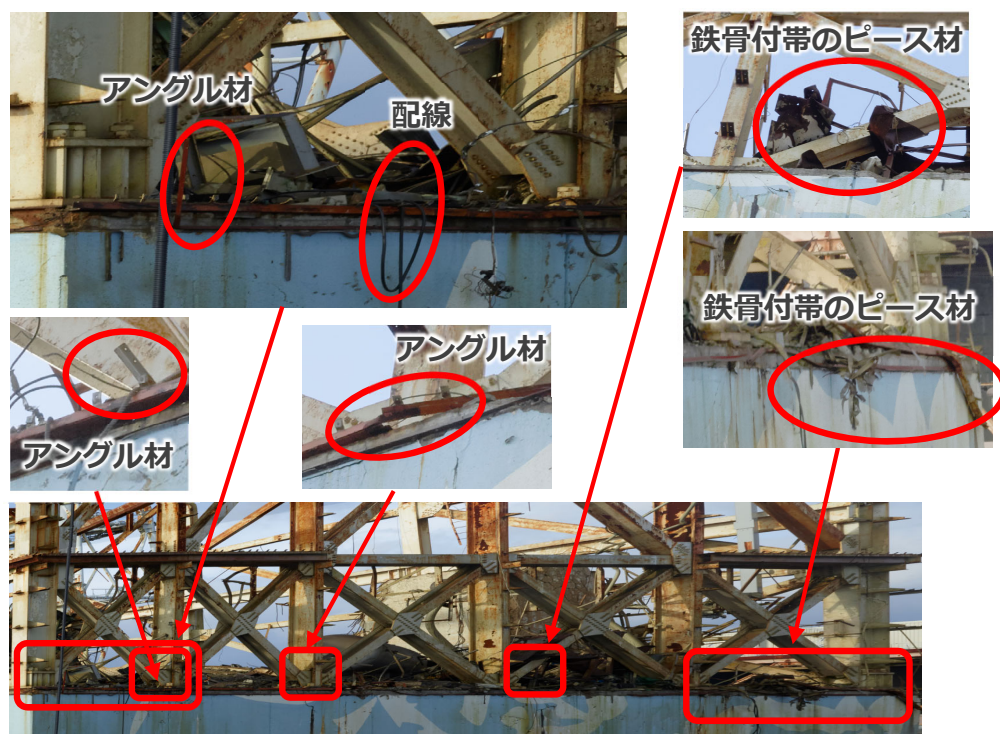


はみ出しガレキ状況（北面）



はみ出しガレキ状況（西面）


- 現在設置済の仮設構台上に、はみ出しガレキ撤去用作業構台を設置し、遠隔操作装置を搭載した重機にて切断撤去を行う。
- 撤去に先立ち、事前に対象エリアに飛散防止剤散布を行うことで、撤去作業におけるダストの飛散防止を図り、撤去作業においては放射性物質濃度測定器により、ダストの飛散状況を監視し、有意な変動が無いことを確認する。

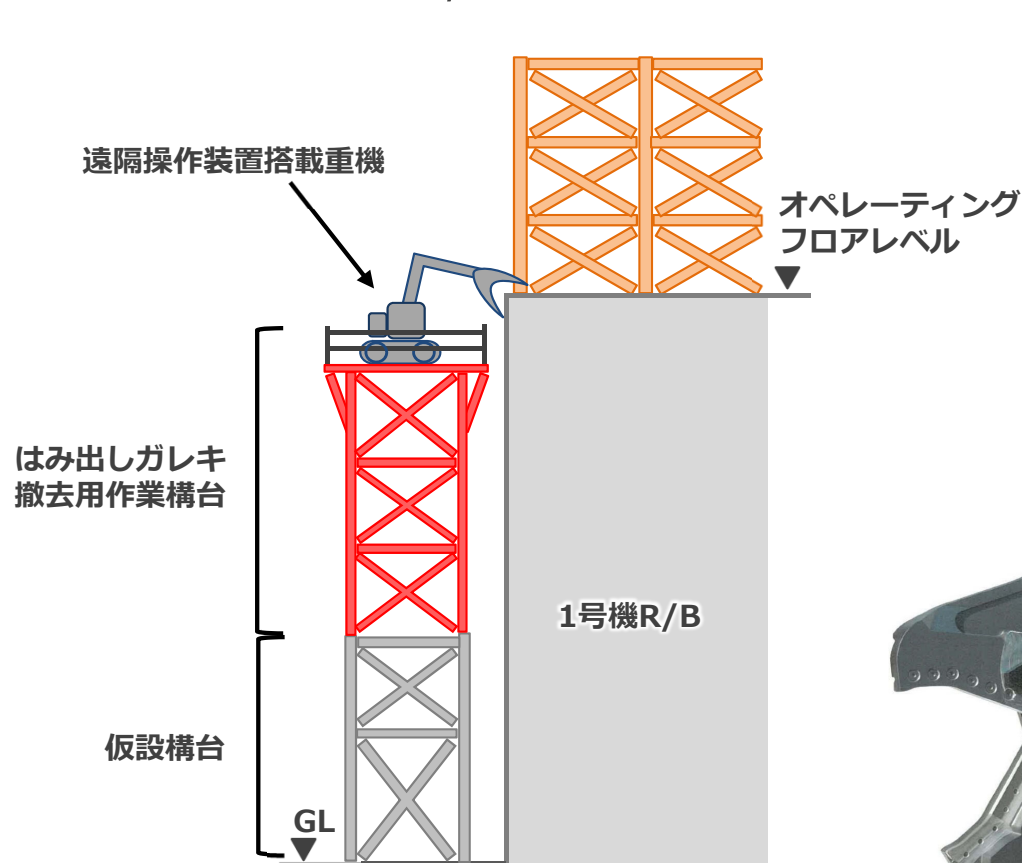


はみ出しガレキ撤去図（西面）



引用元：コーワテック株式会社
<https://www.kowatech.co.jp/products/sam/>

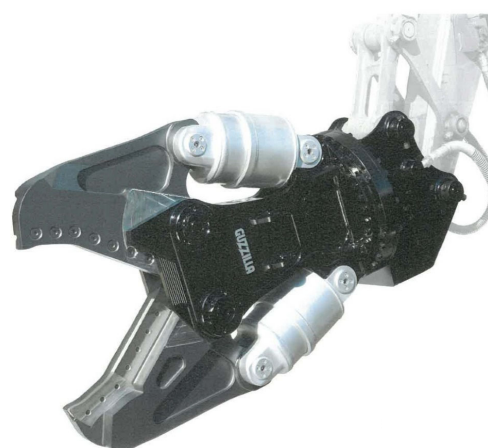

重機アタッチメント（鉄骨切断機）

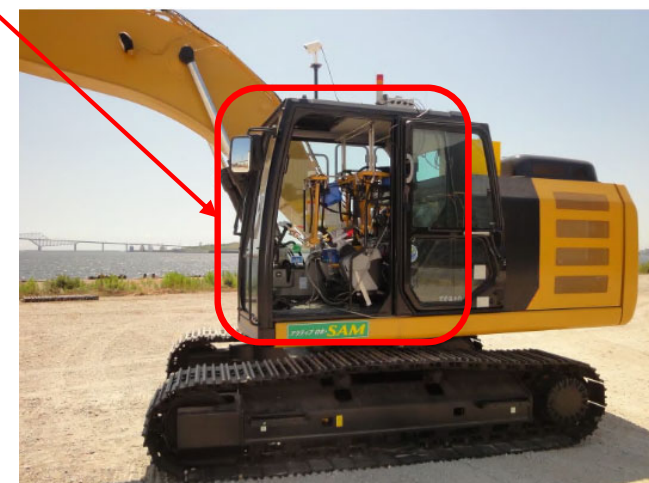

遠隔操作装置搭載重機


- 構外では鉄骨地組等を進め、構内ではアンカーおよびベースプレートの設置、仮設構台の設置を進めていく。

	2022年度							2023年度												2024年度		
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
中長期RM マイルストーン																						
実施計画	実施計画変更申請(大型カバー)																					
	実施計画変更申請(大型カバー換気設備他)																					
大型カバー設置								本体鉄骨建方等 [※]														
	▼ IC配管切断・撤去 R/B外壁調査, アンカー設置, ベースプレート設置																					
	仮設構台等設置																					
								はみ出しガレキ撤去作業(西・北・東面)					はみ出しガレキ撤去作業(南面) [※]									
	作業ヤード整備, 構外ヤード地組, 運搬等																					
大型カバー 換気設備他設置	換気設備ダクト仮組, 注水用配管仮組【構外作業】																					
																				大型カバー換気設備他設置【構内作業】 [※]		


※SGTS配管撤去工事との調整や半導体不足の状況等を踏まえて,工程は精査中

(参考) ステップ図


■ 作業ステップ (1)

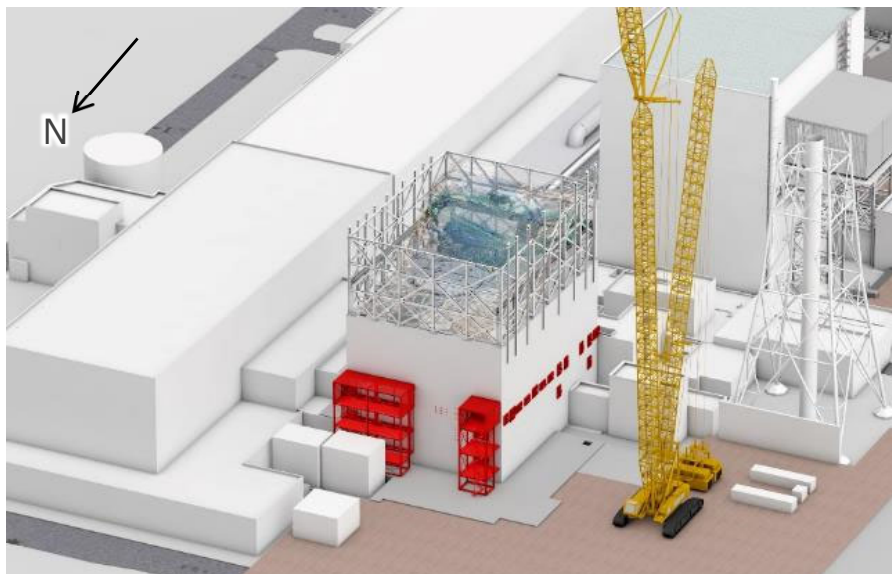


仮設構台部アンカー・ベースプレート設置中

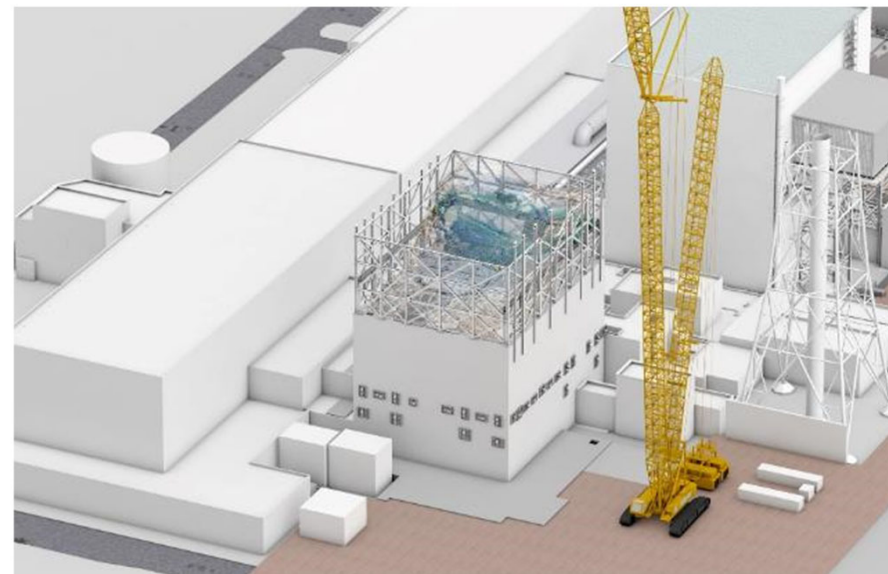

仮設構台部アンカー・ベースプレート設置完了

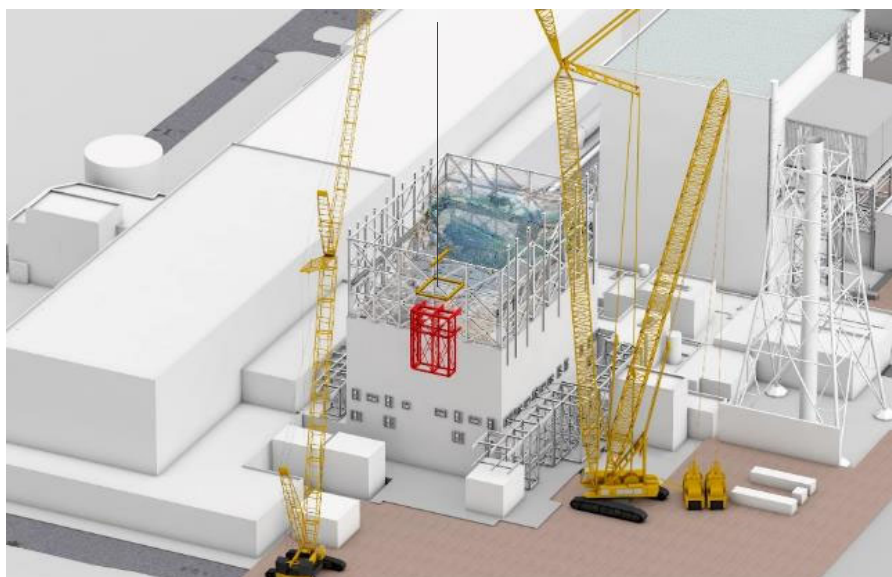

仮設構台設置中

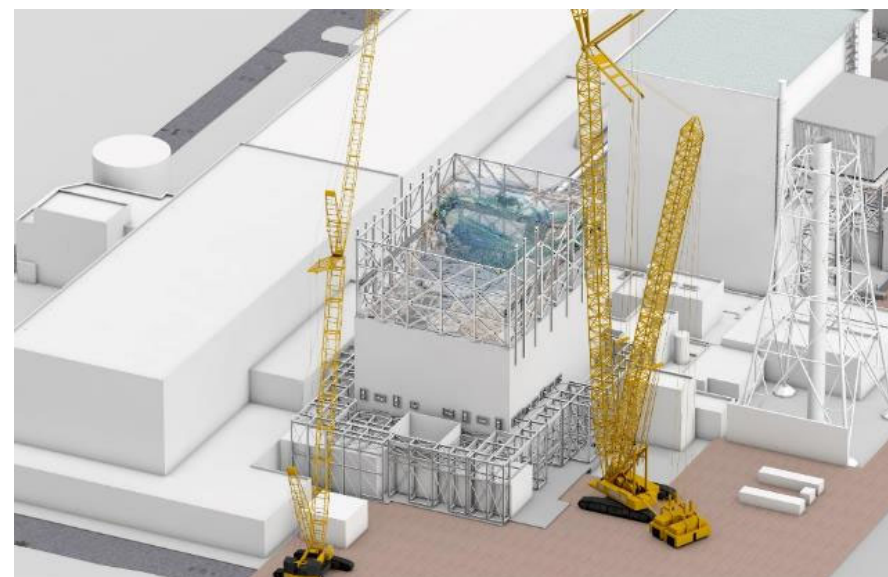


仮設構台設置完了


※イメージ図につき実際と異なる部分がある場合がある

(参考) ステップ図


■ 作業ステップ (2)

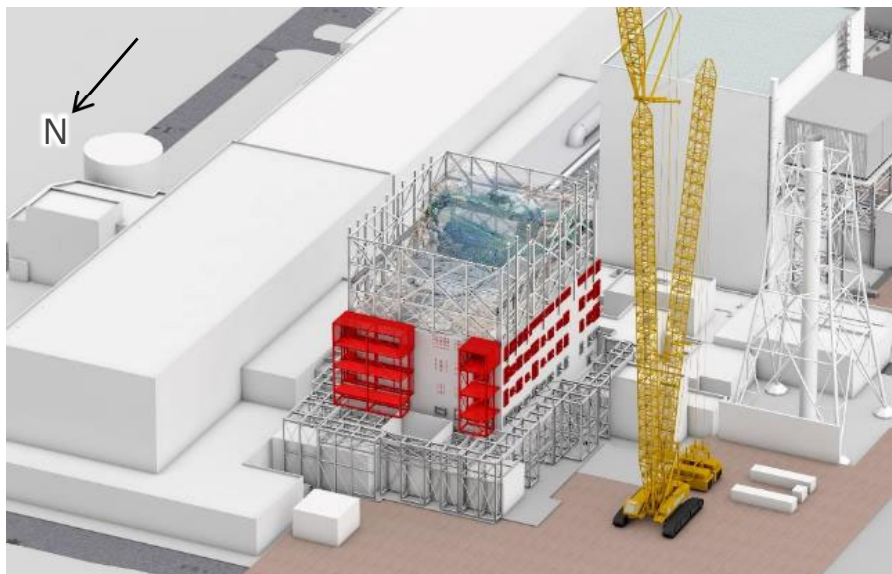


アンカー・ベースプレート設置中

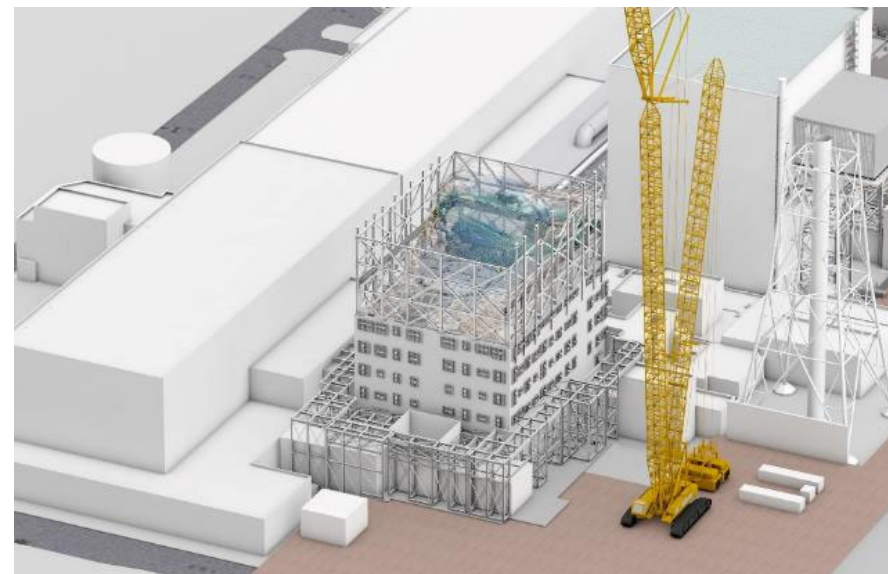

アンカー・ベースプレート設置完了

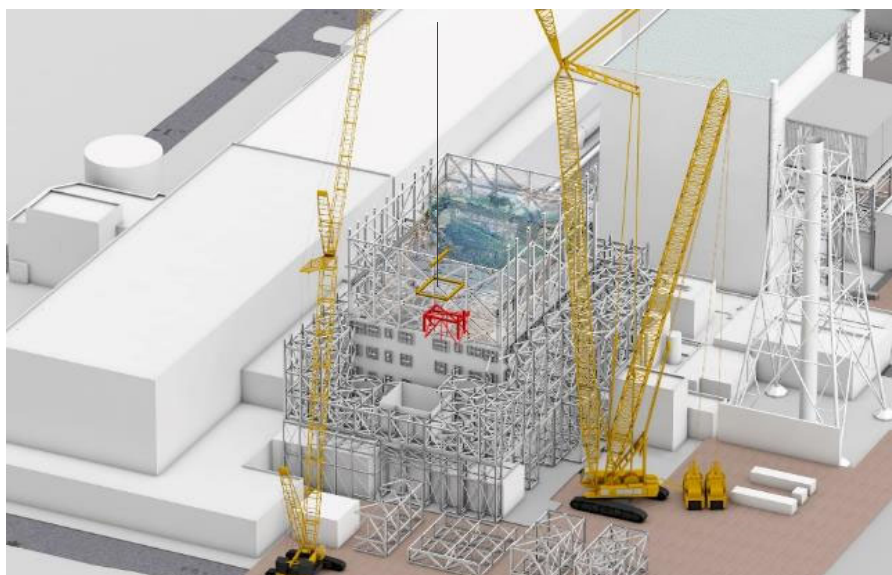

下部架構設置中

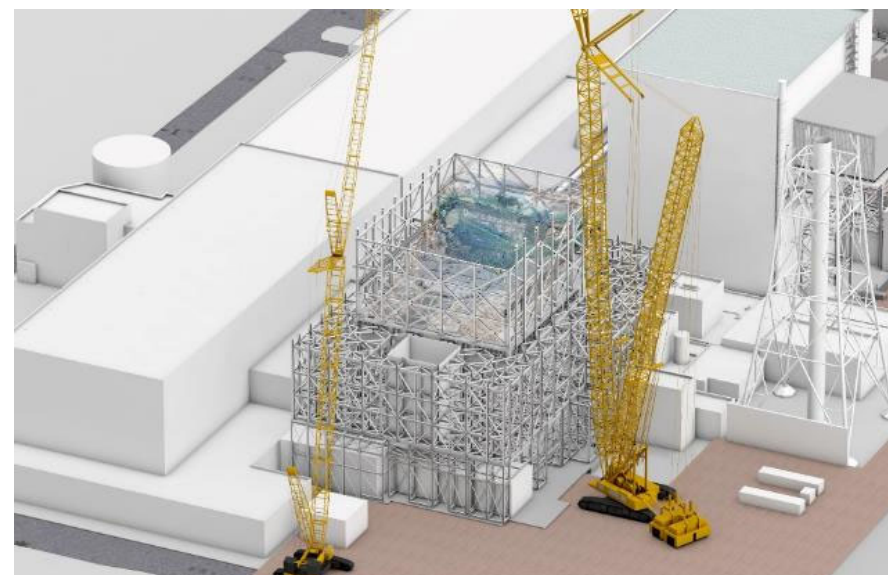


下部架構設置完了


※イメージ図につき実際と異なる部分がある場合がある

(参考) ステップ図


■ 作業ステップ (3)

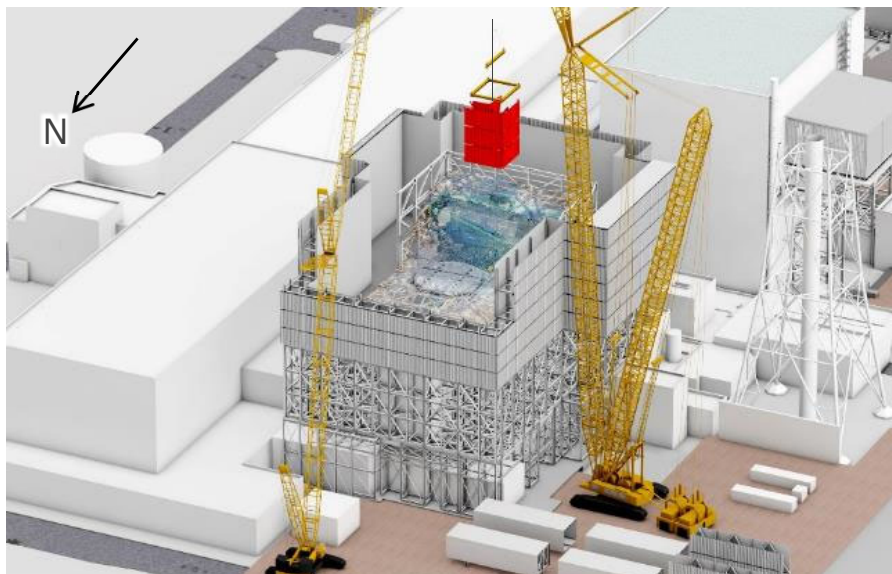


上部架構設置中

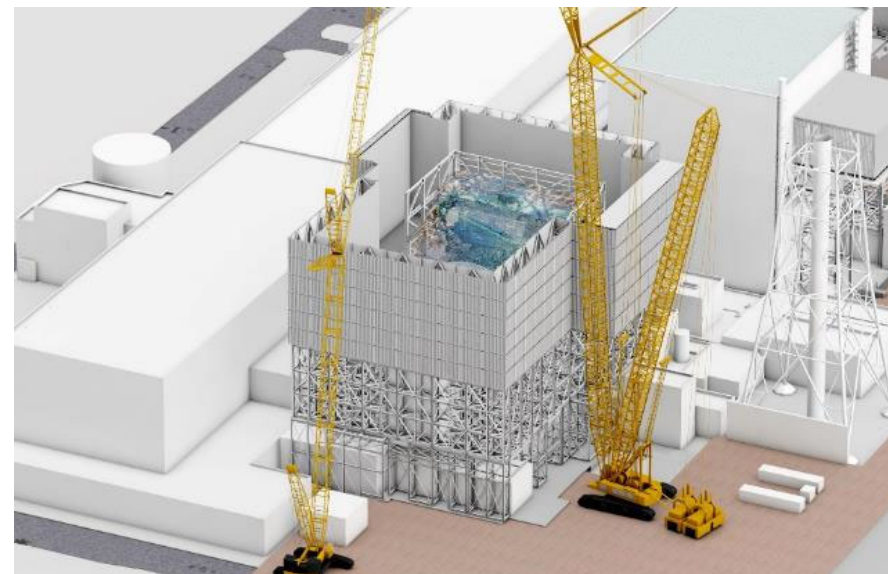

上部架構設置完了

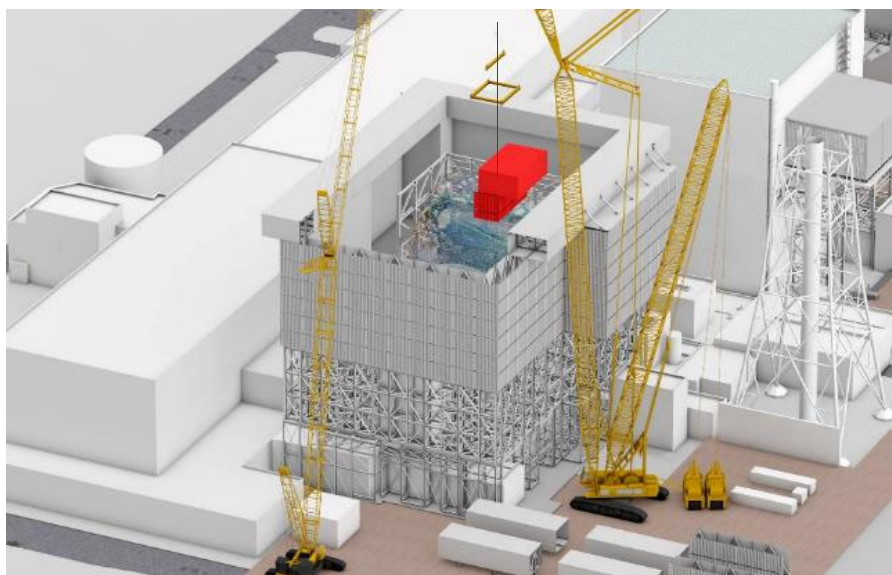

ボックスリング設置中

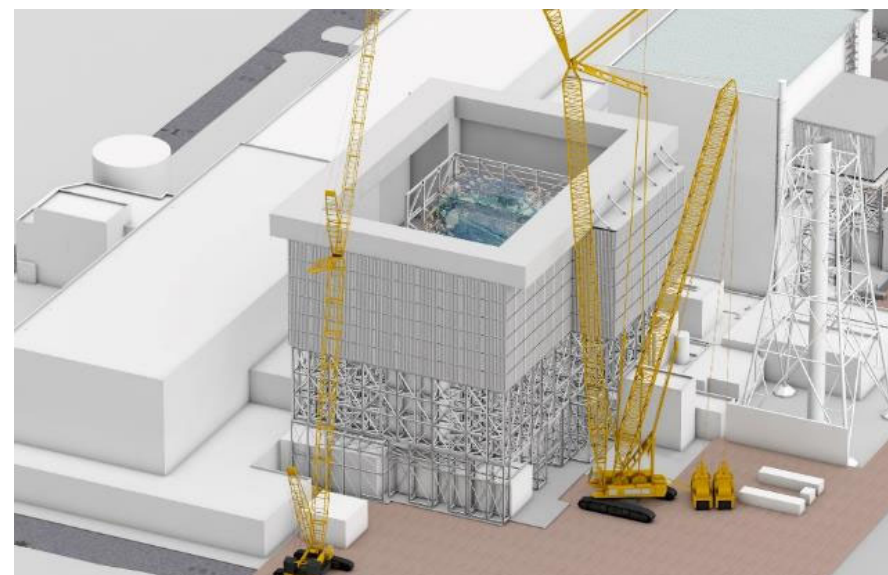


ボックスリング設置完了


※イメージ図につき実際と異なる部分がある場合がある

(参考) ステップ図

■ 作業ステップ (4)

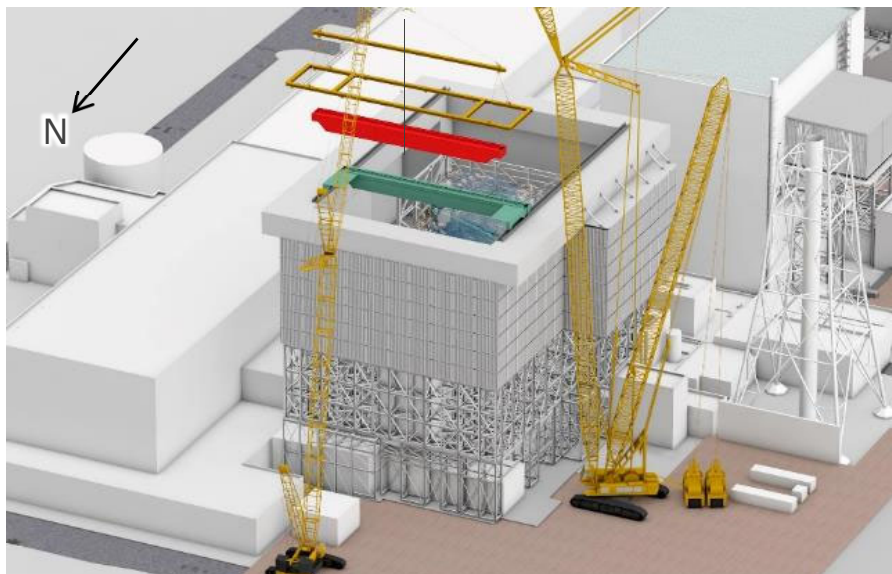


ガレキ撤去用天井クレーン設置中

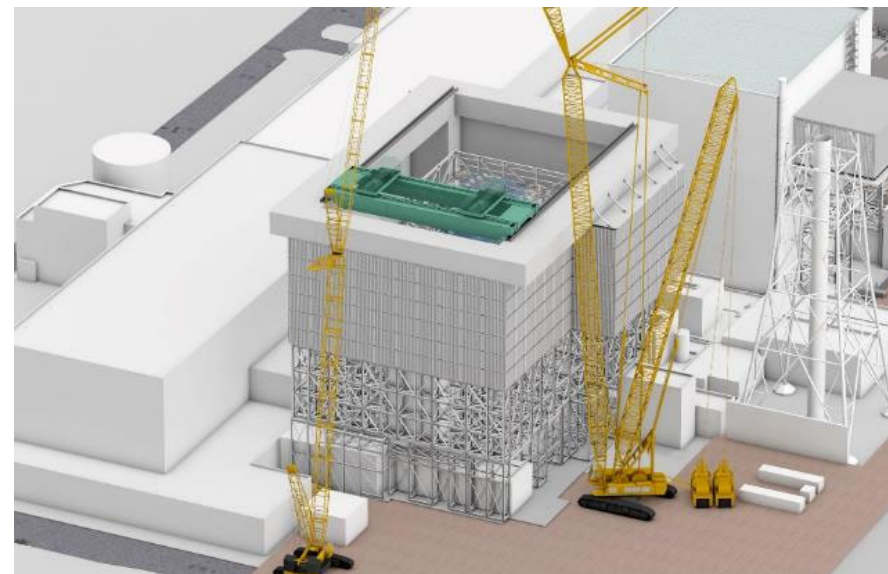

ガレキ撤去用天井クレーン設置完了



可動屋根設置中

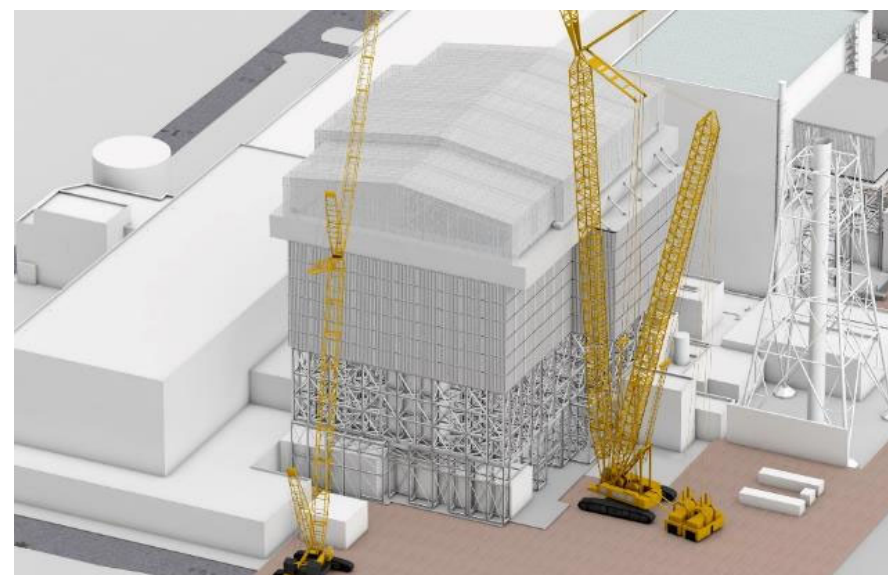

可動屋根設置完了

※イメージ図につき実際と異なる部分がある場合がある

2号機燃料取り出しに向けた工事の進捗について

2023年2月22日

TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

1. 燃料取り出し計画について


- 2024~2026年度の燃料取り出し開始に向け，建屋内と建屋外で作業実施中。
- 燃料取り出し用構台設置後，原子炉建屋オペレーティングフロア（以下，オペフロ）南側に開口を設け，燃料取扱設備を設置する計画。

【建屋内】

- 2022年8月22日から開始した燃料交換機操作室（以下，FHM操作室とする）撤去が2022年11月29日に完了。（解体瓦礫搬出作業：1月31日完了）
- 2023年2月6日から南側既設設備解体に着手（参考①②③参照）。

【建屋外】


- 2023年1月23日から鉄骨建方を開始。
- 構外では構内の鉄骨建方に向け，地組作業を継続して実施中。

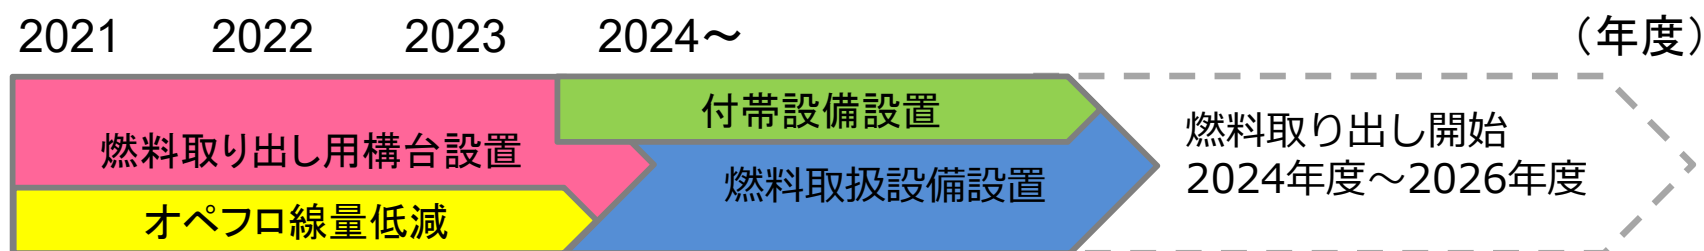


2. オペフロ線量低減の作業ステップ

2021年度 → 2022年度 → 2023年度


▼現在

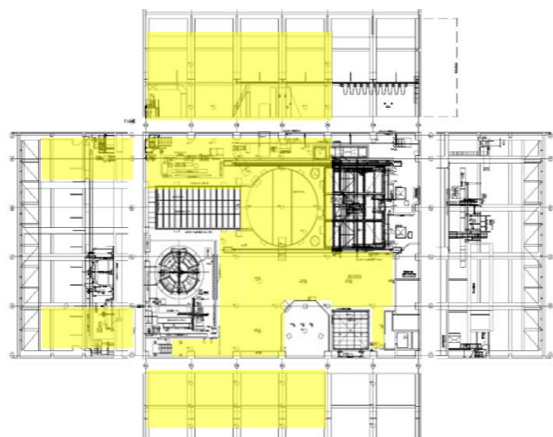


完了①除染 (その1)

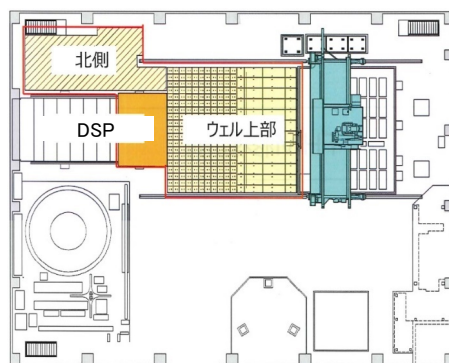


完了②遮蔽設置 (その1)

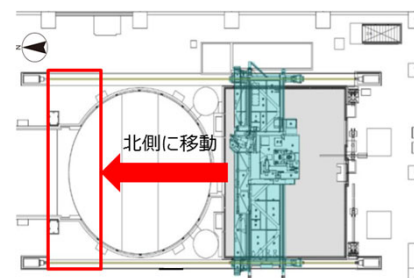


完了③干渉物撤去 (FHM移動)

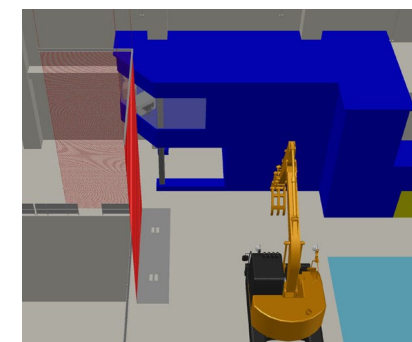


完了④干渉物撤去 (FHM操作室撤去)

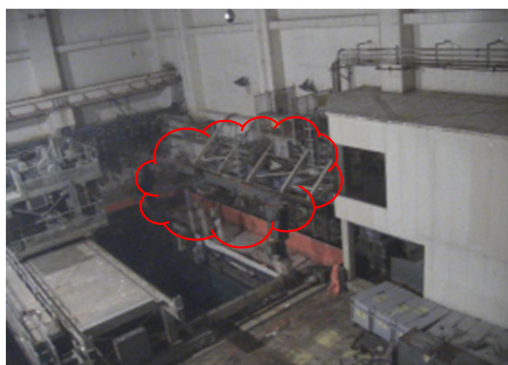

実施中⑤干渉物撤去 (使用済燃料プール南側既設設備撤去)

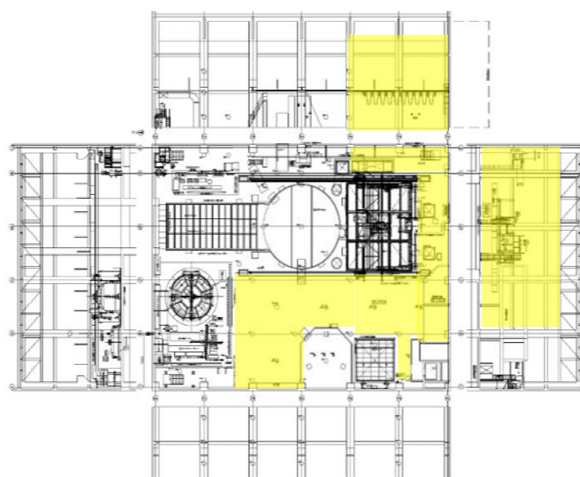


⑥除染 (その2)

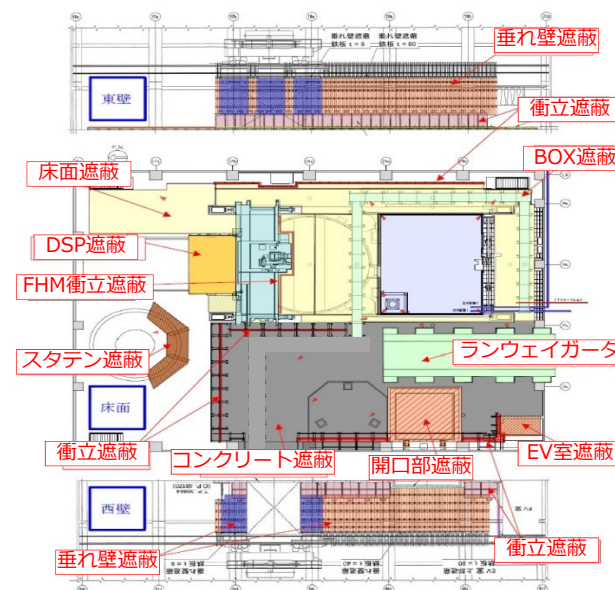

⑦遮蔽設置 (その2)

3. FHM操作室撤去作業の現場状況




解体後の現場状況写真


4. 南側既設設備撤去工事進捗状況

作業進捗状況


- FHM操作室解体時に設置済みの養生カーテン防護範囲から2/6より撤去を開始。
- 2/20に遠隔操作重機アクセス用のスロープ設置及び養生カーテンの追加設置完了。

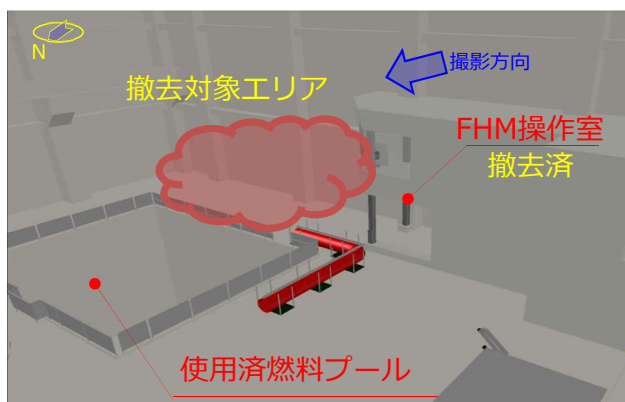

現場配置図

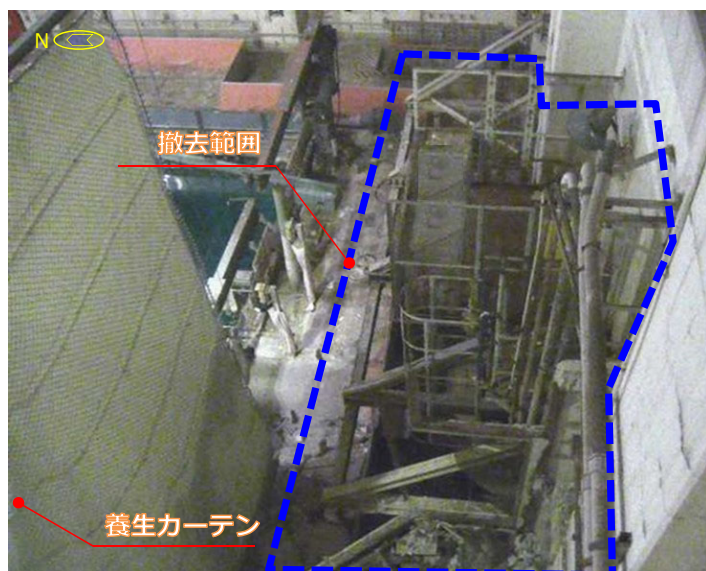

養生カーテン設置前

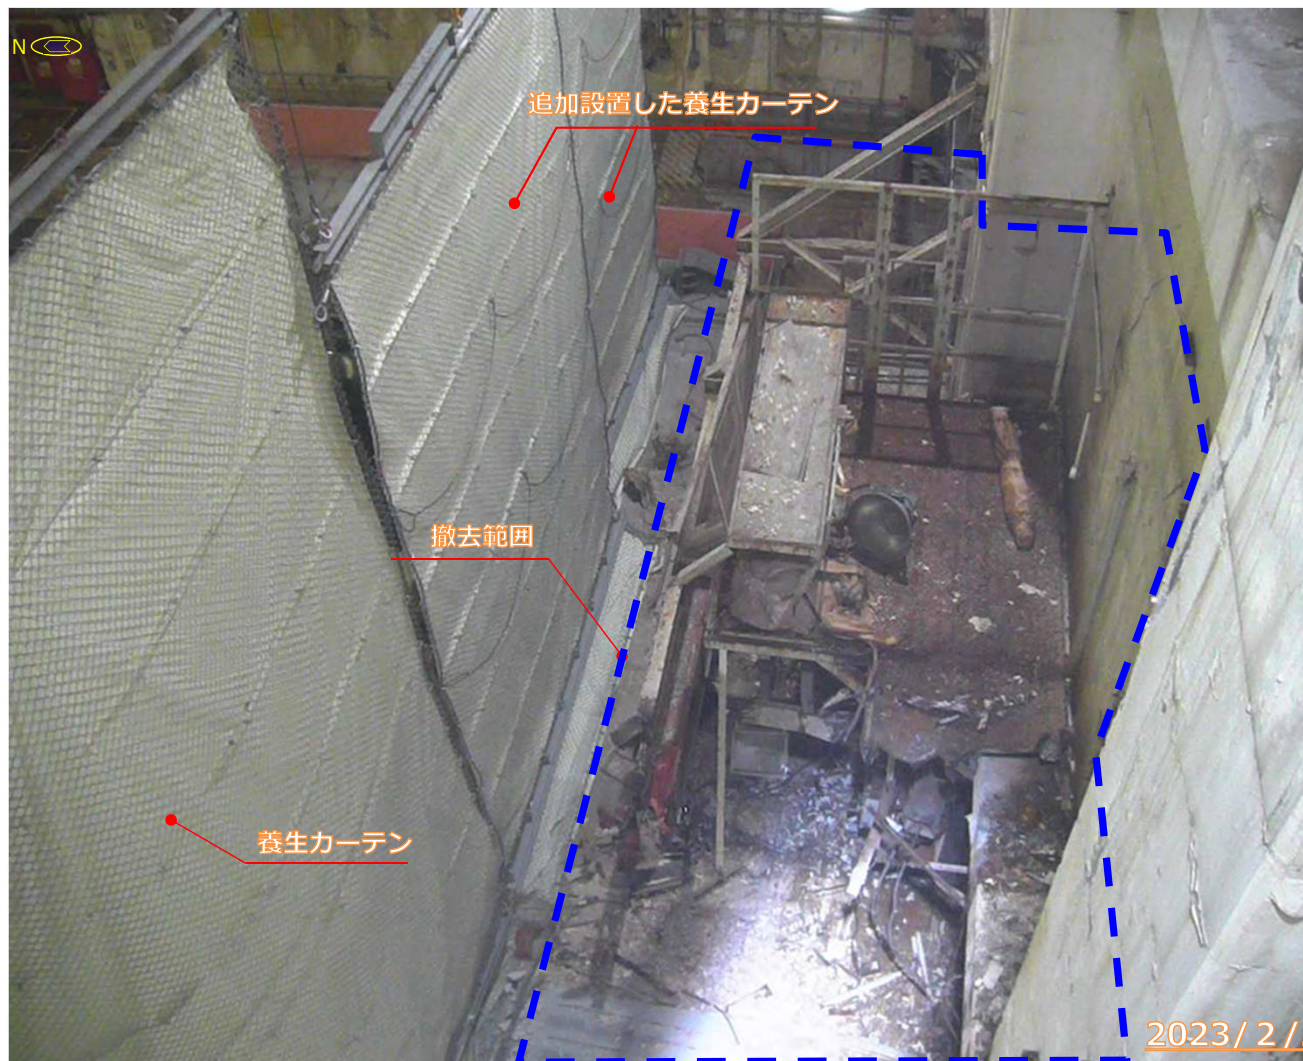


現場状況

2023/2/21撮影

5 - 1. 構台設置工事（鉄骨工事）の進捗状況


- 2号機燃料取り出し用構台の鉄骨ユニットは計**45ユニット**（前室部：18ユニット，構台部：27ユニット）で構成。

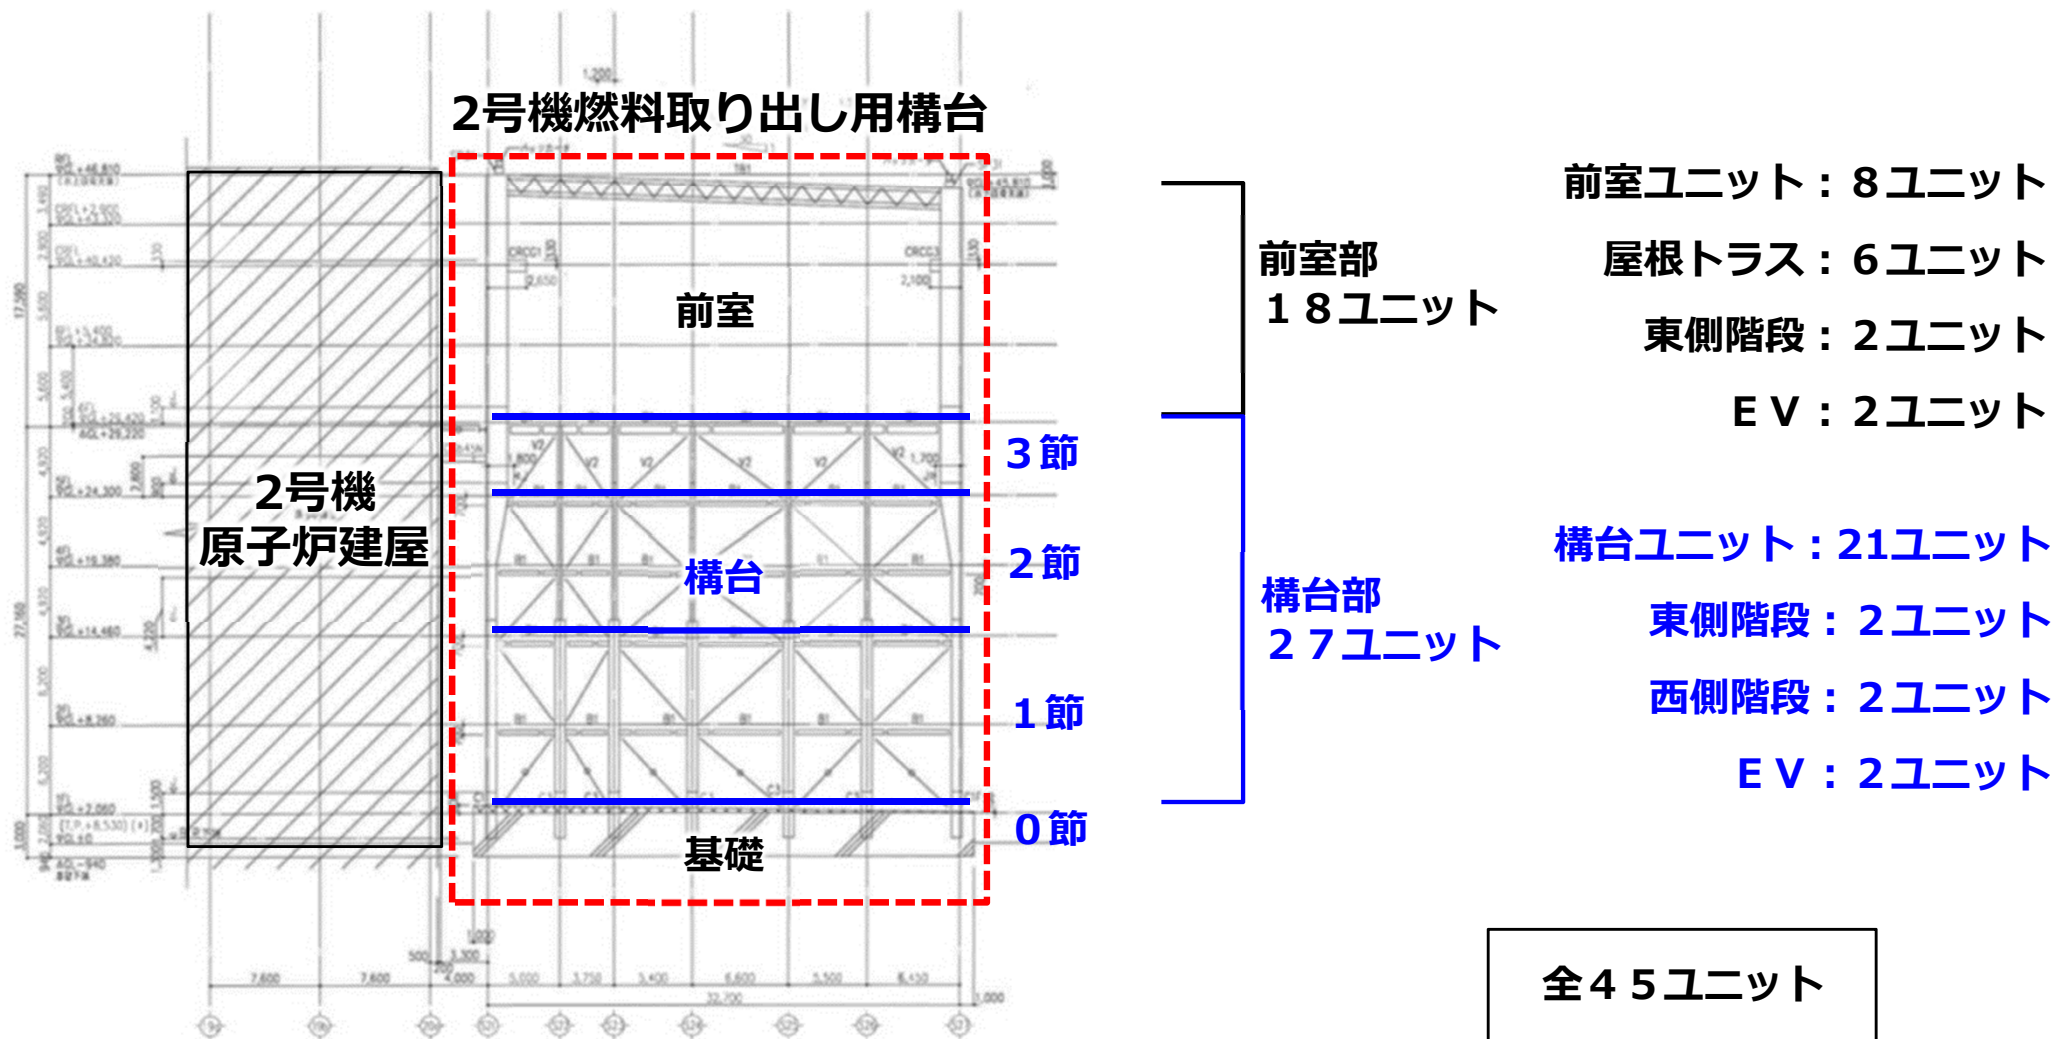

燃料取り出し用構台鉄骨ユニット割り図

5-2. 構台設置工事（鉄骨工事）の進捗状況

- 2023/1/23より鉄骨建方の開始。
- 構台部鉄骨ユニットの内，5ユニットの建方が完了。 [構台部:全27ユニット]

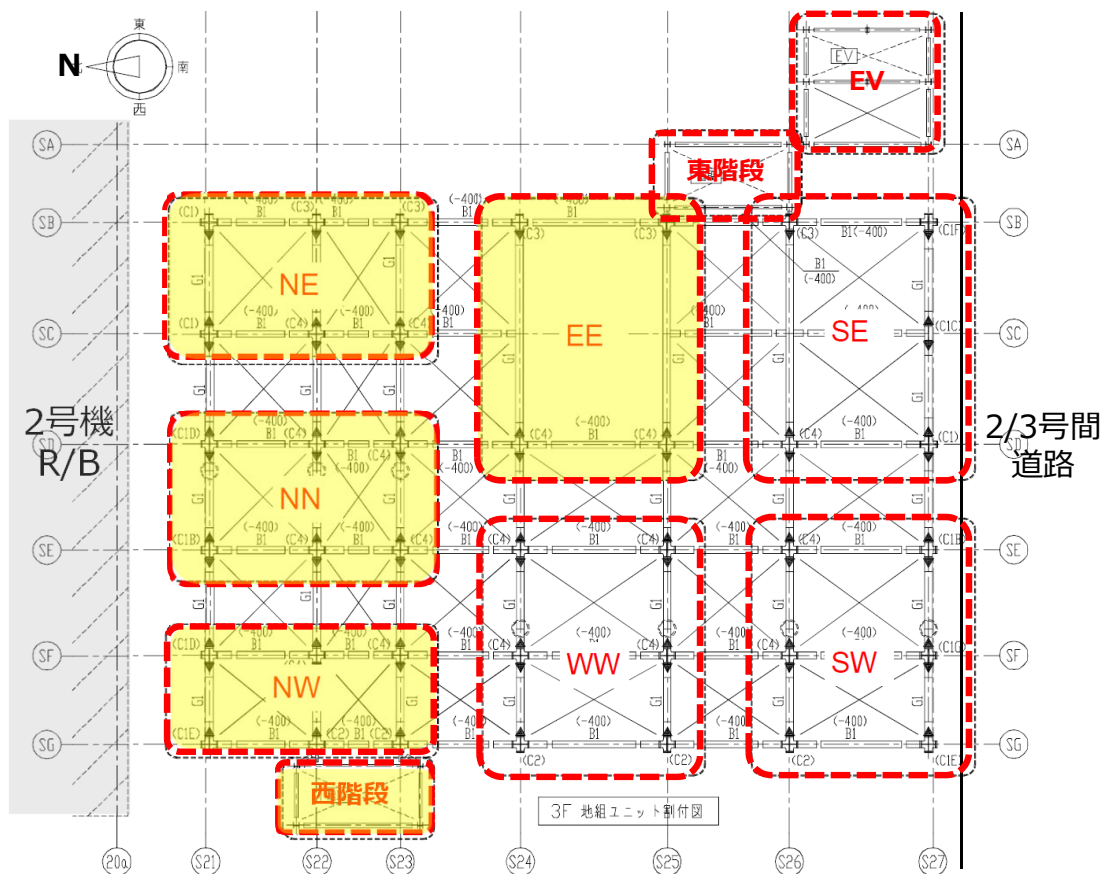

- : 鉄骨ユニット
- : 1節建方完了
- : 2節建方完了
- : 3節建方完了


燃料取り出し用構台鉄骨ユニット割図




2号機原子炉建屋南側ヤード全景
(撮影：2023.2.10)

6. 構外地組作業の進捗状況

- 2号機燃料取り出し用構台は、設置時の作業員被ばく低減の観点から、構外低線量エリアで鉄骨を大ブロック化（地組作業）して、2号機南側ヤードに運搬・建方作業を行う計画。
- 2022/8/31より構外低線量エリアで地組作業を開始。2023/1/16 に運搬車両(スーパーキャリア)試走を実施し、運搬ルートの確認を完了。
- 地組進捗としては構台部分の3節地組を実施中。構台部の27ユニット中、**19ユニット**の地組が完了。

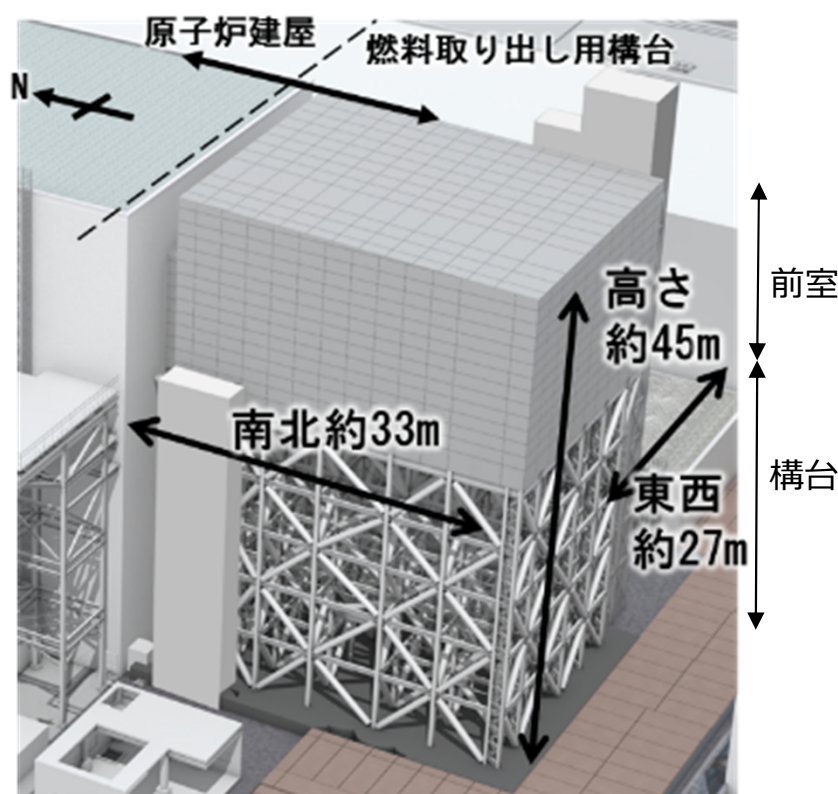

燃料取り出し用構台の概要図

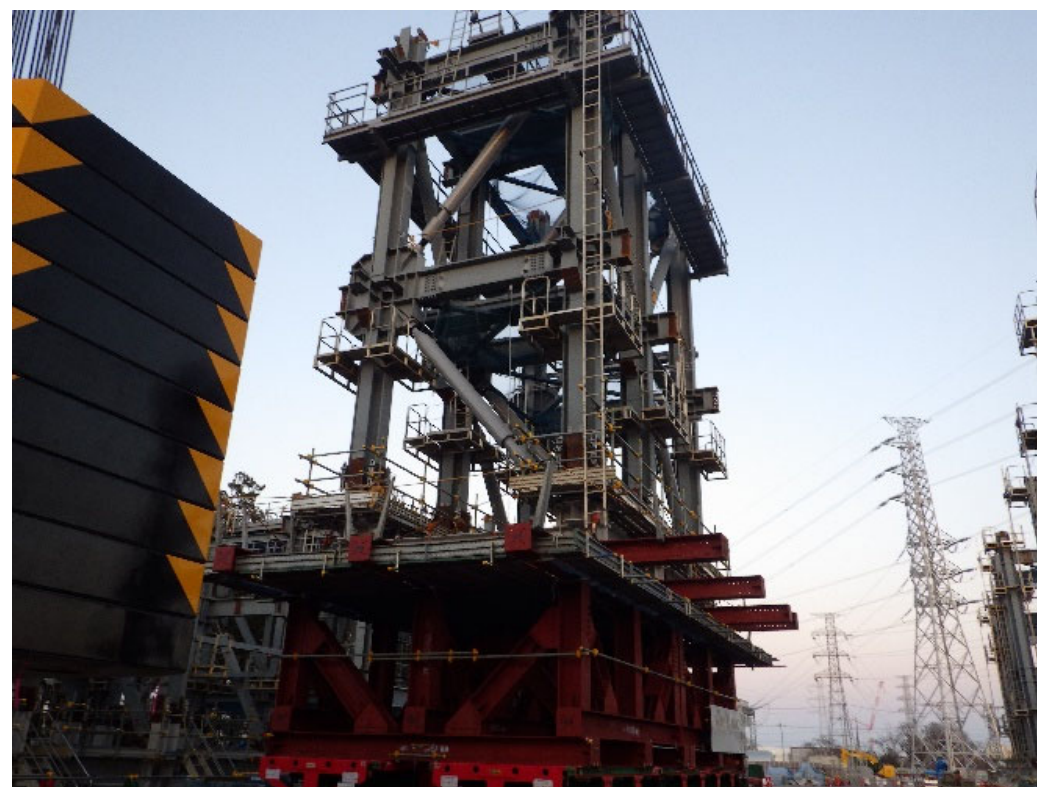

鉄骨ユニット積込の実施状況（撮影：2023.2.1）

7. 今後のスケジュール

- 2024~2026年度の燃料取り出し開始に向け，現時点で計画通りに進捗。
- 安全最優先に作業を進めてまいります。

	2020年度	2021年度				2022年度							2023年度以降				
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	1月	2月	3月	4月		5月	6月	7月	
オペフロ内 線量低減	オペフロ調査 (その3)	除染 (その1) M/U			遮蔽設置 (その1)						現在						
干渉物撤去工事		地中埋設物撤去															
地盤改良工事等		地盤改良準備		地盤改良													
構台設置工事(構内)			MMS施工			掘削工事											
構台設置工事(構外)					ヤード整備		鉄骨地組準備										
許認可 (燃料取り出し用構台, 付帯設備)		実施計画審査															
許認可 (燃料取扱設備)		実施計画審査															

※工程の進捗により変更する可能性有
 ※線表については，準備・片付け作業期間含む

オペフロ南側壁面に隣接している既設設備が、新設する燃料取扱設備の設置工事に干渉するため、FHM操作室解体で使用した遠隔重機を用いて撤去する計画。(P2. 干渉物撤去⑤)

■ 実施する対策及び使用する遠隔重機 (FHM操作室解体と同様)

- 瓦礫飛散対策：養生カーテンを設置。
- ダスト飛散対策：原子炉建屋屋上からスプリンクラーを設置。
- 遠隔重機にて南側既設設備を撤去。



ZX225




ZX135



BROKK400D

遠隔重機


(解体, ガレキ運搬・小割作業で使用)

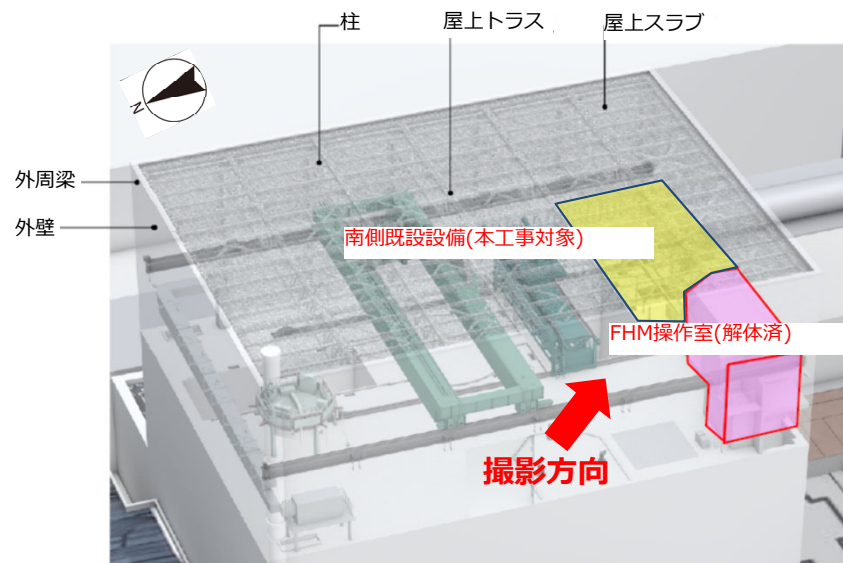

オペフロ配置図



養生カーテン (金網と不燃シートで構成)

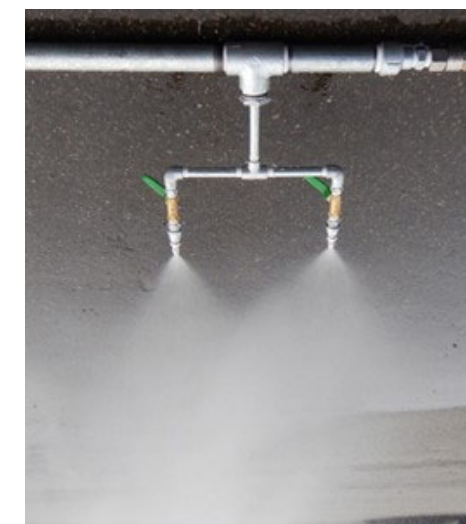

スプリンクラー (散水イメージ)

■ 瓦礫及びダスト飛散対策の設置手順



STEP1 [有人作業] 原子炉建屋屋上に養生カーテン用ウインチ及びスプリンクラーを設置し、スプリンクラーを天井に吊り下げる
 [雰囲気線量：0.5mSv/h 1時間≒0.5mSv 1班4名 10日間程度 準備作業含む]

STEP2 [有人作業] 作業前にスプリンクラーから散水

STEP3*1 [遠隔作業] 遠隔重機にて、養生カーテン搬入可能位置迄解体を実施

STEP4*1 [遠隔作業] 養生カーテンをオペフロ内に搬入

STEP5*1 [有人作業] 養生カーテンの吊ワイヤの接続作業後、養生カーテンを吊り上げる

[雰囲気線量：16mSv/h 5min≒1.33mSv 2名1日]

養生カーテンと吊ワイヤ接続：4箇所*2

浮き上がり防止対策：6箇所*2


必要に応じて養生カーテン吊り上げ時の介助

* 1：STEP3～5は、養生カーテン①、②の際に繰り返す。

* 2：接続箇所数はモックアップの結果に応じ、1～2箇所増減する可能性有

➤ 作業時、ダストモニタを監視し作業を実施

ダストモニタ監視箇所	警報設定値
オペフロ内	《高警報》 5.0E-4Bq/cm ³ 《高高警報》 1.0E-3Bq/cm ³
西側構台前室内	《高警報》 1.0E-3Bq/cm ³ 《高高警報》 5.0E-3Bq/cm ³
西側構台前室外	《高警報》 1.0E-3Bq/cm ³ 《高高警報》 5.0E-3Bq/cm ³

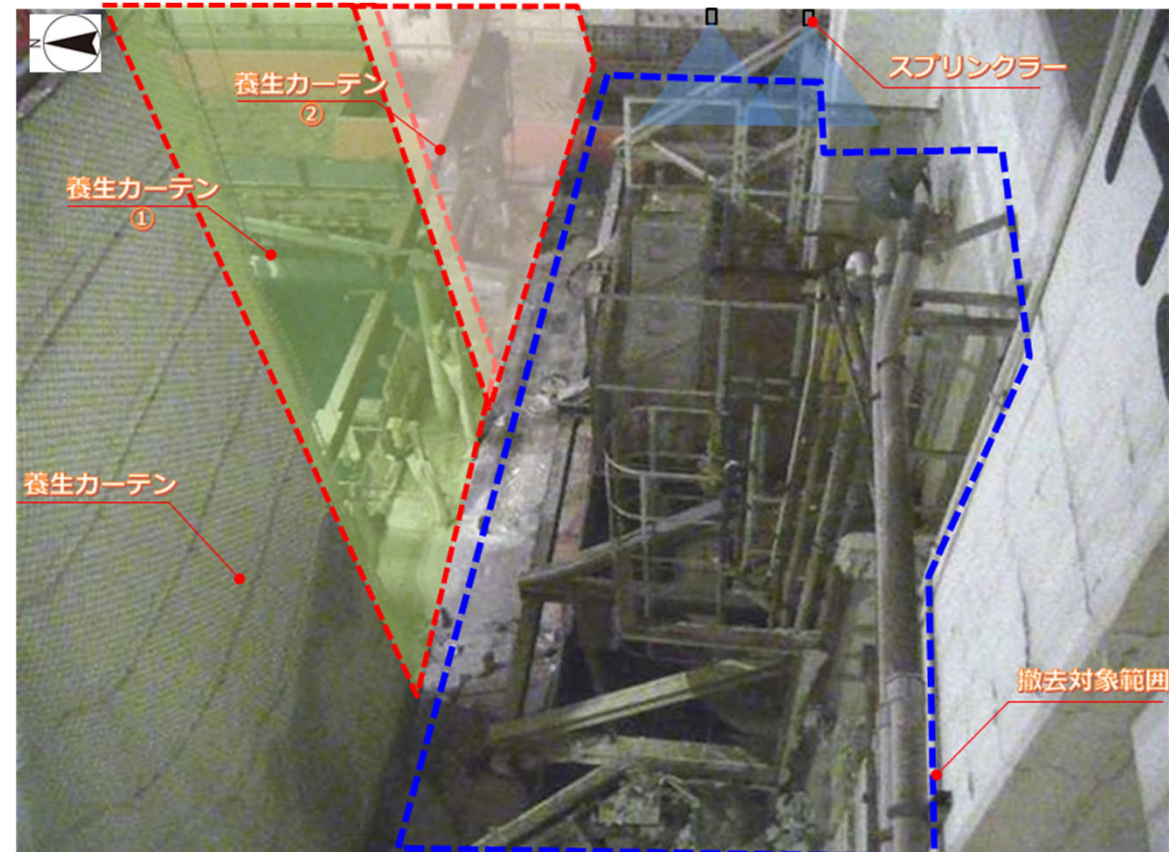

撤去対象範囲とSFP養生実施範囲

※高警報が発報した場合は作業を中断


[作業進捗状況]：構外にてモックアップを実施中

■ モックアップ内容及び進捗

- 遠隔重機を乗り入れるためのFHM操作室残存基礎部用スロープ設置のモックアップ実施済
- 既設原子炉冷却材浄化系フィルタデミハッチ用モノレール撤去のモックアップ実施済
- カメラ架台撤去モックアップ実施済



スロープ（構外）


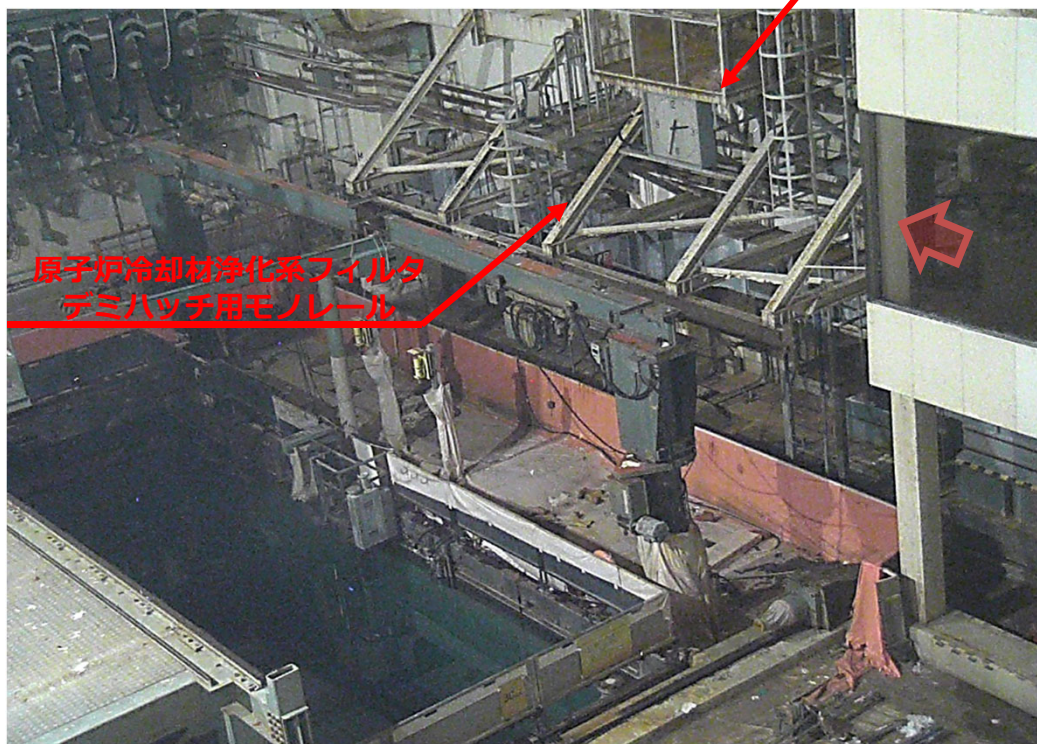


撤去対象設備（現場）




側から見た模擬体（構外）

参考④. 燃料取り出し用構台設置の作業ステップ

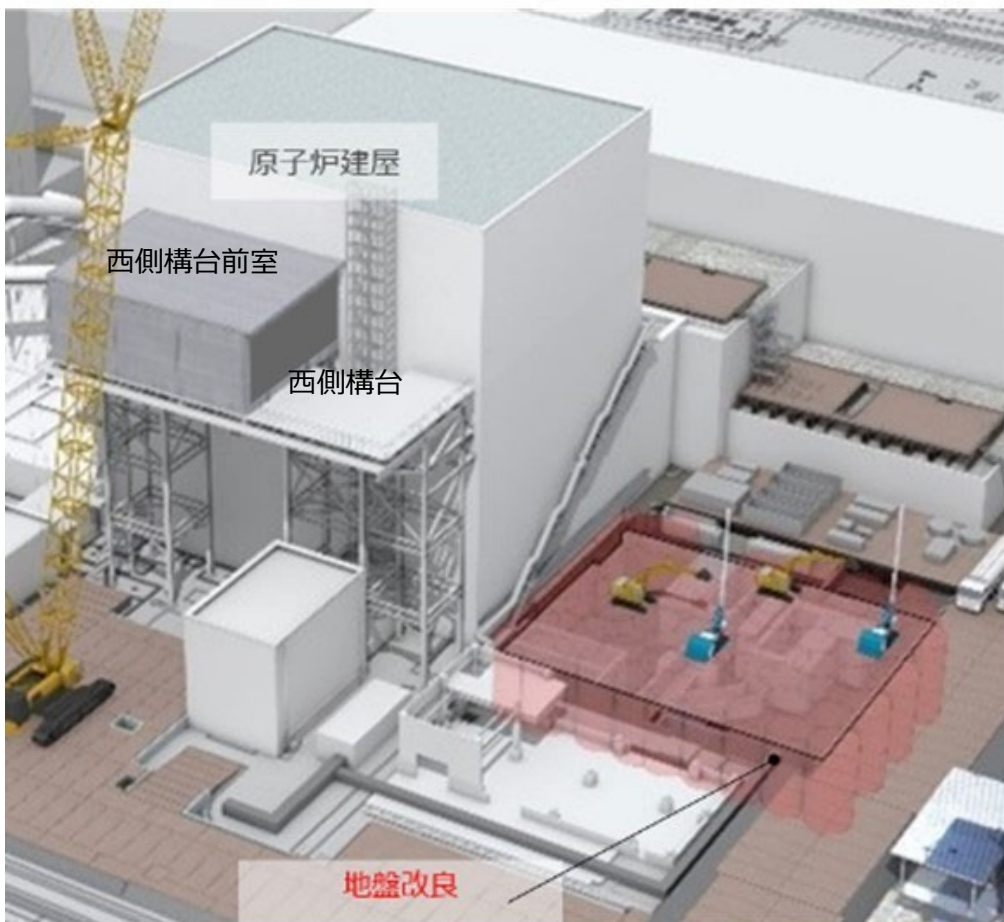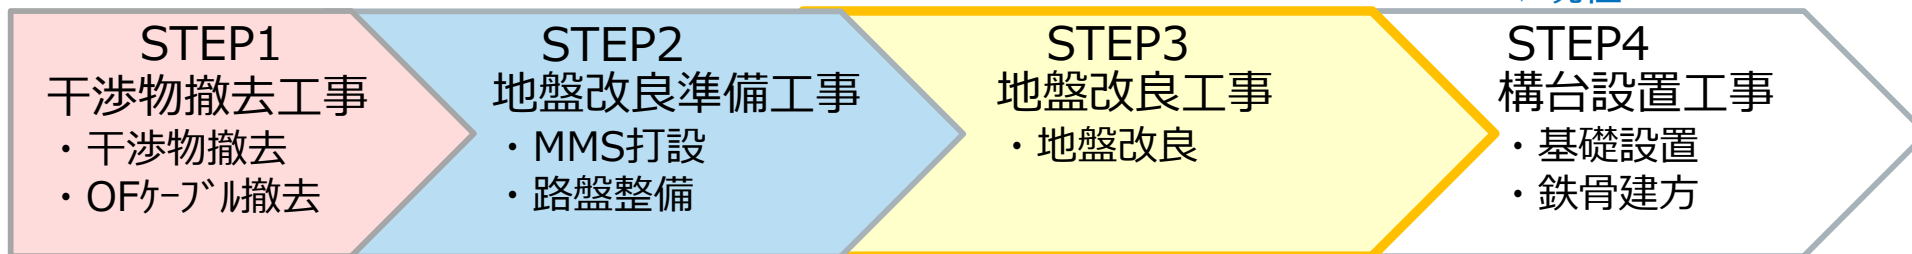


地盤改良工事イメージ図

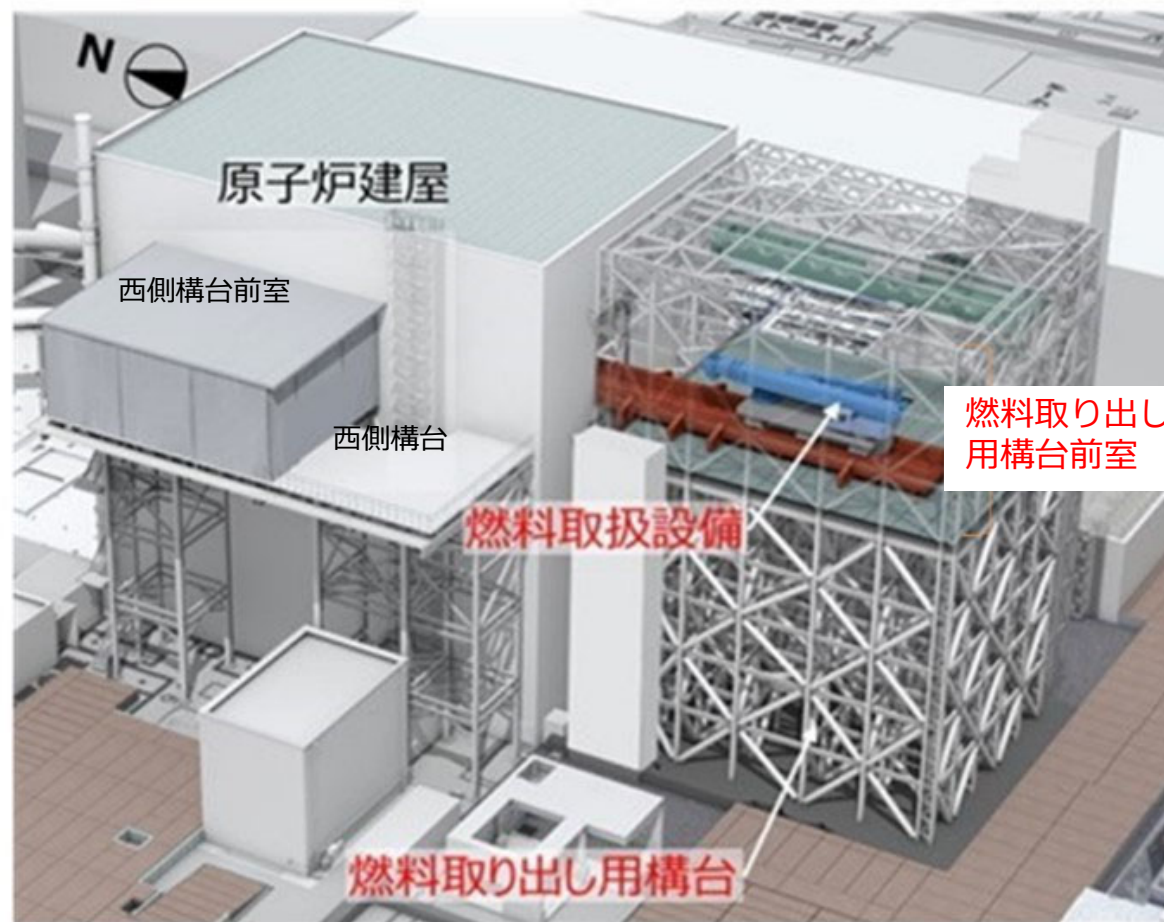

構台イメージ図


※前室外壁：金属系パネル 前室屋根：金属系折板

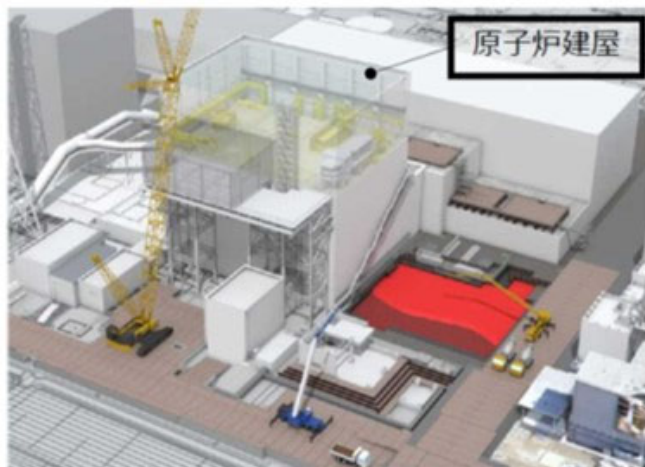


①基礎CON打設




②構台鉄骨建方(0層)・基礎CON打設完了

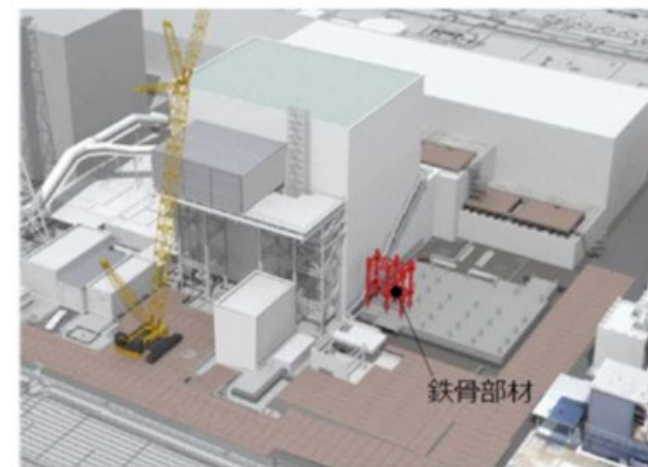


③構台鉄骨建方(1層目開始) 現在実施中

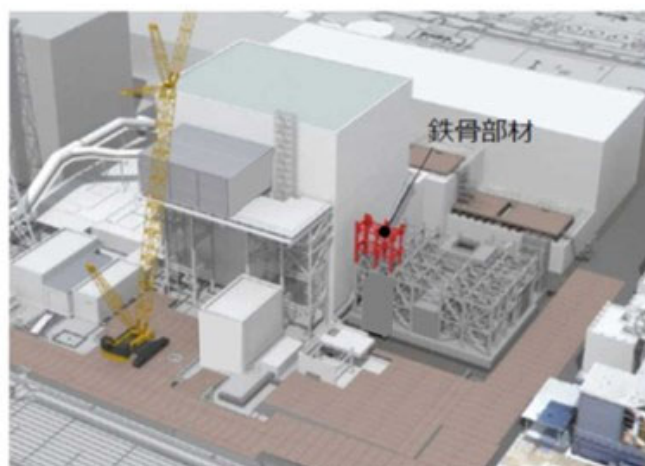

④構台鉄骨建方(2層目開始)

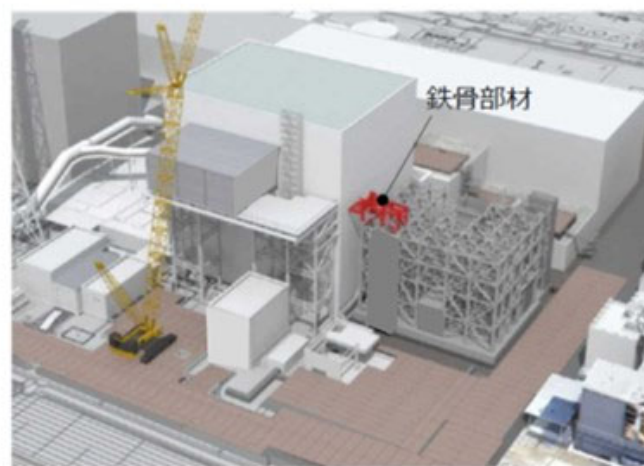

⑤構台鉄骨建方(3層目開始)

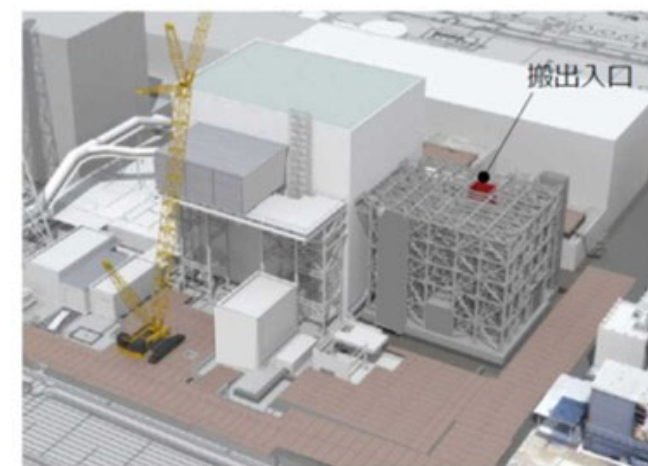

⑥搬出入口設置・構台部完了

使用済燃料等の保管状況

保管場所	保管体数(体)				取出し率	(参考) 2011/3/11 時点	備考
	使用済燃料プール		新燃料 貯蔵庫	合計			
	新燃料	使用済燃料	新燃料				
1号機	100	292	0	392	0.0%	392	
2号機	28	587	0	615	0.0%	615	
3号機	0	0	0	0	100.0%	566	
4号機	0	0	0	0	100.0%	1,535	
5号機	168	1,374	0	1,542	0.0%	1,542	・2011/3/11時点の体数は炉内含む
6号機	198	1,412	230	1,840	2.3%	1,704	・2011/3/11時点の体数は炉内含む ・使用済燃料プール保管新燃料のうち180体は4号機新燃料
1～6号機	494	3,665	230	4,389	30.9%	6,354	

保管場所	保管体数(体)			保管率	(参考) 保管容量	備考
	新燃料	使用済燃料	合計			
乾式キャスク 仮保管設備	0	2,171	2,171	54.8%	3,965	キャスク基数39 (容量:65基)
共用プール	76	6,501	6,577	97.7%	6,734	ラック取替工事実施により当初保管容量6,840体から変更

	保管体数(体)		
	新燃料	使用済燃料	合計
福島第一合計	800	12,337	13,137

赤字:2023/1/26報告時からの変更点
変更なし



1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

2023/2/22






東京電力ホールディングス株式会社

1.定期散布（1号機）

定期散布	
目的	オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。
頻度	1回/月
標準散布量	1.5L/m ² 以上
濃度	1/10
散布範囲	<p>【凡例】 : 散布範囲</p>
散布面積	1,234m ²

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

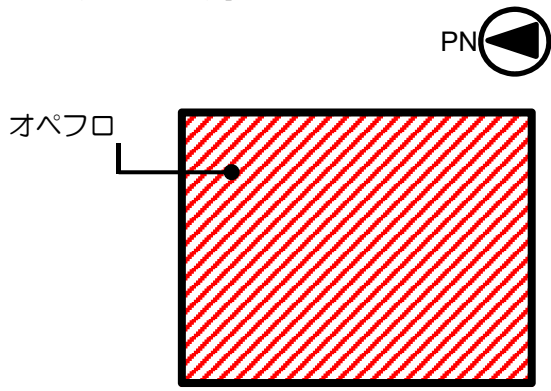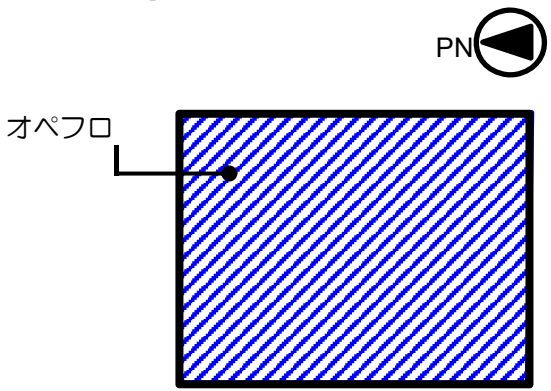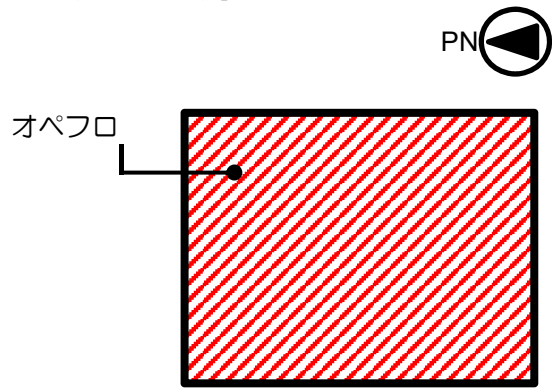作業時散布			
目的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃度	1/10
散布対象作業	ガレキ撤去		
定期散布の実績及び予定			
計画（1月）	実績（1月）	計画（2月）	
完了予定日：1月6・7日 	完了日：1月6日・7日 	完了予定日：2月21・22日 	

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2023年2月20日時点

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）



	日	15 (日)	16 (月)	17 (火)	18 (水)	19 (木)	20 (金)	21 (土)
	1月	散布対象作業	-	-	-	-	-	-
	散布予定	-	-	-	-	-	-	-
	散布実施	-	-	-	-	-	-	-
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.57E-05 (最大) ND (最小)	6.64E-05 (最大) ND (最小)	1.04E-04 (最大) ND (最小)	5.57E-05 (最大) ND (最小)	6.36E-05 (最大) ND (最小)	6.06E-05 (最大) ND (最小)	6.98E-05 (最大) ND (最小)
	日	22 (日)	23 (月)	24 (火)	25 (水)	26 (木)	27 (金)	28 (土)
	1月	散布対象作業	-	-	-	-	-	-
	散布予定	-	-	-	-	-	-	-
	散布実施	-	-	-	-	-	-	-
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	3.82E-05 (最大) ND (最小)	8.51E-05 (最大) ND (最小)	5.03E-05 (最大) ND (最小)	6.06E-05 (最大) ND (最小)	6.83E-05 (最大) ND (最小)	5.57E-05 (最大) ND (最小)	5.83E-05 (最大) ND (最小)
	日	29 (日)	30 (月)	31 (火)	1 (水)	2 (木)	3 (金)	4 (土)
	2月	散布対象作業	-	-	-	-	-	-
	散布予定	-	-	-	-	-	-	-
	散布実施	-	-	-	-	-	-	-
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.57E-05 (最大) ND (最小)	7.71E-05 (最大) ND (最小)	5.57E-05 (最大) ND (最小)	3.96E-05 (最大) ND (最小)	7.17E-05 (最大) ND (最小)	6.10E-05 (最大) ND (最小)	6.37E-05 (最大) ND (最小)
	日	5 (日)	6 (月)	7 (火)	8 (水)	9 (木)	10 (金)	11 (土)
	2月	散布対象作業	-	-	-	-	-	-
	散布予定	-	-	-	-	-	-	-
	散布実施	-	-	-	-	-	-	-
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.71E-05 (最大) ND (最小)	7.44E-05 (最大) ND (最小)	7.15E-05 (最大) ND (最小)	7.68E-05 (最大) ND (最小)	6.08E-05 (最大) ND (最小)	6.35E-05 (最大) ND (最小)	5.01E-05 (最大) ND (最小)
	日	12 (日)	13 (月)	14 (火)	15 (水)	16 (木)	17 (金)	18 (土)
	2月	散布対象作業	-	-	-	-	-	-
	散布予定	-	-	-	-	-	-	-
	散布実施	-	-	-	-	-	-	-
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.68E-05 (最大) ND (最小)	7.94E-05 (最大) ND (最小)	5.33E-05 (最大) ND (最小)	5.01E-05 (最大) ND (最小)	8.48E-05 (最大) ND (最小)	5.55E-05 (最大) ND (最小)	7.26E-05 (最大) ND (最小)
	日	19 (日)	20 (月)	21 (火)	22 (水)	23 (木)	24 (金)	25 (土)
	2月	散布対象作業	-	-	-	-	-	-
	散布予定	-	-	○	○	-	-	-
	散布実施	-	-	-	-	-	-	-
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.93E-05 (最大) ND (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)

※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出
