


使用済燃料プール対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	8月		9月				10月			11月		12月		1月		2月		3月以降		備考			
				18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20		27		
●1号機大型カバ-の設置完了(2023年度頃) ●1号機燃料取り出しの開始(2027~2028年度) ●2号機燃料取り出しの開始(2024~2026年度) ●1~6号機燃料取り出し完了(2031年内)	カバ-	燃料取り出し用カバ-の詳細設計の検討	検討・設計 大型カバ-, ガレキ撤去の検討・設計	→ (2026年度完了予定)																						【主要工程】 ○ガレキ撤去: '18/1/22~'20/11/24 (大型カバ-設置後に再開予定) ・Xフレ-ス撤去: '18/9/19~'18/12/20 ・機器ハッチ養生: '19/1/11~'19/3/6 ・屋根鉄骨撤去: '19/2/5~'19/2/22 ・SFP周辺ガレキ撤去: '19/3/18~'20/9/18 ・フェルプラク調査: '19/7/17~'19/8/26 ・SFP内干渉物等調査: '19/8/2~'19/9/4~6 9/20, 27 ・フェルプラク上の付帯撤去: '19/8/28 ・FHM下部支障物撤去: '20/3/3~'20/3/14 ・SFPゲートカバ-設置: '20/3/16~'20/3/18 ・SFP養生設置(準備作業含む): '20/3/20~'20/6/18 ・FHM支保設置(準備作業含む): '20/9/15~'20/10/23 ・天井クレーン受保設置(準備作業含む): '20/10/28~'20/11/24 ○大型カバ-設置 ・残置カバ-解体(準備作業含む): '20/11/25~'21/6/19 ・大型カバ-仮設構台等設置: '21/8/28~'24/4/11 ・外壁調査: '21/10/20~'24/8/22 ・大型カバ-換気設備他準備工事: '21/10/19~ ・大型カバ-アンカ-及びベースプレート設置: '22/4/13~'24/9/19 ・本体鉄骨(下部架橋)設置: '23/6/19~ 【規制庁関連】 ・オペレーティングフロア床下ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可('19/3/1) ・大型カバ-換気設備他準備工事(23/3/23) ・大型カバ-換気設備他 実施計画変更認可('22/10/27) ・燃料取扱設備他 実施計画変更申請('24/3/26) ※○番号は、別紙配置図と対応
		原子炉建屋上部のガレキの撤去	現場作業 ①現地調査等('13/7/25~) ②作業ヤード整備、構外ヤード地組、外壁調査、R/B外周鉄骨撤去等 ③R/B壁面アンカ-設置、ベースプレート設置 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">実績反映</span> ④本体鉄骨建方等	→ (2025年度完了予定)																						
	燃料取り出し用カバ-の設置工事	燃料取り出し用カバ-の設置工事	現場作業 【構外】ランウェイガ-ダ設置(鉄骨地組) ④R/B南側外壁開口設置(準備作業含む)	→ (2025年4月完了予定)																						
		燃料取り出し用カバ-の設置工事	現場作業 ④ランウェイガ-ダ設置	→ (2025年4月完了予定)																						
	燃料取扱設備	クレーン/燃料取扱機的设计・製作	検討・設計 燃料取り出し設備の検討・設計・製作	→ (2026年度完了予定)																						
		プール内ガレキの撤去、燃料調査等	検討・設計 燃料取り出し設備の検討・設計・製作	→ (2025年3月完了予定) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">最新工種反映</span>																						
		6号機使用済燃料の撤出	現場作業 使用済燃料撤出作業	→ (2025完了予定)																						
	●その他プール燃料取り出し関連作業	共用プール	燃料受け入れ	現場作業 使用済燃料受け入れ作業	→ (2025完了予定)																					
			乾式キャスク製作	調達 乾式キャスク製作・検査	→ 継続製作中																					
		共用プール空き容量確保(仮設保管設備受入)	現場作業 乾式キャスク撤出作業 乾式キャスク仮保管設備工リア増設工事	→ (2027年度完了予定) → (2025年度完了予定)																						
乾式保管設備(共用プール用)検討・設計・設置工事		検討・設計 乾式保管設備(共用プール用)検討	→ 継続検討中																							
高線量機器取り出し	制御棒等高線量機器取り出し	高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作	検討・設計 高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作	→ (2025年度完了予定)																						
		高線量機器取り出し	現場作業 ⑥-1プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去 ⑥-2高線量機器取り出し	→ (2025年度完了予定) → (2025年度完了予定)																						
		高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作	検討・設計 高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作	→ (継続検討)																						
		高線量機器取り出し	現場作業 ⑦高線量機器取り出し	→ (2035年度以降完了予定)																						

廃炉中長期実行プラン2024

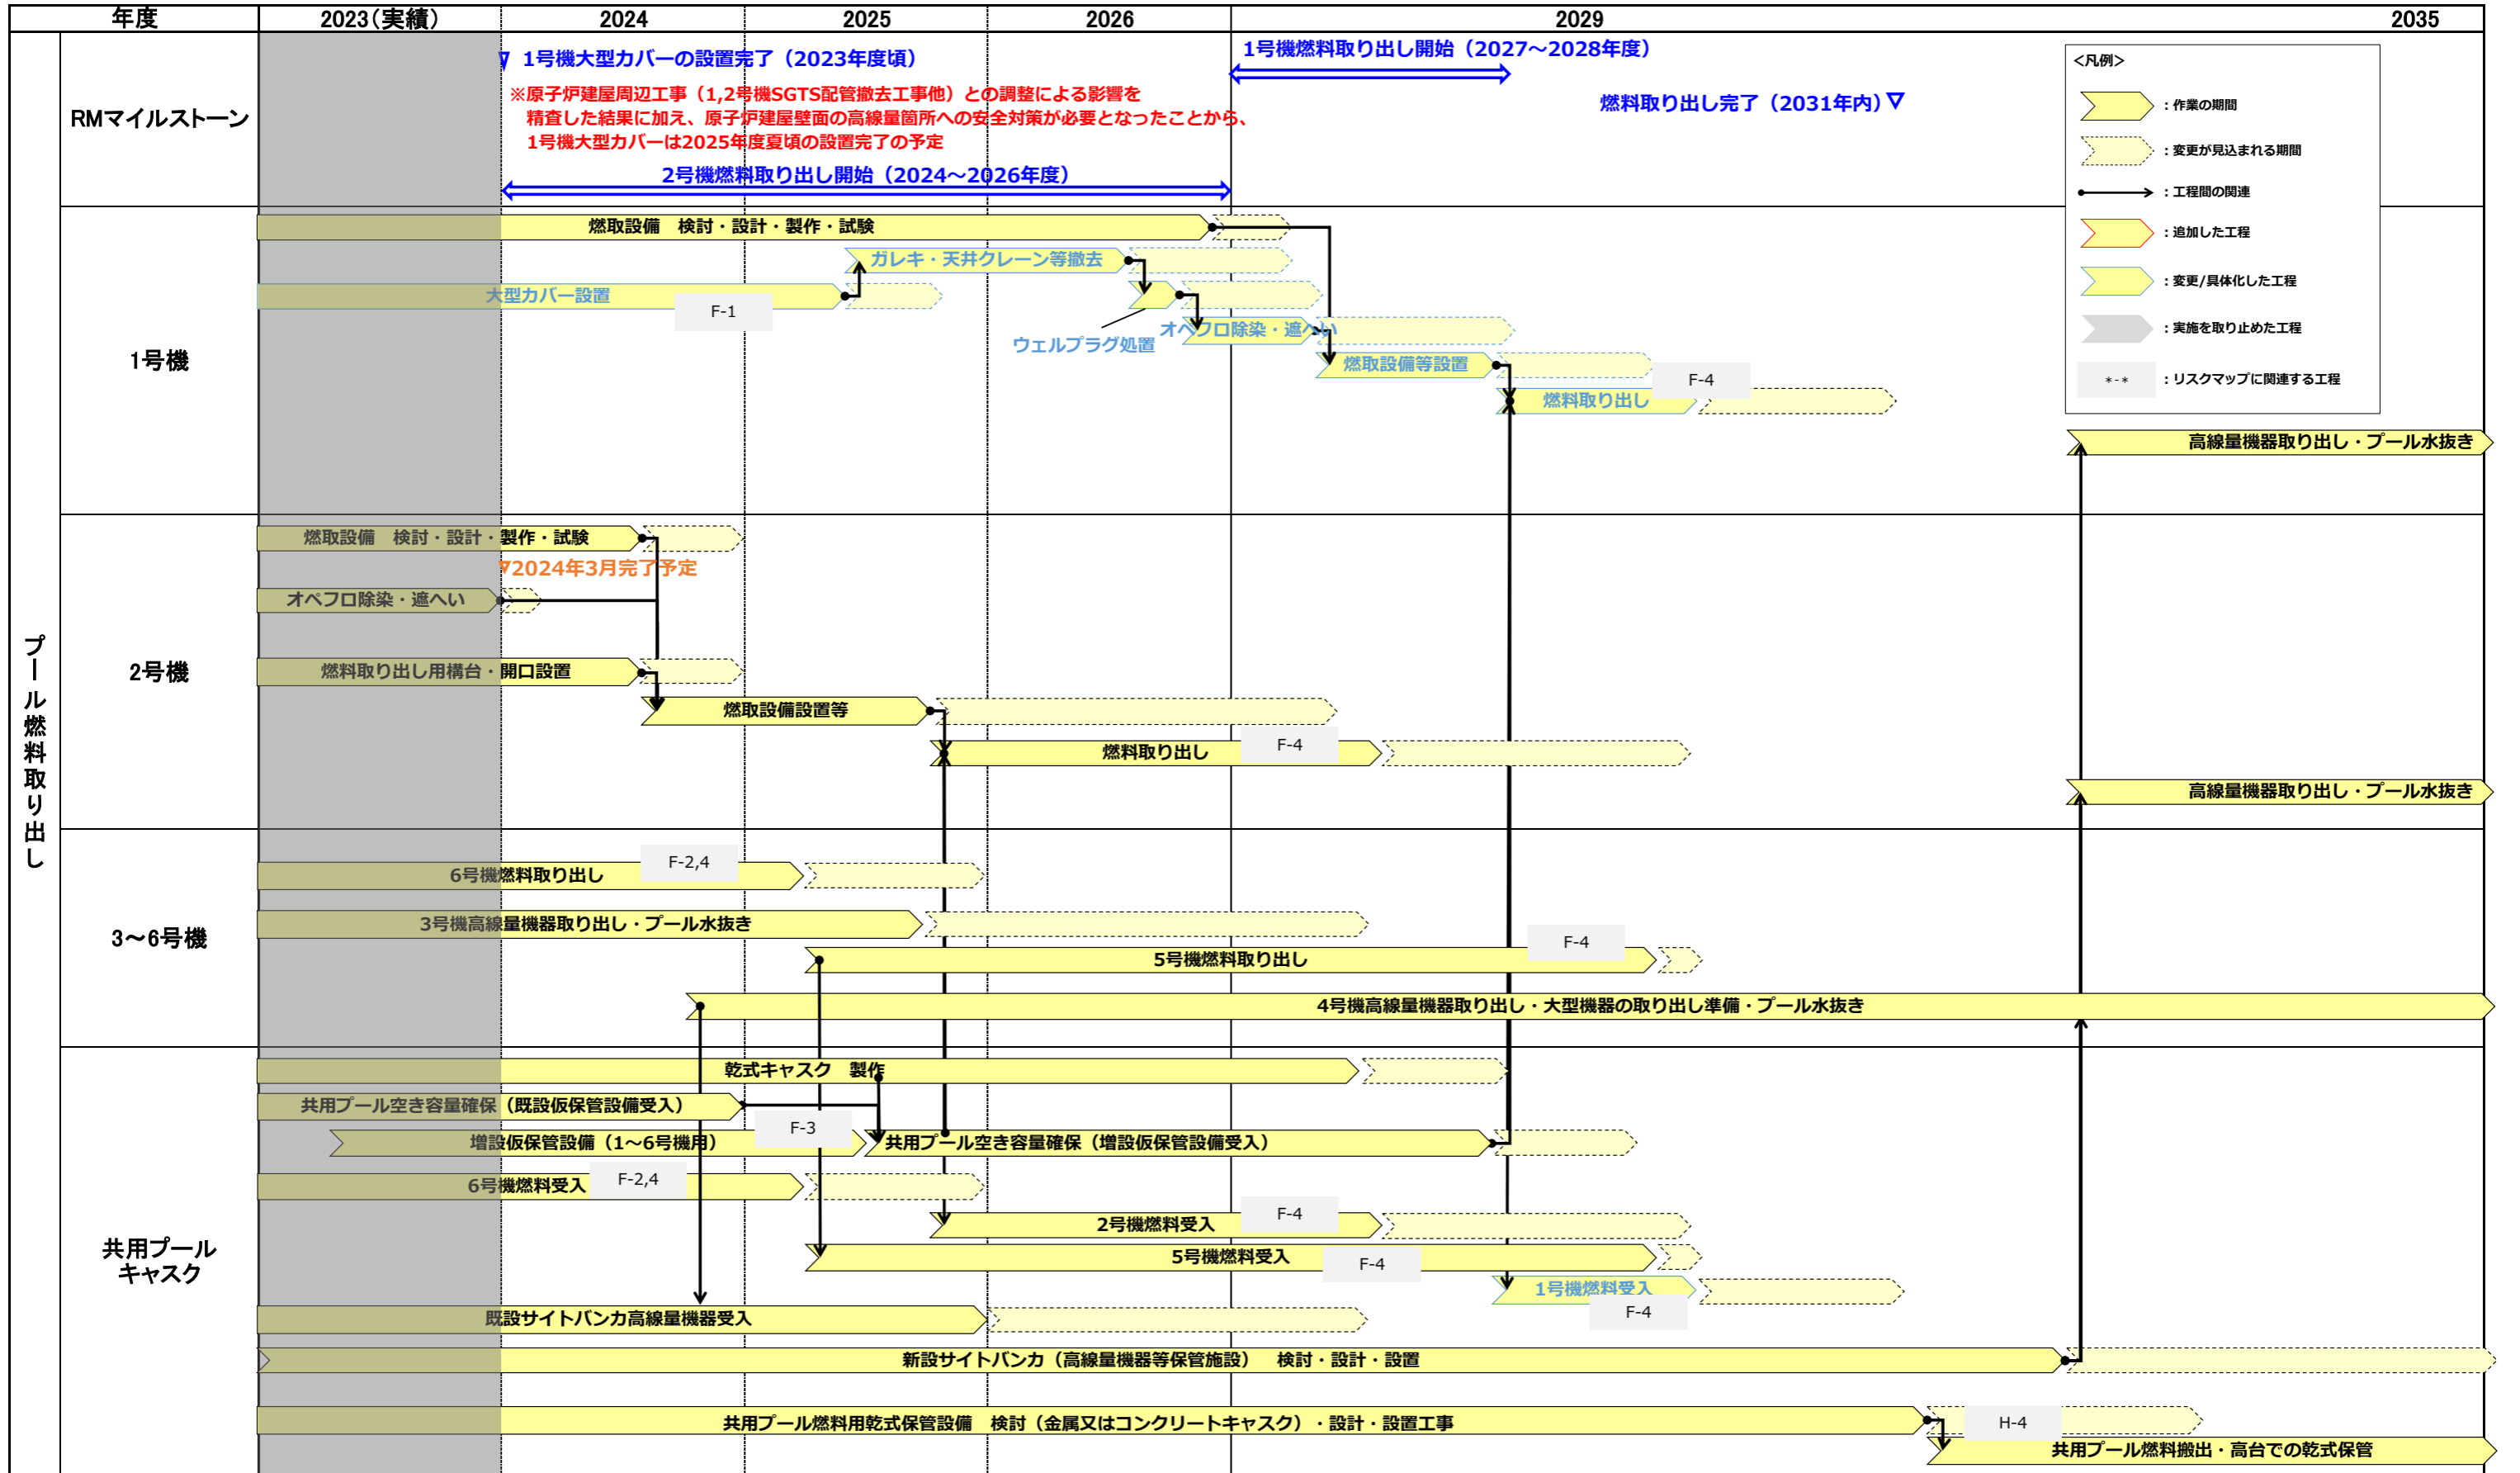

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
