


分野名	項目名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	10月			11月			12月			1月	2月	3月	4月	5月以降	備考					
					13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	6	13		20	27			
使用済燃料プール対策	●1号機大型カバールの設置完了(2023年度頃)	燃料取り出し用カバールの詳細設計の検討	大型カバールの撤去・設計	(実績) 大型カバールの撤去・設計 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・本体鉄骨(下部架構)設置 ・本体鉄骨(上部架構)設置 ・R/B外周鉄骨撤去 ・【構外】大型カバール換気設備他準備工事	検討・設計	大型カバール、ガレキ撤去の検討・設計																	(2026年度完了予定)	
				(予定) 大型カバールの撤去・設計 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・本体鉄骨(下部架構)設置 ・本体鉄骨(上部架構)設置 ・R/B外周鉄骨撤去 ・【構外】大型カバール換気設備他準備工事	現場作業	①現地調査等(13/7/25~)																	(2026年度完了予定)	
				(実績) 大型カバールの撤去・設計 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・本体鉄骨(下部架構)設置 ・本体鉄骨(上部架構)設置 ・R/B外周鉄骨撤去 ・【構外】大型カバール換気設備他準備工事	現場作業	②作業ヤード整備、構外ヤード地組、R/B外周鉄骨撤去等																	(2025年度完了予定)	
	●1号機燃料取り出しの開始(2027~2028年度)	燃料取り出し用カバールの設置工事	燃料取り出し用カバールの設置工事	【構外】ランウェイガード設置(鉄骨地組)	(実績) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作 (予定) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作	現場作業	【構外】ランウェイガード設置(鉄骨地組)																	(2025年度完了予定)
					(実績) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作 (予定) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作	現場作業	⑤R/B南側外壁開口設置(準備作業含む)																	(2025年度完了予定)
					(実績) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作 (予定) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作	現場作業	⑥【構内】ランウェイガード設置																	(2025年度完了予定)
	●2号機燃料取り出しの開始(2024~2026年度)	燃料取り出し用カバールの設置工事	燃料取り出し用カバールの設置工事	【構外】ランウェイガード設置(鉄骨地組)	(実績) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作 (予定) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作	現場作業	⑤R/B南側外壁開口設置(準備作業含む)																	(2025年度完了予定)
					(実績) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作 (予定) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作	現場作業	⑥【構内】ランウェイガード設置																	(2025年度完了予定)
					(実績) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作 (予定) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作	現場作業	⑥【構内】ランウェイガード設置																	(2025年度完了予定)
	●1~6号機燃料取り出し完了(2031年内)	燃料取り出し用カバールの設置工事	燃料取り出し用カバールの設置工事	【構外】ランウェイガード設置(鉄骨地組)	(実績) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作 (予定) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作	現場作業	⑤R/B南側外壁開口設置(準備作業含む)																	(2025年度完了予定)
					(実績) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作 (予定) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作	現場作業	⑥【構内】ランウェイガード設置																	(2025年度完了予定)
					(実績) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作 (予定) 燃料取り出し設備の検討・設計・製作	現場作業	⑥【構内】ランウェイガード設置																	(2025年度完了予定)
●その他プール燃料取り出し関連作業	燃料取捨設備	クレーン/燃料取捨機の設計・製作	燃料取捨機の設計・設計・製作	燃料取捨機	燃料取捨機の設計・設計・製作																	(2026年度完了予定)		
		プール内ガレキの撤去、燃料調査等	燃料取捨機	燃料取捨機の設計・設計・製作・梱包・輸送																	(2026年度完了予定)			
	6号機使用済燃料の搬出	使用済燃料の搬出	使用済燃料搬出	現場作業	使用済燃料搬出作業																	(2025年度完了予定)		
		使用済燃料の搬出	使用済燃料搬出	現場作業	使用済燃料搬出作業																	(2025年度完了予定)		
	共用プール	燃料受け入れ	燃料受け入れ	燃料受け入れ	現場作業	使用済燃料受け入れ作業																	(2025年度完了予定)	
		乾式キャスク製作	乾式キャスク製作・検査	乾式キャスク製作・検査	調達	乾式キャスク製作・検査																	(2025年度完了予定)	
共用プール空き容量確保(仮設保管設備受入)		乾式キャスク搬出作業	乾式キャスク搬出作業	現場作業	乾式キャスク搬出作業																	(2027年度完了予定)		
乾式キャスク保管設備工リア増設		乾式キャスク保管設備工リア増設	乾式キャスク保管設備工リア増設	現場作業	乾式キャスク保管設備工リア増設工事																	(2025年度完了予定)		
高線量機器取り出し	乾式保管設備(共用プール用)検討・設計・設置工事	乾式保管設備(共用プール用)検討	乾式保管設備(共用プール用)検討	検討・設計	乾式保管設備(共用プール用)検討																	(2025年度完了予定)		
	制御棒等高線量機器取り出し	高線量機器取り出し方法の検討	高線量機器取り出し方法の検討	検討・設計	高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作																	(2025年度完了予定)		
		高線量機器取り出し	高線量機器取り出し	現場作業	⑦-1 プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去 ⑦-2 高線量機器取り出し																	(2025年度完了予定)		
	高線量機器取り出し	高線量機器取り出し	高線量機器取り出し	現場作業	高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作																	(2025年度完了予定)		

廃炉中長期実行プラン2024

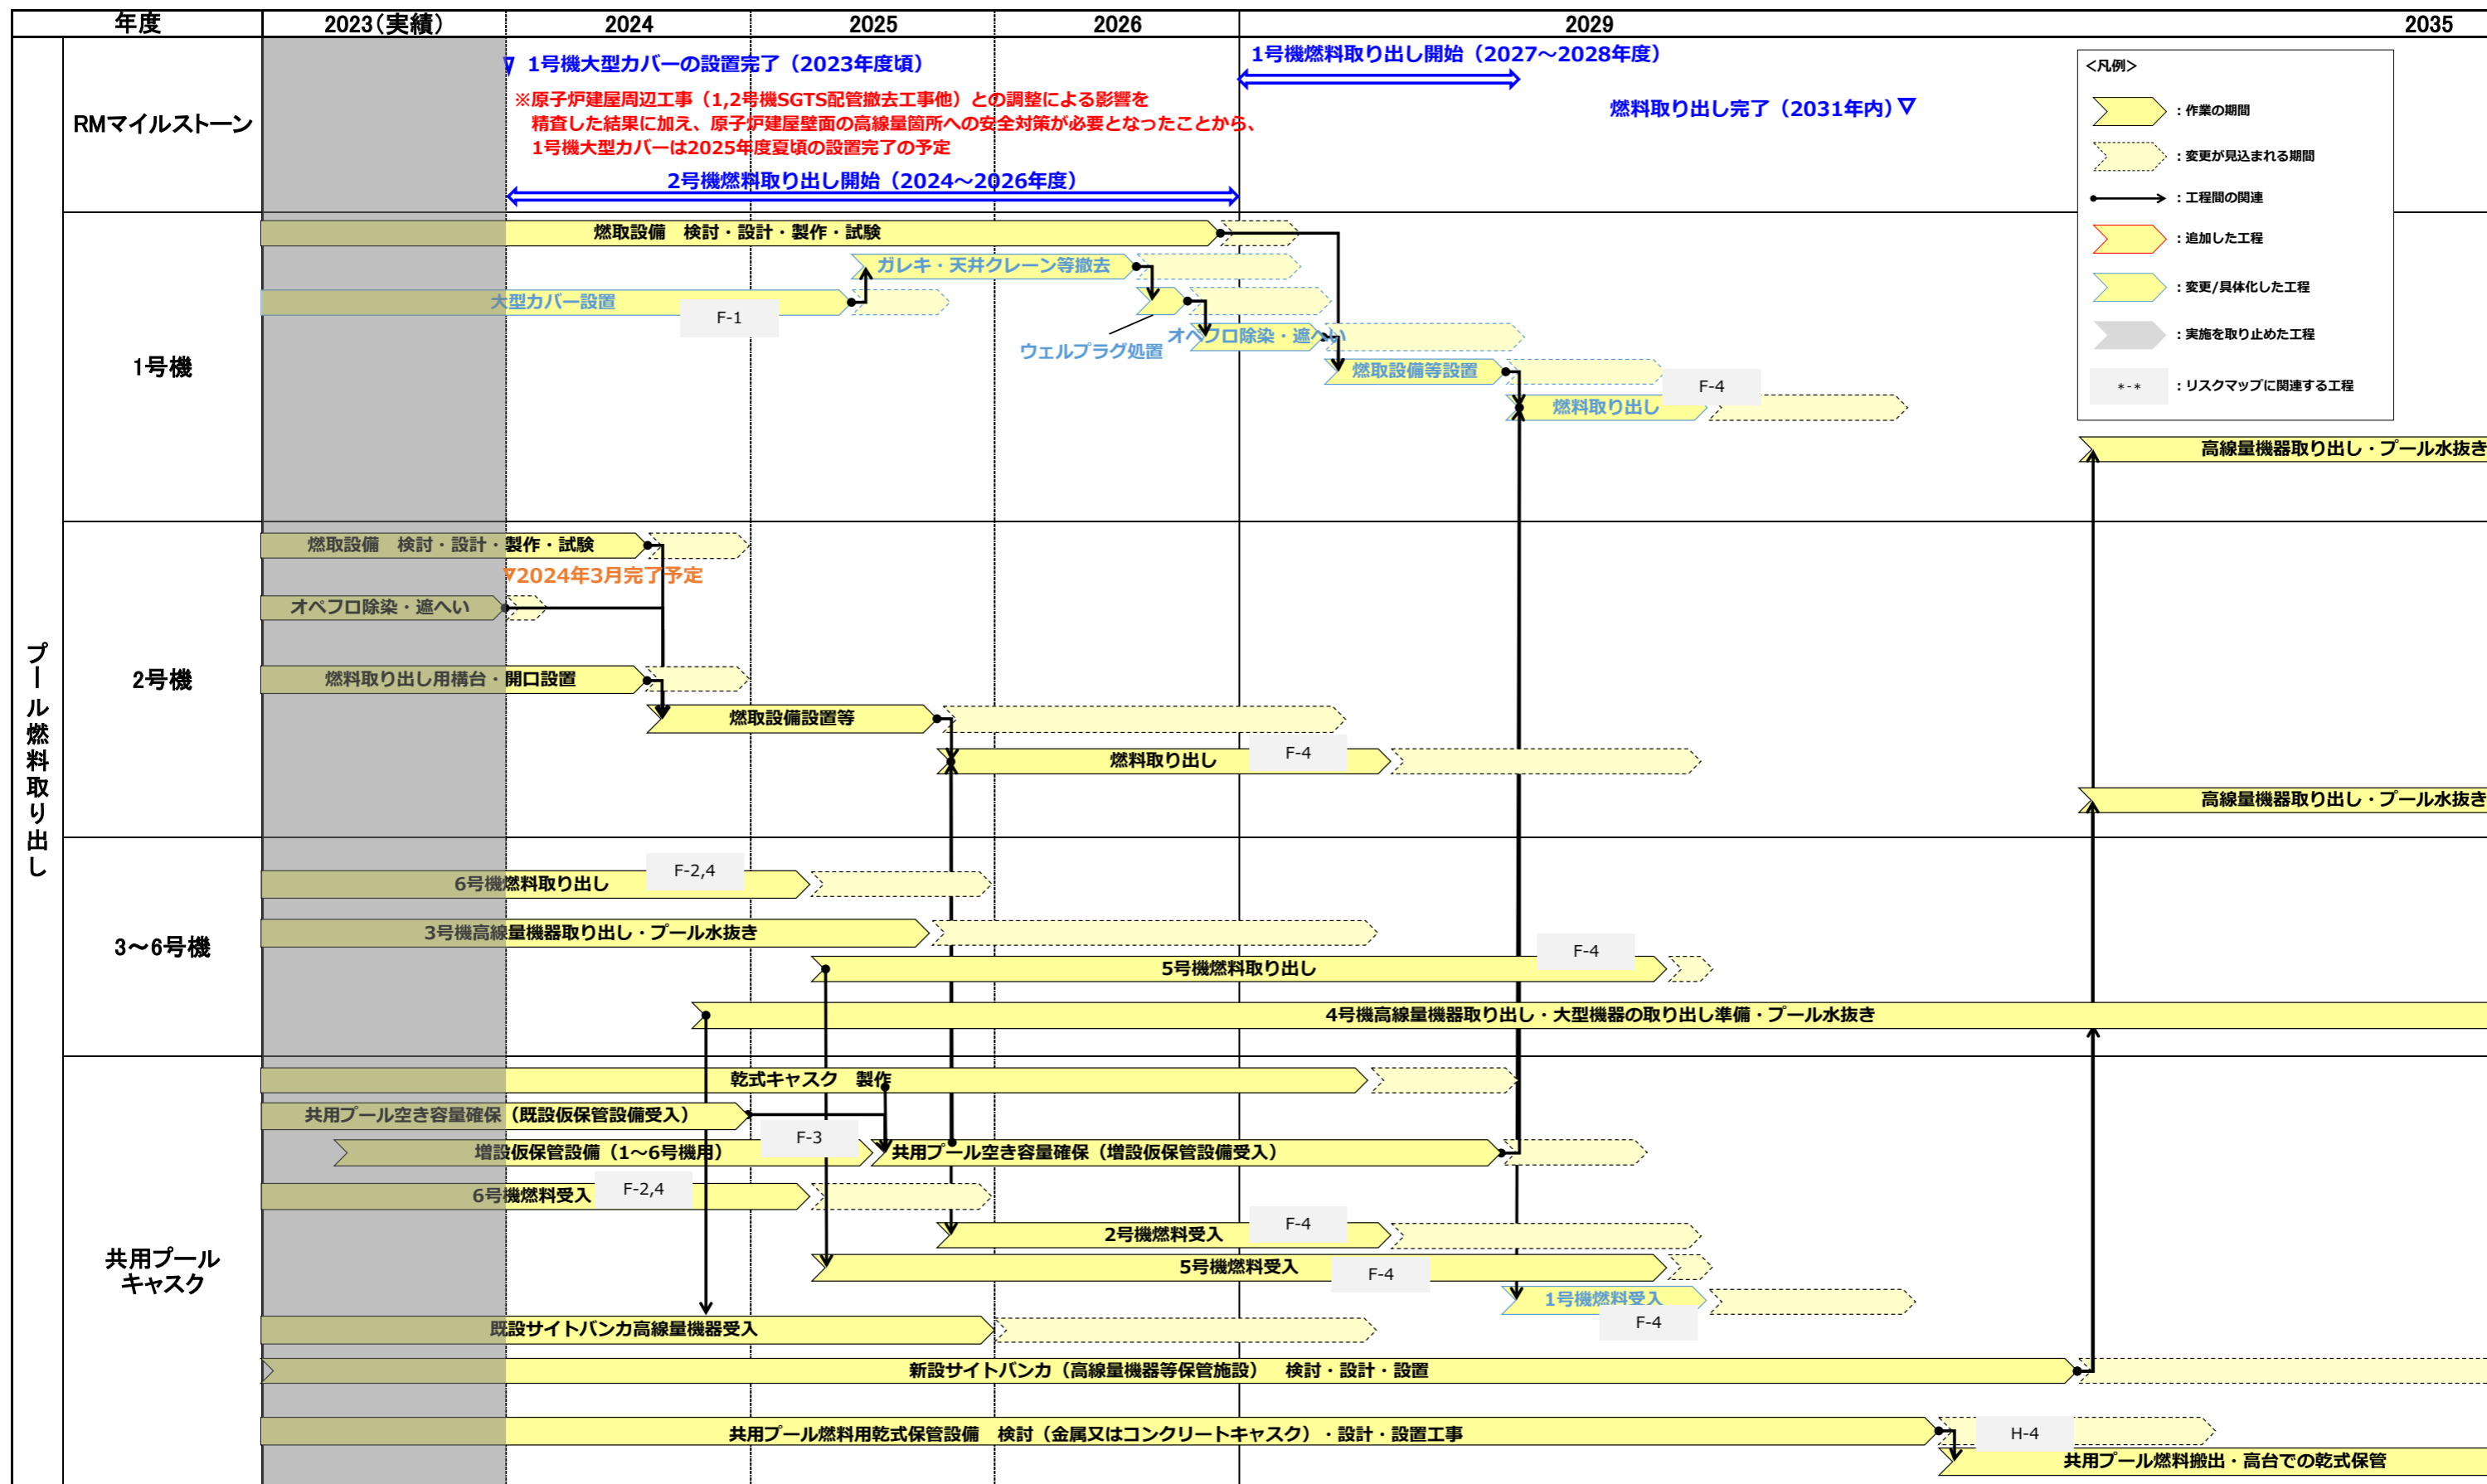

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
