


1 / 3

燃料デブリ取り出し準備 スケジュール

区分	計画	実施計画	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	6月	7月						8月			9月			10月			11月			12月			1月以降			備 考
					2025.6.1	2025.6.8	2025.6.15	2025.6.22	2025.6.29	2025.7.6	2025.7.13	2025.7.20	2025.7.27	2025.8.3	2025.8.10	2025.8.17	2025.8.24	2025.8.31	2025.9.7	2025.9.14	2025.9.21	2025.9.28	2025.10.5	2025.10.12	2025.10.19	2025.10.26	2025.11.2	2025.11.9	2025.11.16	
燃料デブリ取り出し準備	高炉中長期実行プラン2025 目標工程		3号	(実 績) (予 定)	既 成 作 業																									
					既 成 作 業																									
					機 器 ・ 設 計																									
	V/ P/C/V 健全性	圧力容器 /格納容器の 健全性維持		(実 績) ○腐食抑制対策 ・窒素バブリングによる原子炉冷却水中の溶存酸素低減実施（継続） (予 定) ○腐食抑制対策 ・窒素バブリングによる原子炉冷却水中の溶存酸素低減実施（継続）	機 器 ・ 設 計																									
					既 成 作 業																									
					機 器 ・ 設 計																									
	炉心状況把握	炉心状況把握		(実 績) ○事故関連factデータベースの更新（継続） ○炉内・格納容器内の状態に関する推定の更新（継続） (予 定) ○事故関連factデータベースの更新（継続） ○炉内・格納容器内の状態に関する推定の更新（継続）	機 器 ・ 設 計																									
					既 成 作 業																									
					機 器 ・ 設 計																									
	●燃料デブリの処理・処分方法の決定に向けた取り組み	取出後の処理・処分方法の決定に向けた取り組み	燃料デブリ性状把握	(実 績) ○【研究開発】燃料デブリ性状把握のための分析・推定技術の開発 ・燃料デブリ性状の分析に必要な技術開発等（継続） (予 定) ○【研究開発】燃料デブリ性状把握のための分析・推定技術の開発 ・燃料デブリ性状の分析に必要な技術開発等（継続）	機 器 ・ 設 計																									
					既 成 作 業																									
					機 器 ・ 設 計																									
	燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発	燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発	燃料デブリ性状把握	(実 績) ○【研究開発】燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発 粉状・スラリー・スラッジ状の燃料デブリ対応（継続） 燃料デブリ乾燥技術/システムの開発（完了） (予 定) ○【研究開発】燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発 粉状・スラリー・スラッジ状の燃料デブリ対応（継続）	機 器 ・ 設 計																									
					既 成 作 業																									
					機 器 ・ 設 計																									

- 凡 例
- ： 検討業務・設計業務・準備作業
 - ： 現場作業予定
 - ： 機器の運転継続のみで、現場作業（工事）がない場合
 - ： 記載以降も作業や検討が継続する場合は、端を矢印で記載
 - ： 工程調整中のもの

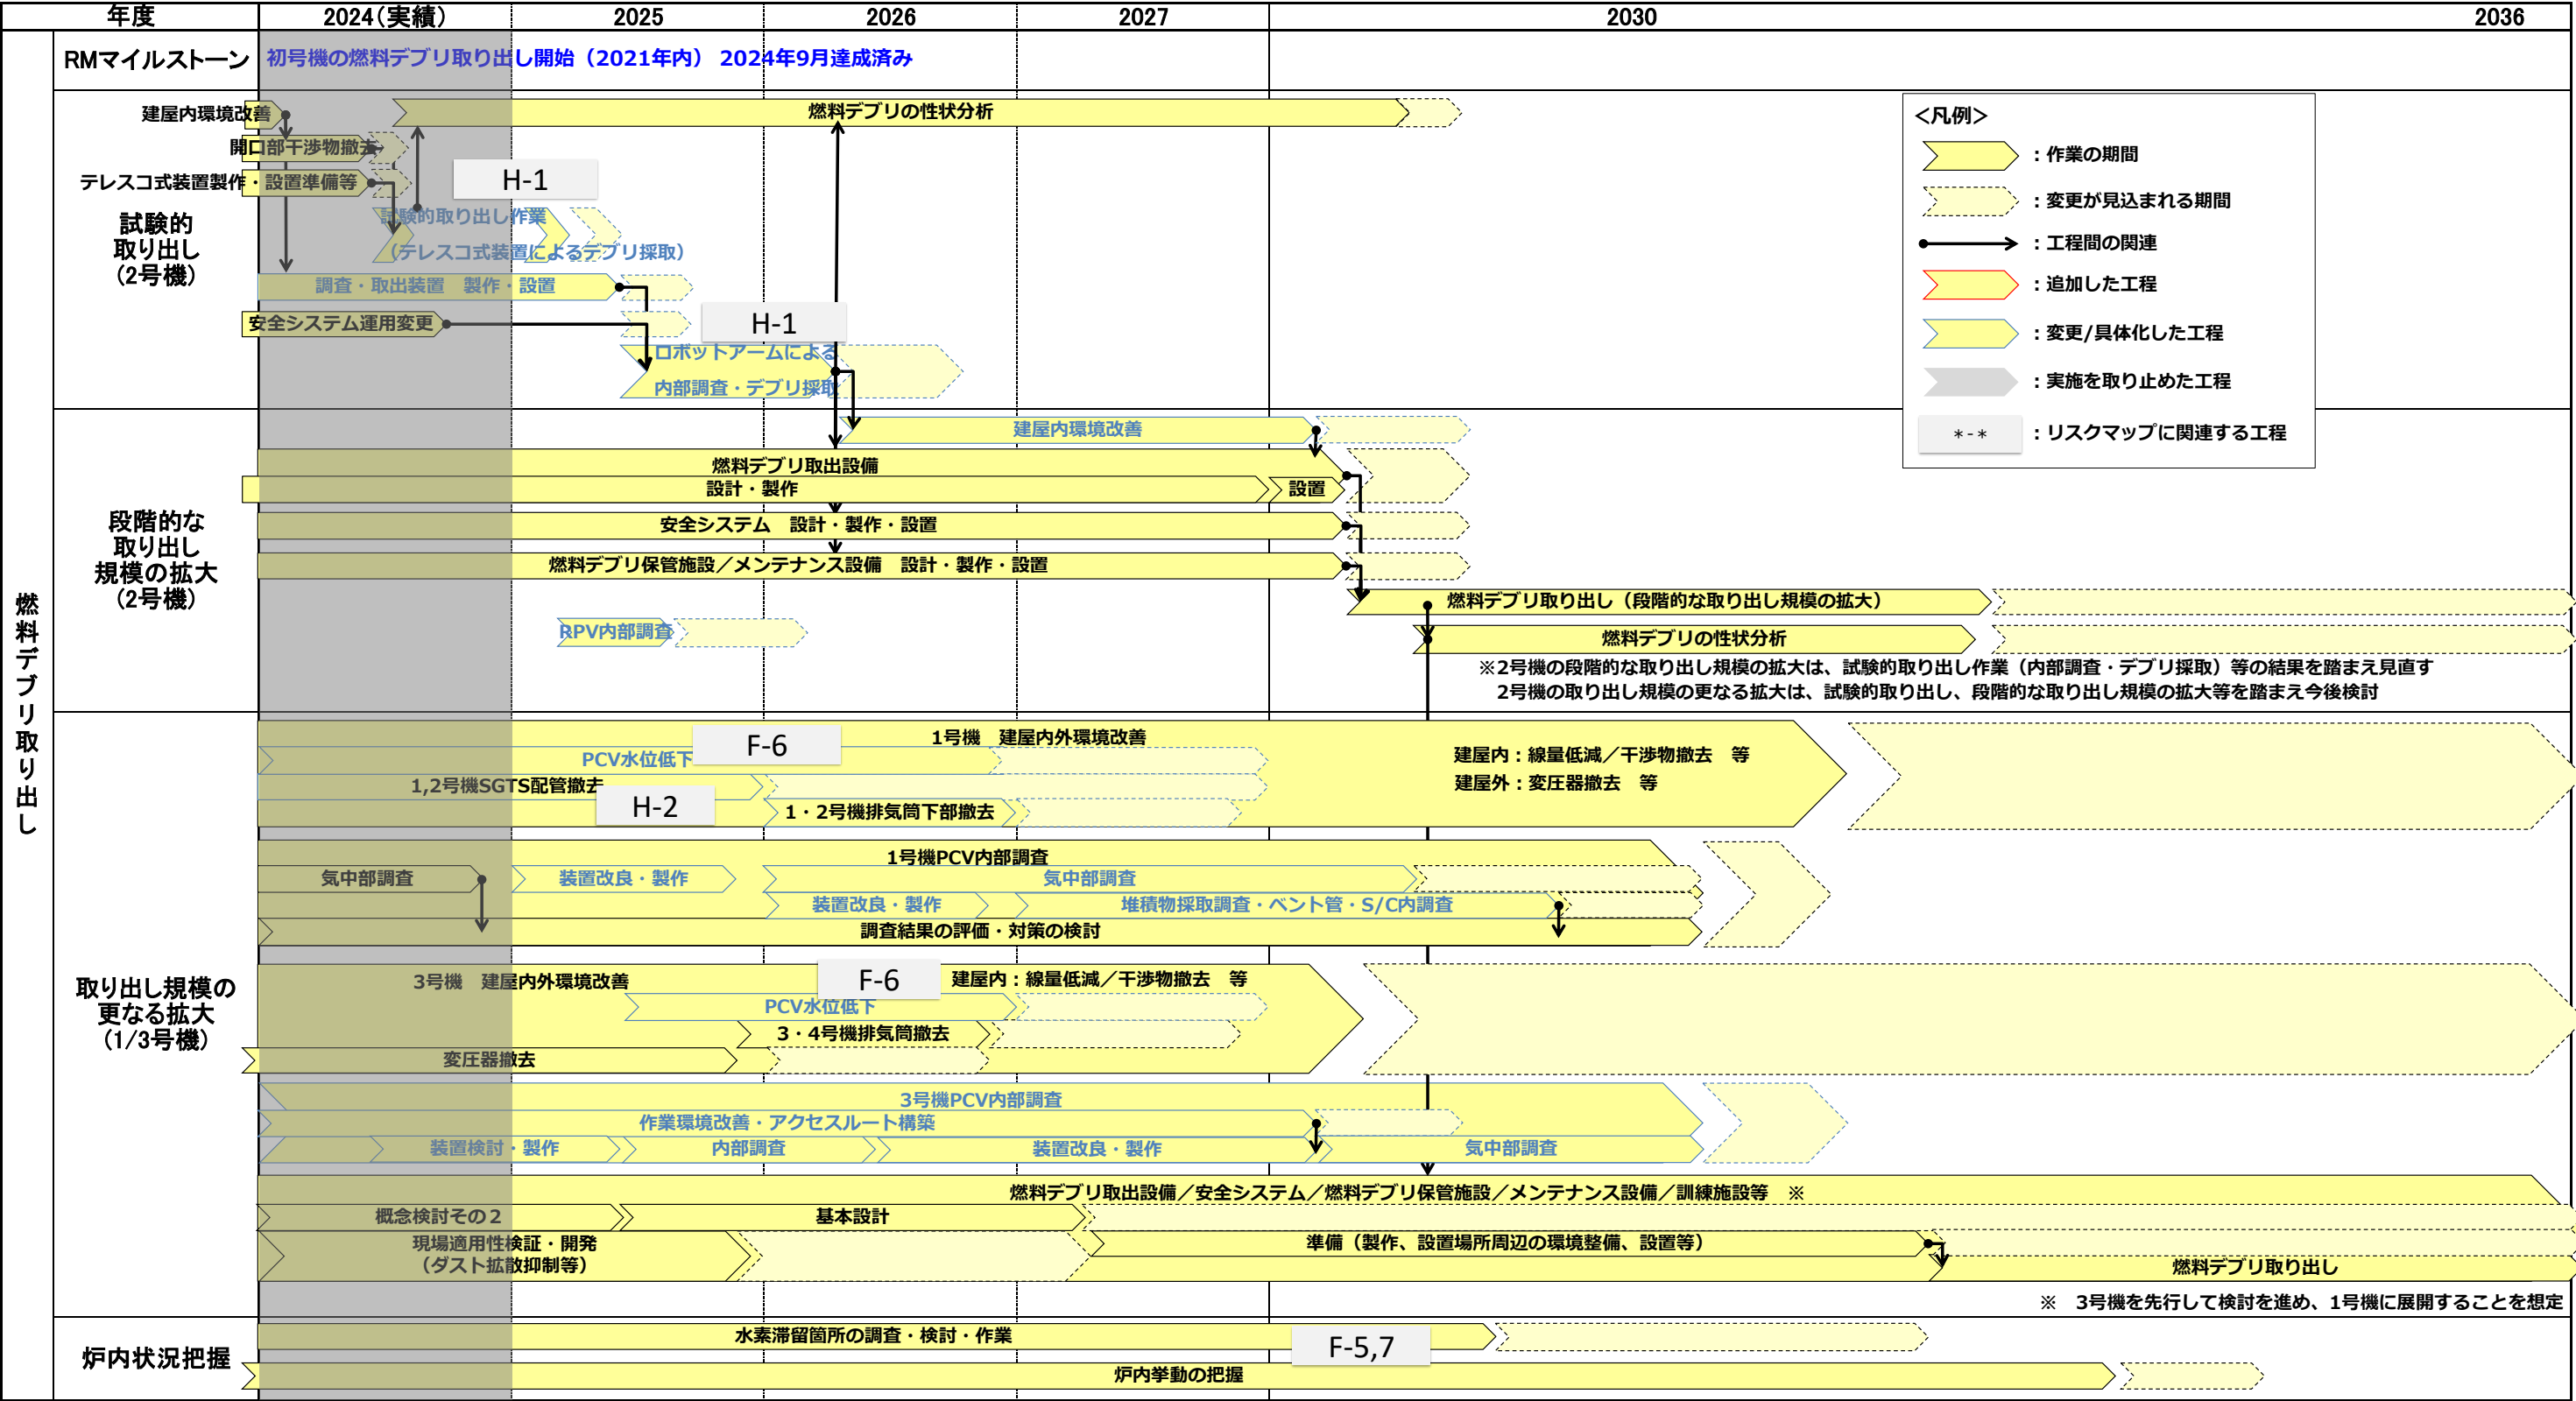

<凡例>

- 作業の期間
- 変更が見込まれる期間
- 工程間の関連
- 追加した工程
- 変更/具体化した工程
- 実施を取り止めた工程
- *-* : リスクマップに関連する工程

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
