


汚染水対策スケジュール（1/2）

分野 別	注 記	実施中長期実行プラン2025目標工程	対象設備・ 作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	7月						8月						9月			10月			11月			12月			1月			2月以降	備 考
					1	6	13	20	27		1	3	10	17	24		1	4	7	1	4	7	1	4	7	1	4	7	1	4	7		
汚 染 水 対 策 分 野	●建屋滞留水の処理	建屋内滞留水	【1～4号機 滞留水移送装置】 （実績） ・1～4号機滞留水移送装置運転 （予定） ・1～4号機滞留水移送装置運転	現場作業 1～4号機滞留水移送装置設置 運転																												（継続運転） プロセス主建屋・高温焼却炉建屋滞留水移送装置の設置に係る実施計画変更（2025年6月27日認可）	
			【α核種除去設備検討】	設計・工事 設計・検討							詳細設計・工事																						（2027年度工事完了予定） α核種除去設備の設置に係る実施計画変更（2024年6月27日申請）
			【1～4号機 T/B床面スラッジ等の回収方法検討】	設計・検討							設計検討																						（2026年度工事完了予定）
			【滞留水一時貯留設備】	設計・工事 設計・工事							詳細設計・工事																						（2026年度工事完了予定） 建屋滞留水一時貯留設備の設置に係る実施計画変更（2025年1月21日認可）
			【プロセス主建屋・高温焼却建屋ゼオライト工費の検討】	容器封入集積作業							容器封入作業 詳細設計・工事																						（2025年度 容器封入作業着手予定） 容器封入作業 実績値モックアップ（2023年9月～） 容器封入作業 実施計画変更（2023年3月31日申請） 集積作業開始（2025年3月26日）
汚 染 水 対 策 分 野	●汚染水発生量を 50～70m3/日程度に 抑制(2028年度末)	浄化設備	【施設多核種除去設備】 【高性能多核種除去設備】 【建設多核種除去設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）																												（継続運転） 施設多核種除去設備 前処理設備改造に係る実施計画変更申請（2022年4月28日認可） 使用前検査終了証受領 2024年5月31日 濃縮液源の試験的先行処理実施中 前処理設備改造後のWOT試験を実施中	
			【サブドレン浄化設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業 処理運転																													（継続運転）
			【地下水バイパス設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現場作業 運転																													（継続運転） 2025年7月4日、排水井Bの点検完了。稼働再開済み
			【セシウム吸着装置】 【第二セシウム吸着装置】 【第三セシウム吸着装置】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業 処理運転																													（継続運転）
			【RO-3】 【建屋汚FO 循環設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現場作業 運転																													（継続運転）
		陸側排水壁	（実績） ・維持管理運転 （予定） ・維持管理運転	現場作業 維持管理運転																													（継続運転）
		フェーシング（陸側排水壁内エリア）	【準主建内フェーシング（全6万㎡）】 ・2号機建屋西側	現場作業							2号機建屋西側																						
		1～4号機建屋周辺トレンチ調査	（実績・予定） ・5箇所の調査実施（2025年度） ・2025年5月 調査開始 ・2025年6月 調査完了	現場作業																													2025年5月1日：2025年度調査開始 2025年6月30日：2025年度調査完了
		建屋間ギャップ漏れ止水対策	（実績・予定） ・3号機：6箇所（2025年度） ・4号機：6箇所（2026年度）	現場作業																													【3号機】 2026年3月：完了予定 2024年7月16日 準備工事開始 （2025年度：6箇所/6箇所完了予定）
汚 染 水 対 策 分 野	●タンク関連	H4エリアNo. 5 タンクからの漏えい対策	（実績・予定） ・汚染の拡散状況把握	現場作業 モニタリング																												（継続実施）	
			（実績） ・解体基数 48基/49基 ・Eエリアフランジタンク（D1）内の残水回収（スラッジ含む） 実施中 （予定） ・Eエリアフランジタンク解体工事 ：49基解体予定（2026年4月2026年3月頃） ・Eエリアフランジタンク（D1）内の残水回収	現場作業 Eエリアフランジタンク解体工事 Eエリアフランジタンク（D1）内の残水回収																												（2025年度タンク解体完了予定） ・D1タンク以外は解体完了済み	2018年9月10日 Eエリアにおける中低濃度タンクの撤去等について（実施計画変更認可） 2024年7月17日：D2タンク解体完了 2025年1月9日：EエリアD1タンク内のスラッジ回収作業開始 2025年3月21日：タンク内でのスラッジ回収作業開始 2025年7月以降も回収作業を継続
		タンク解体	（実績） ・J9エリアタンク解体基数 11基/12基 （予定） ・J8、J9タンク解体工事	現場作業 タンク解体作業 （7/1）9基目解体完了（7/11）10基目解体完了（7/30）11基目解体完了																													2025年2月3日：実施計画認可 2025年2月14日：解体作業開始
			（実績） ・解体基数 10基/367基 （予定） ・横置きタンク解体工事	現場作業																													横置きタンクの解体に係る実施計画変更（2024年5月17日認可） 2024年10月10日未使用タンクの搬入実施 2024年11月：未使用タンクから除去試験開始 10基/28基 未使用タンク解体完了 2025年2月3日に発生した火災トラブルにより関連作業中断中。（再開時期未定） 6月12日 火災発生原因と対策の方向性について公表。
		●自然災害対策	津波対策	○サブドレン集水設備高台機能移転 （実績・予定）ろ過水タンク西側整備工事実施（完了） 地盤改良（完了） 集水設備設置（10基）（完了） 移送設備設置	現場作業 サブドレン集水設備高台機能移転工事																												

廃炉中長期実行プラン2025

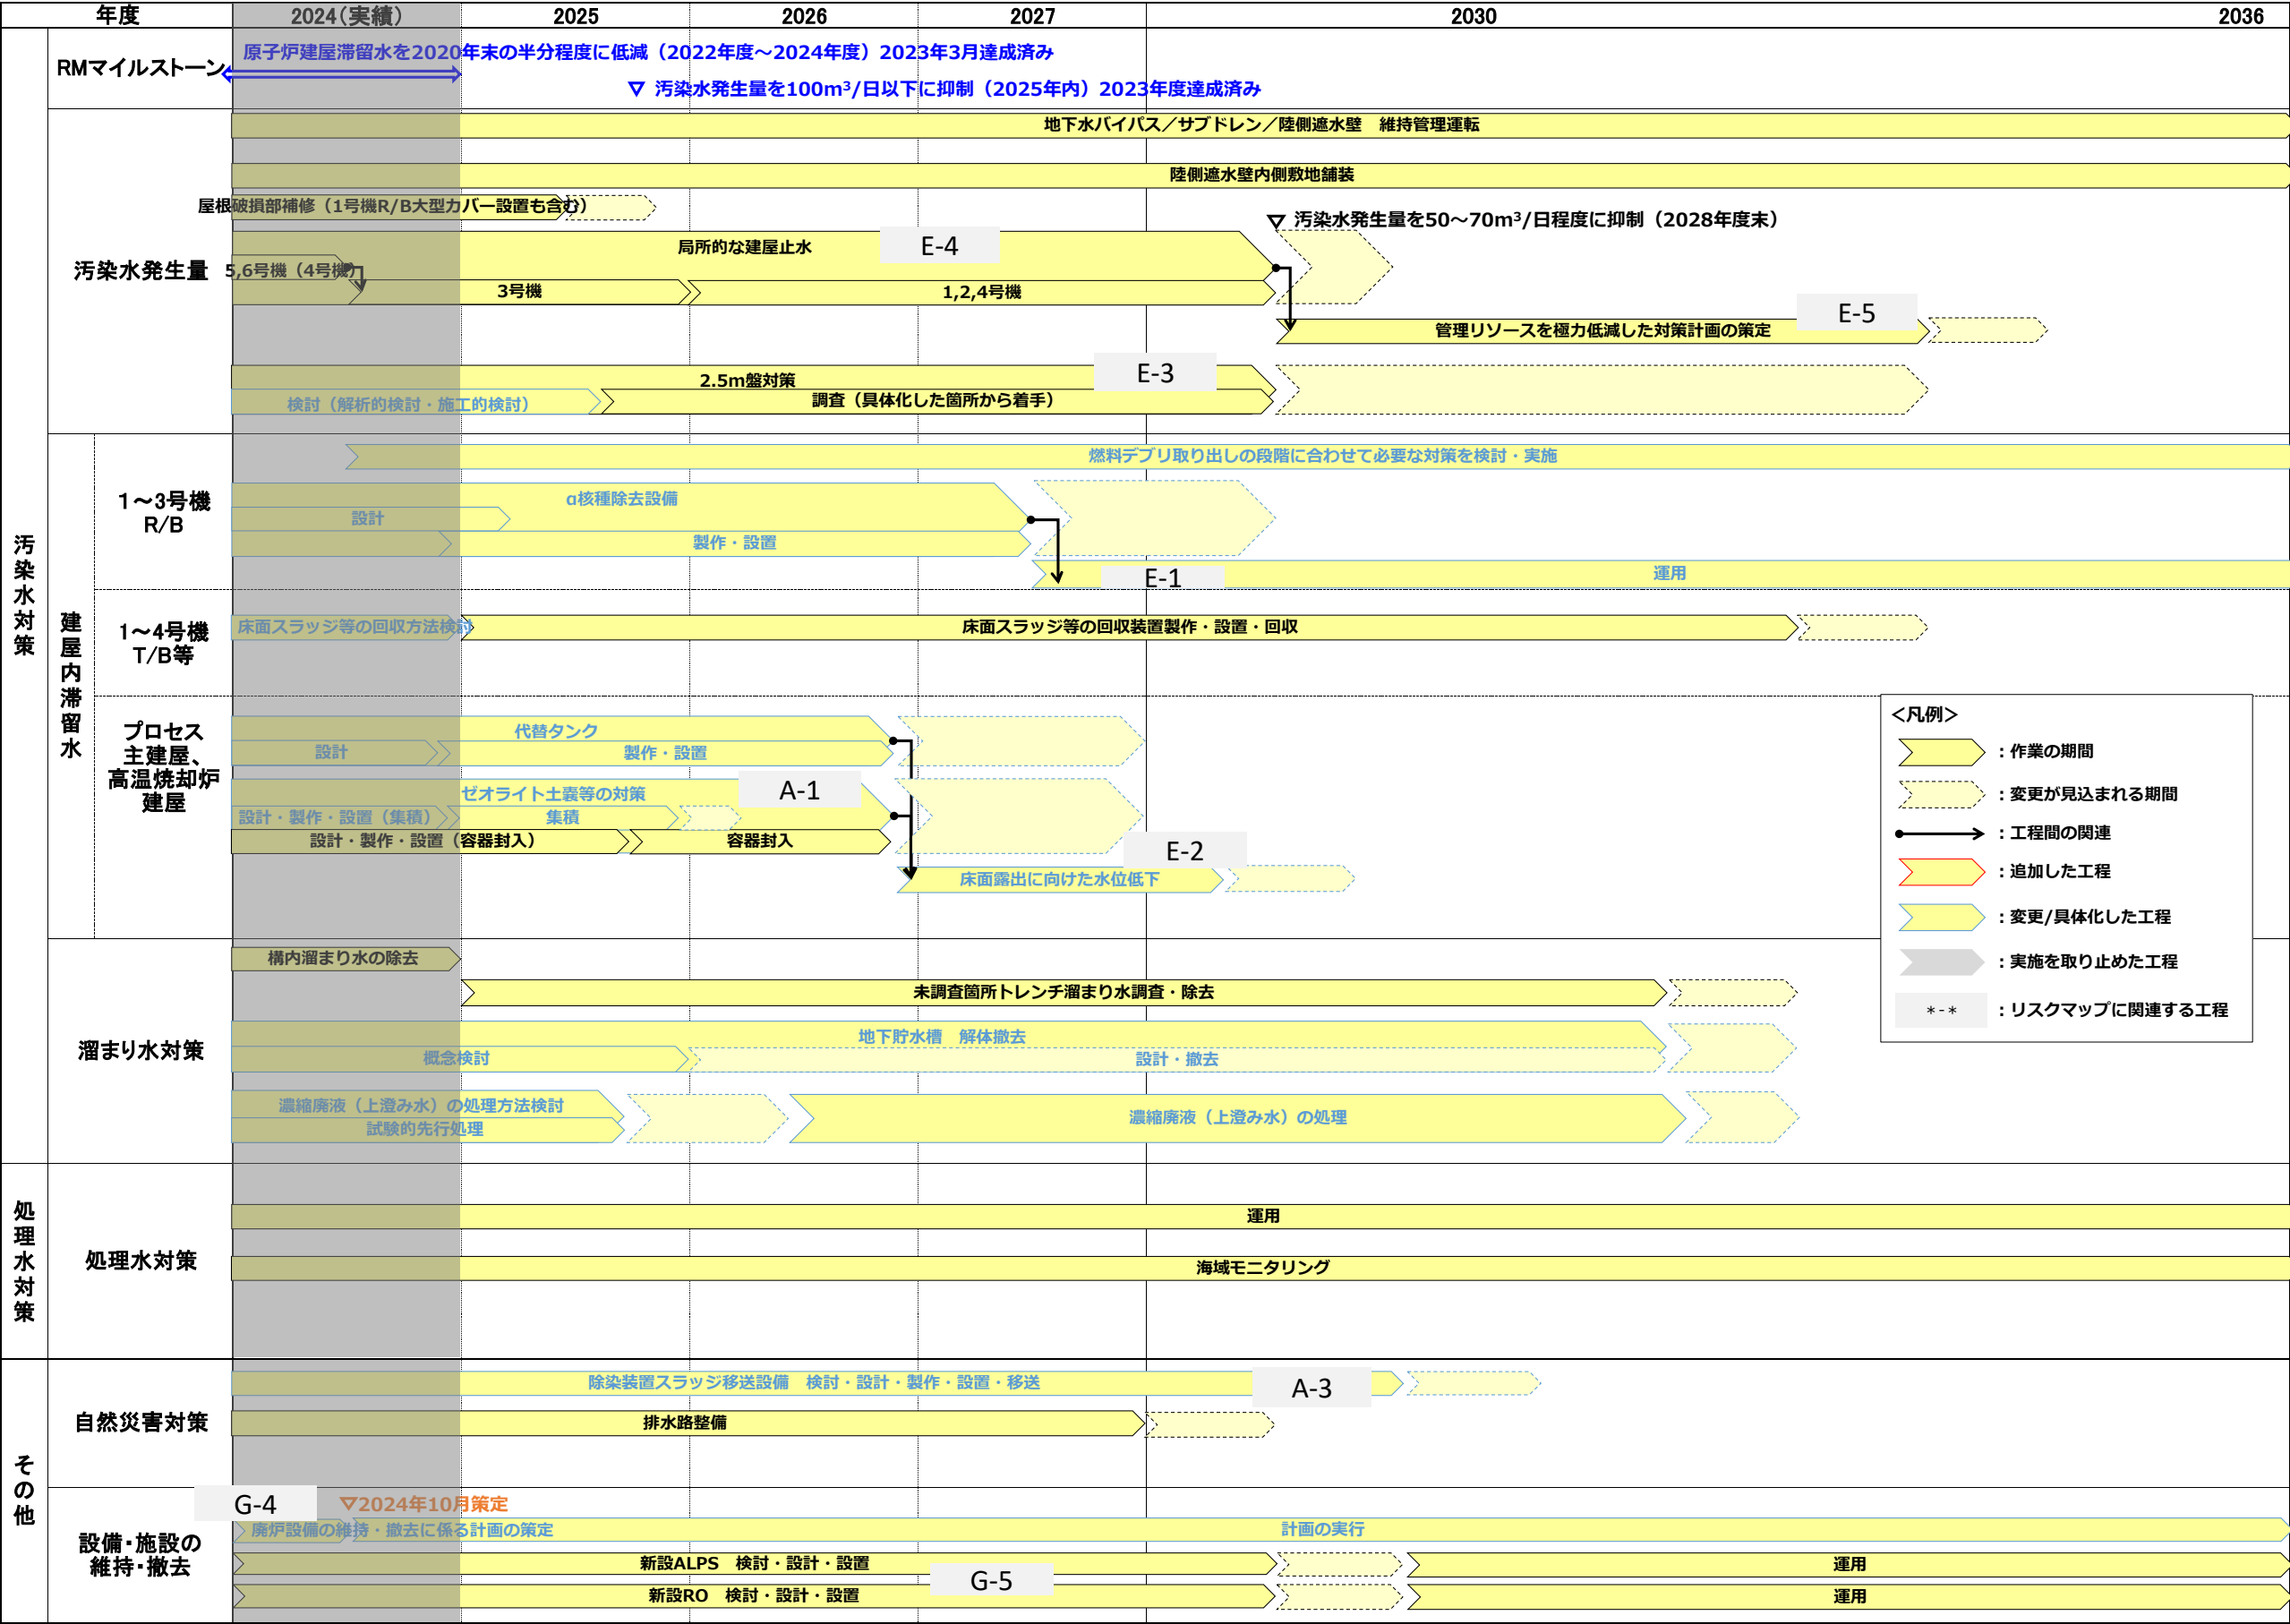

<凡例>

- 作業の期間
- 変更が見込まれる期間
- 工程間の関連
- 追加した工程
- 変更/具体化した工程
- 実施を取り止めた工程
- * - * : リスクマップに関連する工程

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
