


汚染水対策スケジュール（1/2）

出 発 点	経 路	汚染水 対 策 分 野	対象設備・ 作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	8月						9月						10月			11月	12月	1月	2月	3月以降	備 考		
					1	3	10	17	24	31	1	7	14	21	28	上	中	下	上	中	下	上	中			下	
●建屋滞留水の処理	建屋内滞留水		【1～4号機 滞留水移送装置】 （実績） ・1～4号機滞留水移送装置運転 （予定） ・1～4号機滞留水移送装置運転	現 場 作 業	1～4号機滞留水移送装置設置 運転																				（継続運転）	プロセス主建屋・高温焼却炉建屋滞留水移送装置の設置に係る実施計画変更（2025年6月27日認可）	
			【α核種除去設備検討】	設 計 ・ 工 事							詳細設計・工事															（2027年度 工事が予定）	α核種除去設備の設置に係る実施計画変更（2024年6月27日申請）
			【1～4号機 T/B床面スラッジ等の回収方法検討】	設 計 ・ 検 討							設計検討																
			【滞留水－特貯留設備】	設 計 ・ 工 事							詳細設計・工事															（2026年度 工事が予定）	建屋滞留水－特貯留設備の設置に係る実施計画変更（2025年1月21日認可）
			【プロセス主建屋・高温焼却建屋セオライト土壌の検討】	資 材 封 入 集 積 作 業							容器封入作業 詳細設計・工事 集積作業 詳細設計・工事																容器封入作業 実績確認モックアップ（2023年9月～） 容器封入作業 実施計画変更（2023年3月31日申請） 容器封入作業の着手時期は1年程度の遅れとなる見込みであるが、現在精査中。 集積作業開始（2025年3月26日）
●汚染水発生量を 50～70m3/日程度に 抑制(2028年度末)	浄化設備		【底設多核種除去設備】 【高性能多核種除去設備】 【増設多核種除去設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現 場 作 業	処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）																				（継続運転）	処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転 または処理停止 増設多核種除去設備 前処理設備改造に係る実施計画変更申請（2022年4月28日認可） 使用前検査終了証受領 2024年5月31日 連続搬送の試験的先行処理実施中 前処理設備改造後のH・OT試験を実施中	
			【サブドレン浄化設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現 場 作 業	処理運転																					（継続運転）	
			【地下水バイパス設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現 場 作 業	運転																					（継続運転）	2025年7月4日、排水井Bの点検完了。稼働再開済み
			【セシウム吸着装置】 【第二セシウム吸着装置】 【第三セシウム吸着装置】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現 場 作 業	処理運転																					（継続運転）	
			【RO-3】 【建屋内FO 処理設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現 場 作 業	運転																					（継続運転）	
	陸側排水壁		（実績） ・維持管理運転 （予定） ・維持管理運転	現 場 作 業	維持管理運転																				（継続運転）		
			【東土壁内フェーシング（全6万㎡）】 ・2号機建屋西側 ・1/2号機東側	現 場 作 業	2号機建屋西側、1/2号機東側																						
			（実績・予定） ・5箇所の調査実施（2025年度） ・2025年5月 調査開始 ・2025年6月 調査完了	現 場 作 業																						2025年5月1日 2025年度調査開始 2025年6月30日 2025年度調査完了	
	1-4号機建屋周辺ト レンチ調査	（実績・予定） ・3号機：6箇所（2025年度） ・汚染の拡散状況把握	現 場 作 業																					【3号機】 2026年3月：完了予定	2024年7月16日準備工事開始 （2025年度：6箇所/6箇所完了予定）		
	●タンク関連	タンク解体	H4エリアNo. 5タ ンクからの漏えい対策	（実績・予定） ・汚染の拡散状況把握	現 場 作 業	モニタリング																				（継続実施）	
（実績） ・解体基数 48基/49基 ・Eエリアフランジタンク（D1）内の残水回収（スラッジ含む）実施中 （予定） ・Eエリアフランジタンク解体工事 ：49基解体予定（2026年3月頃） ・Eエリアフランジタンク（D1）内の残水回収				現 場 作 業	Eエリアフランジタンク解体工事 Eエリアフランジタンク（D1）内の残水回収																			（2025年度タンク解体完了予定） +D1タンク以外は解体完了済み	2018年9月10日 Eエリアにおける中低濃度タンクの撤去等について（実施計画変更認可） 2024年7月17日：D2タンク解体完了 2025年1月9日：EエリアD1タンク内のスラッジ回収作業開始 2025年3月21日：タンク内でのスラッジ回収作業開始 2025年7月以降も回収作業を継続		
（実績） ・J9エリアタンク解体基数 12基/12基 （予定） ・J&J9エリアタンク解体工事			現 場 作 業	タンク解体作業 (9/3) J9エリアタンク：12基目解体完了																					2025年2月3日：実施計画認可 2025年2月14日：解体作業開始 2025年9月3日：J9エリアタンク解体完了		
（実績） ・解体基数 10基/367基 （予定） ・横置きタンク解体工事			現 場 作 業																						横置きタンクの解体に係る実施計画変更（2024年5月17日認可） 2024年10月10日未使用タンクの搬入実施 2024年11月：未使用タンクから除染解体試験開始 10基/28基 未使用タンク解体完了 2025年2月3日に発生した火災トラブルにより現場作業中断中。（再開時期未定） 6月12日 火災発生原因と対策の方向性について公表。		
●自然災害対策			津波対策	○サブドレン集水設備高台機能移転 （実績・予定）ろ過水タンク西側設備工事実施（完了） 増設改修（完了） 集水設備設置（10基）（完了） 移送設備設置	現 場 作 業	サブドレン集水設備高台機能移転工事																				2023年10月20日 サブドレン集水設備及び地下水ドレン設備の準並対策に伴うT.P.33.5m壁への移設について（実施計画変更申請）→ 2024年11月1日 変更申請認可 2025年3月17日～19日 使用前検査一部受検完了（高台集水タンク） 2025年6月25日 運搬作業完了 8.5m壁受けタンク設置エリアの見直し（検討中）に伴う工事期間の延伸	

廃炉中長期実行プラン2025

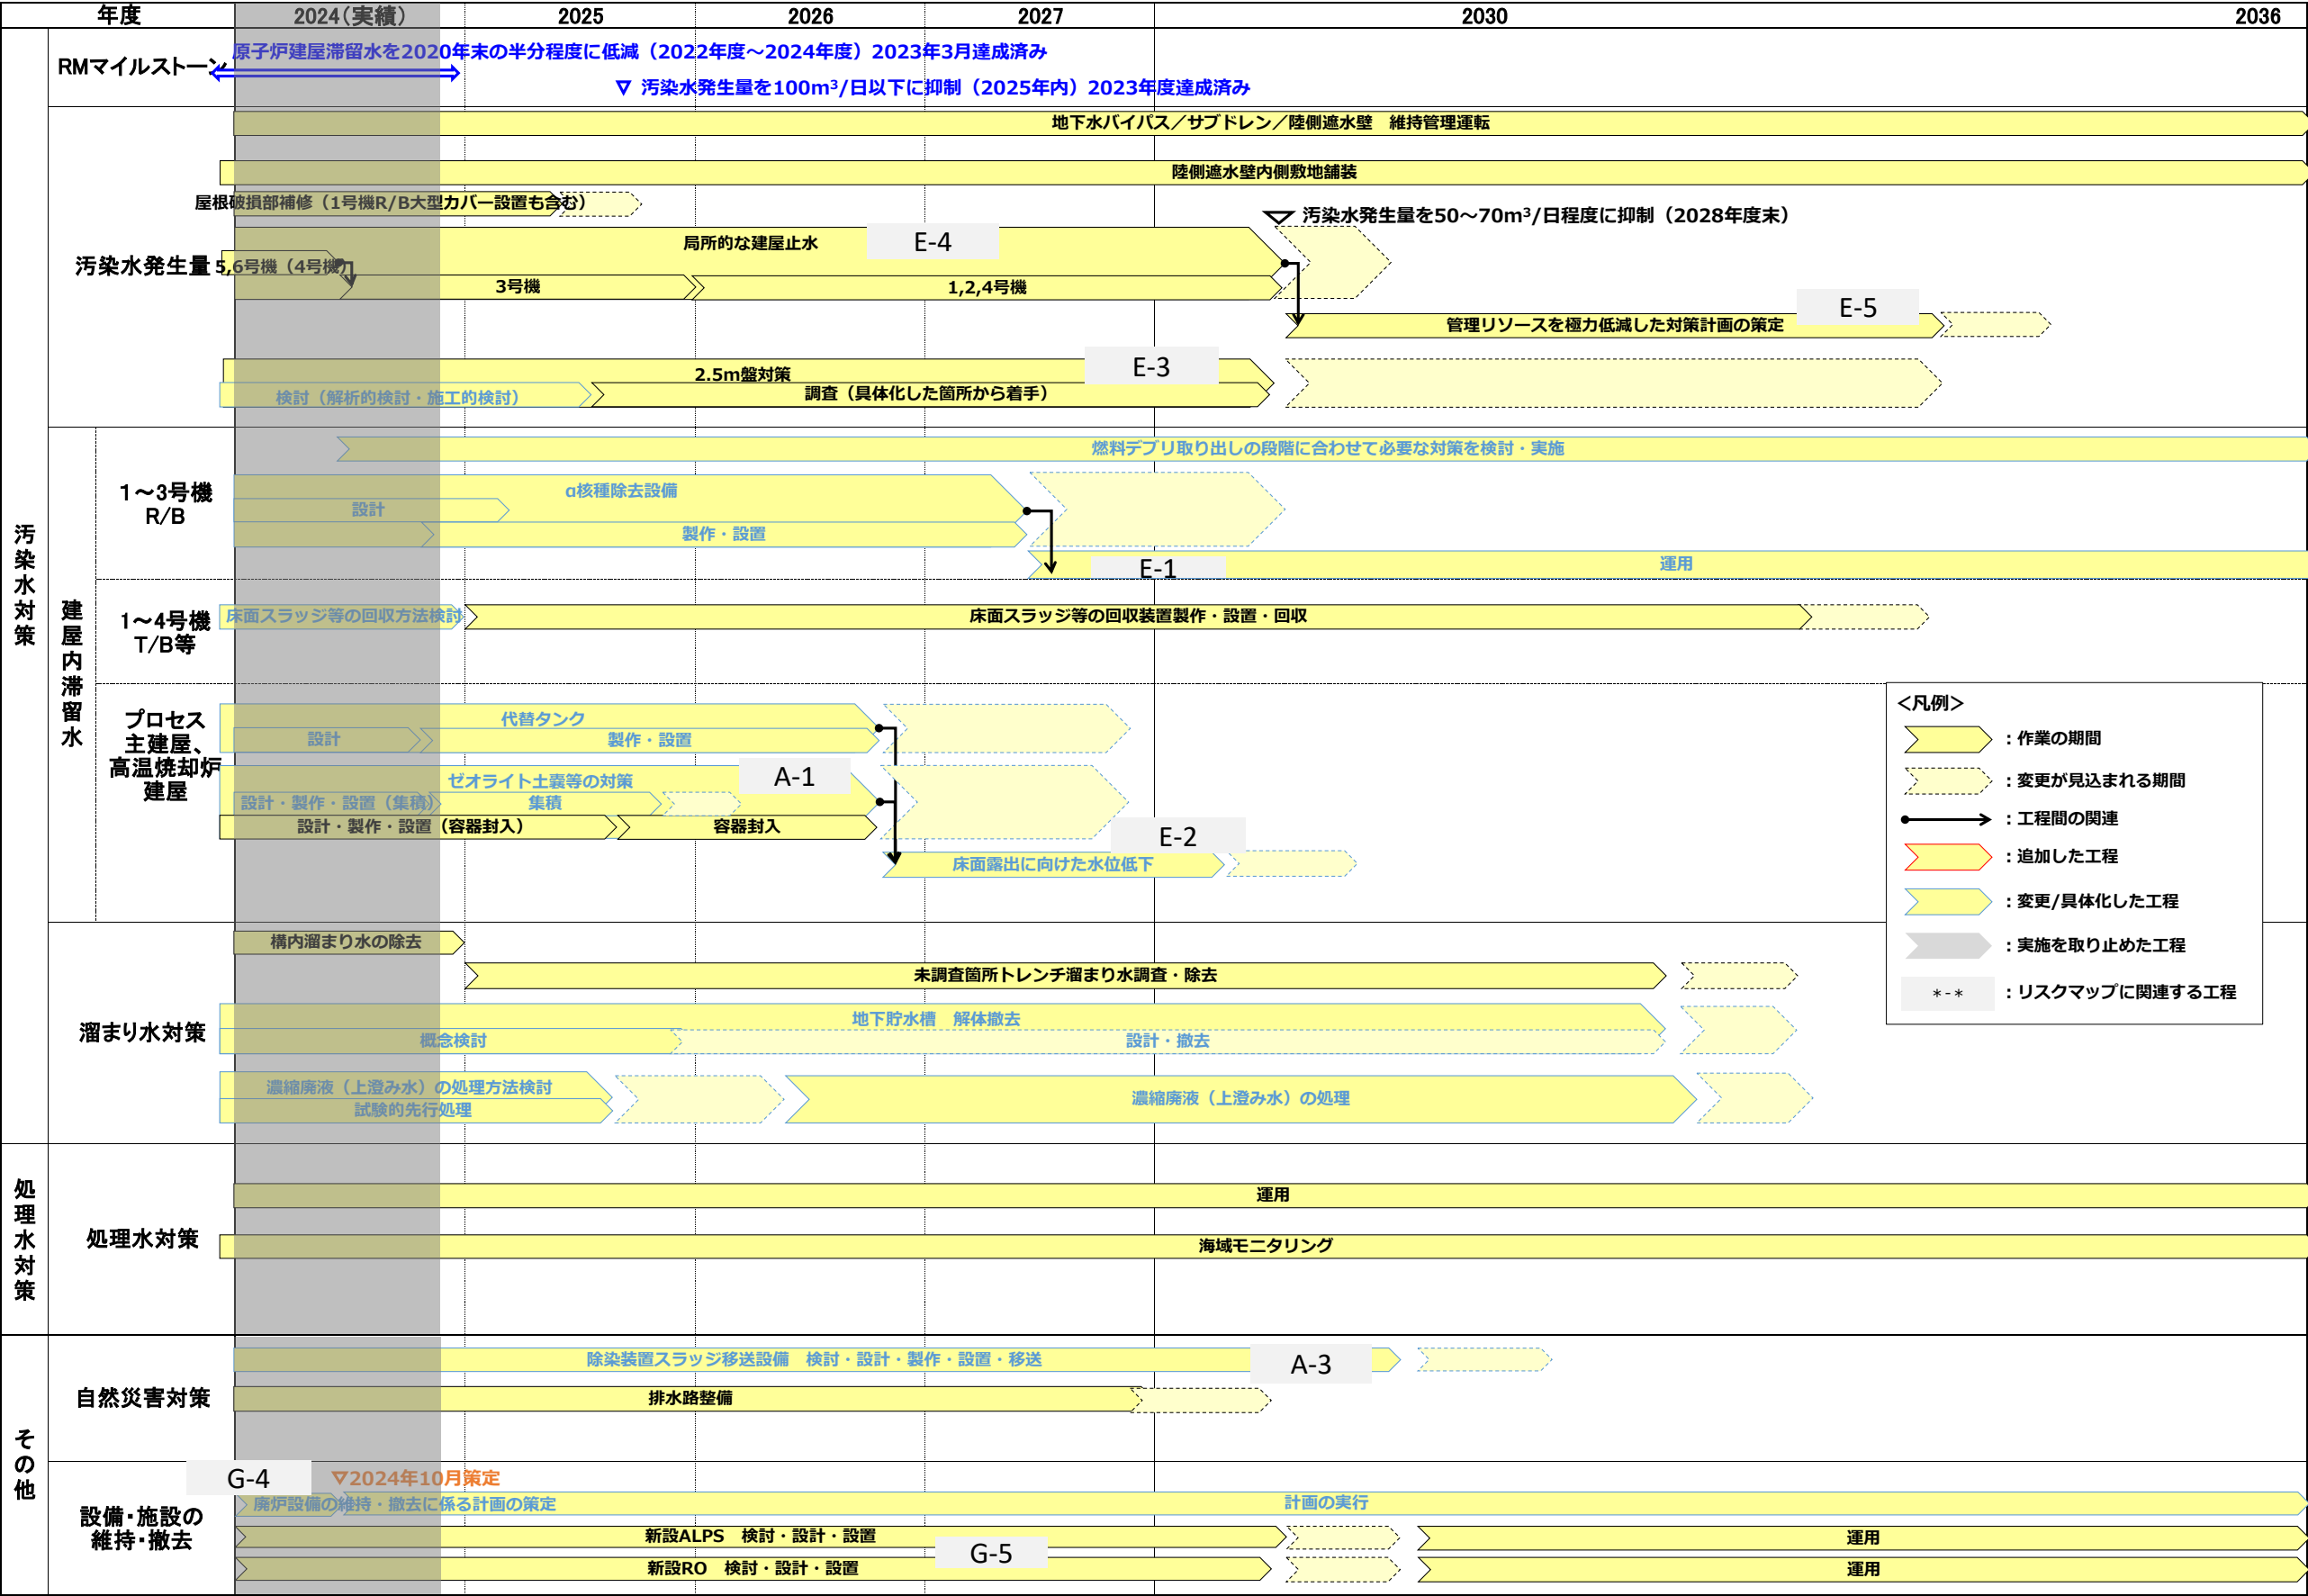

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
