

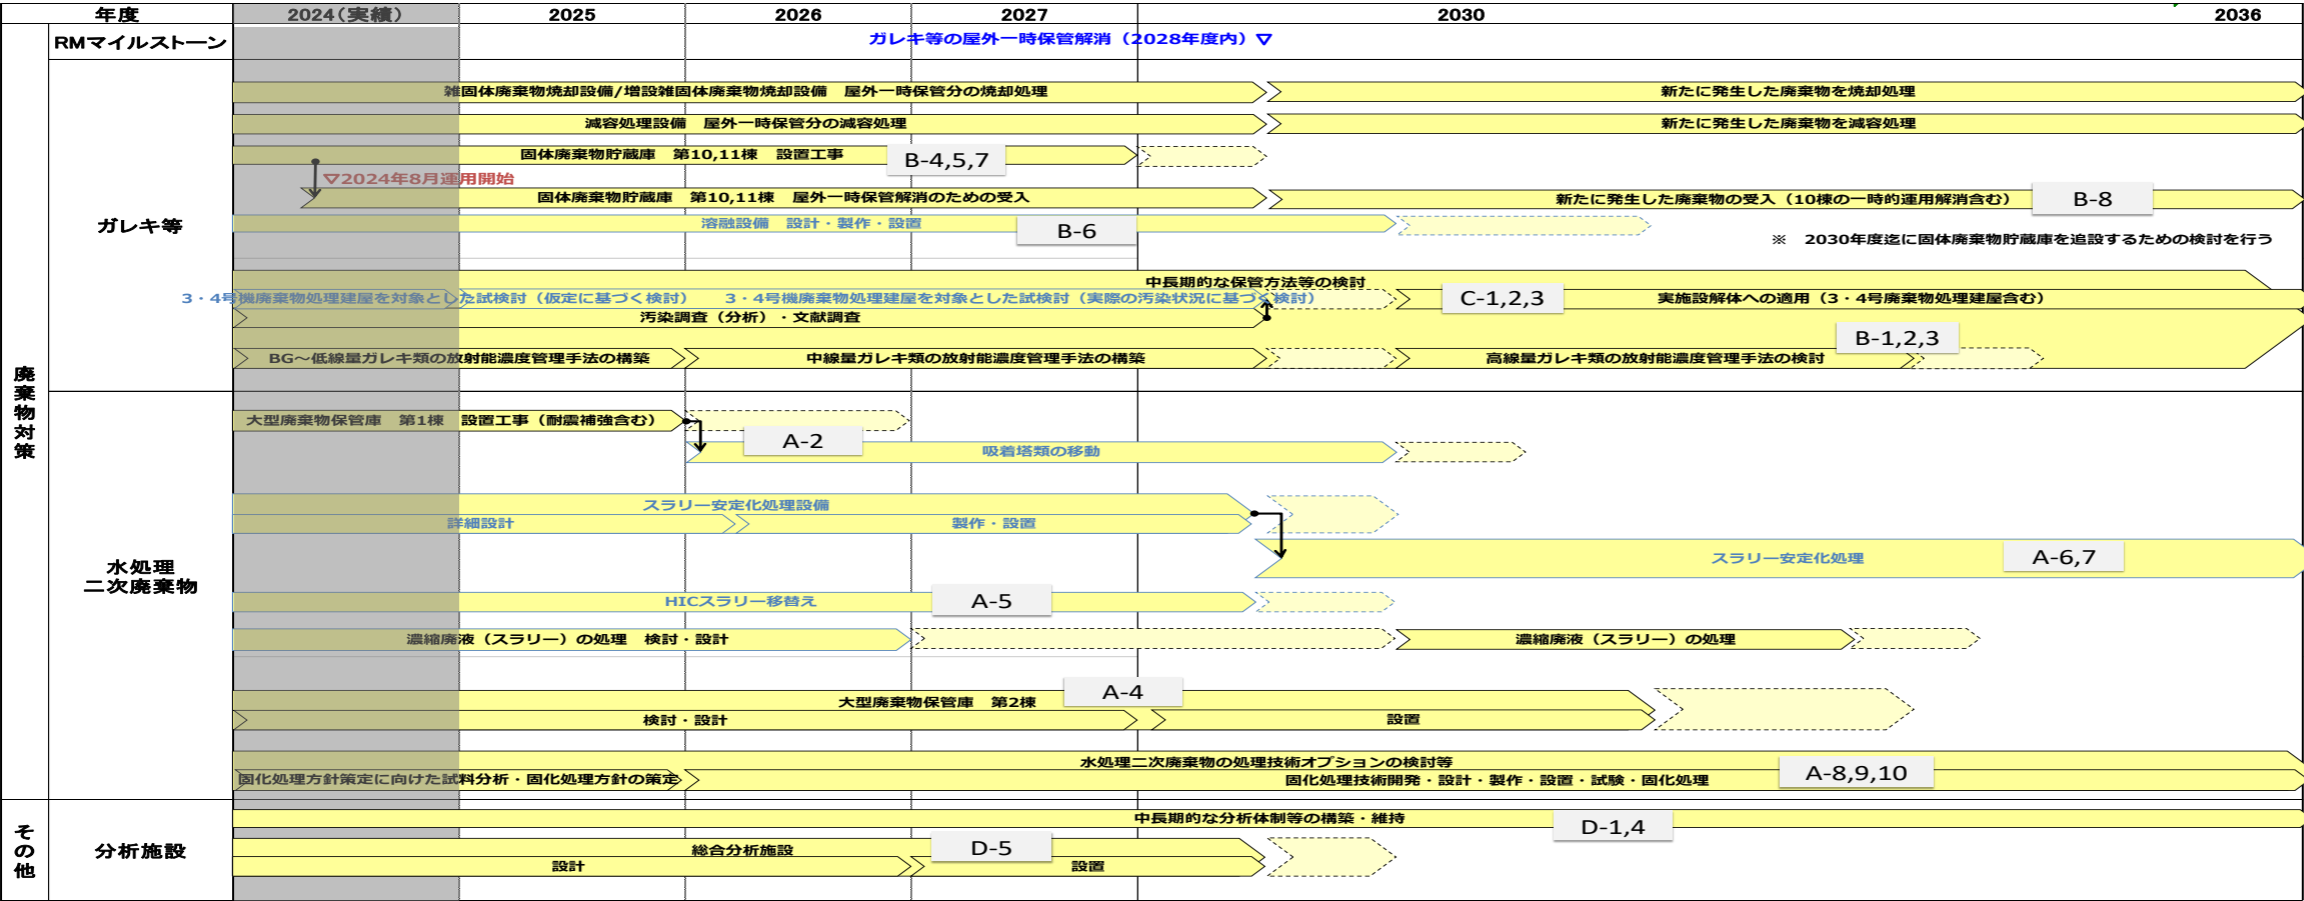
1 / 2

分野名	廃炉中長期実行プラン2025 目標工程	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	10月		11月					12月			1月			2月			3月			4月			5月以降			備 考			
					26	2	9	16	23	30	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
固体廃棄物の保管管理、 処理・処分計画	●放射能濃度の評価と管理	3. 固体廃棄物の性状把握	(実 績) ・計画に基づいたサンプリングの実施 ・汚染水分析・水処理二次廃棄物分析 ・瓦礫類分析 (予 定) ・計画に基づいたサンプリングの実施 ・汚染水分析・水処理二次廃棄物分析 ・瓦礫類分析	検討・設計																													
					計画に基づいたサンプリングの実施 (採取継続)																												
					汚染水分析・水処理二次廃棄物分析 (分析継続)																												
					瓦礫類分析 (2026年2月完了予定)																												
●分析施設		処理・処分計画	4. 分析・研究施設の設置	JAEA分析・研究施設第1棟 (実 績) ・放射性物質を用いた分析作業 (分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む) (予 定) ・放射性物質を用いた分析作業 (分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む)	現場作業																												
						放射性物質を用いた分析作業(分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む) (分析継続)																											
●分析施設		処理・処分計画	4. 分析・研究施設の設置	JAEA分析・研究施設第2棟 (実 績/予 定) ・設置工事	現場作業	設置工事 (設置工事継続)																											
●分析施設		処理・処分計画	4. 分析・研究施設の設置	総合分析施設 (実 績/予 定) ・設計検討 (基本設計)	検討・設計	設計検討 (基本設計)																											

・水処理二次廃棄物：ALPS吸着材等を分析中
・これまでの分析結果は以下のウェブページにまとめられている
リスト：https://clads.jaea.go.jp/jp/rd/tech-info.html
検索：https://frandli-db.jaea.go.jp/FRAnDLi/


・2020年5月20日 実施計画変更認可申請
・2024年12月11日 実施計画一部補正提出
・2024年12月18日 実施計画変更認可
・2025年3月25日 事前了解
・2025年8月8日 実施計画変更認可申請(仕様変更)


廃炉中長期実行プラン2025





注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る


<凡例>


：作業の期間


：変更が見込まれる期間

：工程間の関連

：追加した工程

：変更/具体化した工程

：実施を取り止めた工程

：リスクマップに関連する工程
