建屋止水対策工事中の電源ケーブル切断について

平成26年3月7日 東京電力株式会社



1. 概要

■発生概要

1~4号機高温焼却炉建屋他止水対策工事において、 地盤改良に伴うボーリング掘削中に、現地盤から約-1 m地点のエフレックス管内のケーブルを切断させ、4号 機使用済燃料プールの二次系冷却が停止した。

■時系列

平成26年2月25日(火)

9:40 M/C地絡警報発生

(所内共通M/C 1~4A、共用プール

M/C A、所内共通D/G M/C A)

9:42 4号機使用済燃料プール二次系冷却停止

(エアフィンクーラー(B)過負荷トリップ)

10:19 念のため4号機燃料取出作業を中断

10:27 初期消火活動実施

 \sim 10:30

11:52 公設消防により「火災ではない」と判断


14:16 4号機使用済燃料プール二次系冷却再開

14:36 4号機燃料取出作業再開

平成26年2月28日(金)

当該ケーブル修理・復旧完了

■発生場所

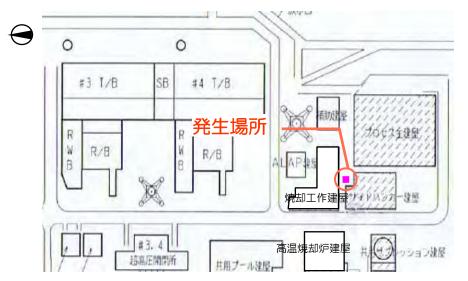

■現場状況






当該箇所(140φ)



2. ケーブル切断に至る状況

- ●本作業は、埋設物を損傷する恐れがあることから、安全事前検討会においては、震災前の 埋設物状況資料に加え、関連部署からの情報入手も行っていた。但し、当該部についての 情報は事前に十分に得ることができなかった。
- ●このため、当該部を掘削するに当たっては、慎重に試掘を実施することとし、震災前地盤 面の上の砕石盛土部分約60cmに加え、震災前地盤面下部分についても約20cm試掘 を実施し、埋設物がないことを確認した。
- ●本掘削に入り、地中埋設物が確認されたが、ケーブルや配管類ではなく(1本目)、掘削 位置を変え掘削を継続し(2本目)、埋設されていたケーブルを切断させた。

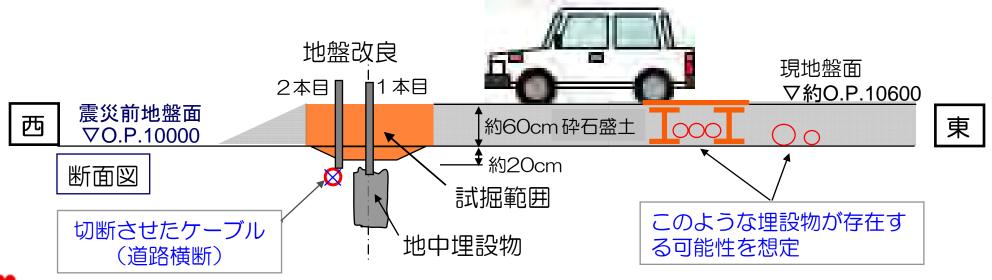

3. 原因究明

今回のケーブル切断に至った原因は大きく次の3点と考えられる。

1. 事前の情報収集及び共有不足

・安全事前評価は当社主管部と関係会社のみで行われており、埋設物に関係する部署の 情報が適切に得られることが難しかったと思われる。

2. 思いこみ

・当社主管部に、震災以降に設置されたケーブル・配管等は震災前地盤面下には埋め られていないとの思いこみがあった。

3. 異常情報共有の不足

・本掘削開始後に、想定していない埋設物があることが分かったが、配管やケーブルの 類でなかったため、一旦立ち止まり関係箇所との情報共有をせずに作業を継続した。



4. 対 策

●ソフト面の対策

- 1. 安全事前評価の実施体制の見直し
 - ・主管部のみによる安全事前評価ではなく、関係部門が幅広く多面的にチェックを行う 体制で実施する。
- 2. 基本ルールの見直しと再徹底
 - ・地中埋設物調査のための試掘方法を見直す。(震災前地盤下50cm以上)
 - ・地中埋設物を確認した場合、配管やケーブルかどうかに関わらず当社と情報共有する。
- 3. 安全教育の強化(当社主管部、協力会社)
 - ・汚染水漏洩や、電源ケーブル等の損傷による使用済燃料プール冷却設備の停止等により、社会の皆様にご心配・ご不安を与えないように、重要設備を守るという意識を徹底するための安全教育を実施する。

●ハード面の対策

- 1. 埋設物マップの高度化
 - ・ケーブル・配管等の布設状況を出来る限り調査し、情報の一元集約化と共有化の仕組 みを作る。
- 2. 埋設物の現場表示
 - ・現場においてケーブル・配管等の埋設表示を設置する。




東京電力

(参考) 試掘の方針

砕石盛土あり 従来 ▽砕石盛土による地盤面 ▽震災前地盤面 ∇O.P.10000 震災前の地盤面程度まで慎重に試掘する。 砕石盛土なし ∇O.P.10000 ▽震災前地盤面 50 cm以上 地盤面から50cm以上を慎重に試掘する。 砕石盛土あり 今後 ▽砕石盛土による地盤面 ▽震災前地盤面 ∇0.P.10000 震災前の地盤面程度まで慎重に試掘し、 さらに50cm以上を慎重に試掘する。 砕石盛土なし ▽震災前地盤面 ∇O.P.10000

50cm以上

地盤面から50cm以上を慎重に試掘する。

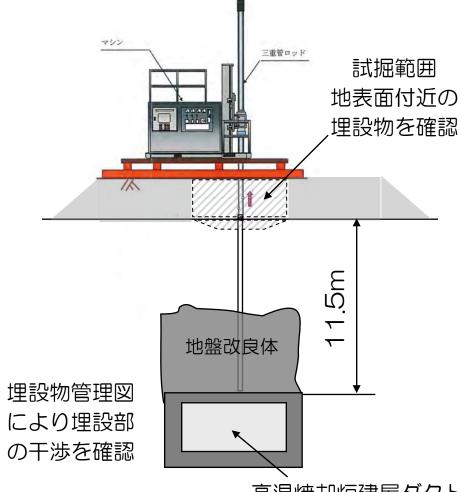

高温焼却炉建屋ダクト

地盤改良のイメージ
