

## 福島第一原子力発電所 完成型汚染水貯蔵タンク搬入・水切り風景（その2）

作業日：平成26年4月17日

作業実績：〔午前〕7時5分：入港

7時30分：着岸

9時00分：水切り開始

9時20分：1基目の物揚場への着座

12時5分：6基目の物揚場への着座（作業終了）



台船による海上輸送



台船による海上輸送

撮影日：平成26年4月17日

画像提供：東京電力株式会社



物揚場着岸



物揚場水切り



スーパーキャリアへの積載



物揚場着座



スーパーキャリアへの積載

撮影日：平成26年4月17日  
画像提供：東京電力株式会社




東京電力

# (参考) 完成型汚染水貯蔵タンクの海上輸送について

タンク増設の工程前倒し策を検討した結果、従来の現地溶接型タンクの他に、工場（構外）で製作した完成型タンクを福島第一原子力発電所構内まで台船にて海上輸送し、据付を行うこととした。

## 【完成型タンク】

- 工場製作
- ↓
- 工場検査
- ↓
- 海上輸送  
工場 1F
- ↓
- 水切り  
(岸壁への荷揚げ)
- ↓
- 1F構内輸送
- ↓
- 現地据付  
(現地検査含む)

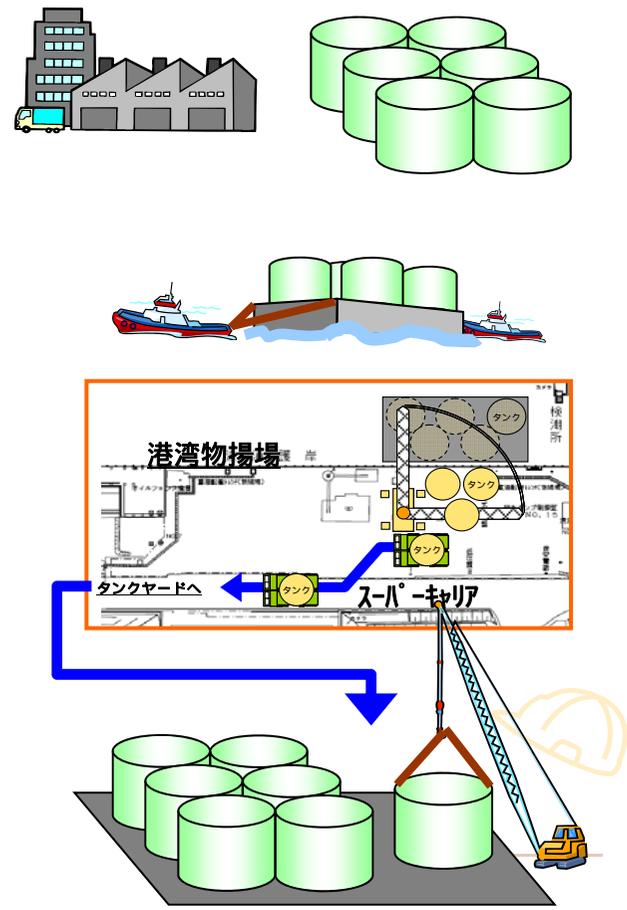

## 【現地溶接型タンク】

- 工場部品加工
- ↓
- 工場検査
- ↓
- 資材輸送
- ↓
- 現地溶接
- ↓
- 現地検査

