

訂 正 版

福島第一原子力発電所 陸側遮水壁 凍結管設置作業の進捗状況について

< 参考資料 >

2015年7月23日



東京電力株式会社

陸側遮水壁 4週間工程表 (平成27年7月12日～平成27年8月8日)

施工ブロック (削孔完了本数 / 全削孔本数) ()内数字は貫通本数再掲	7月														8月														
	先週							今週							来週							再来週							
	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	
凡例 準備工: 削孔工: 建込工: 配管工: フライン循環:																													
1 BLK (凍結: 75 / 75本) (測温: 16 / 16本) (建込: 75 / 75本)																													
2 BLK (凍結: 19 / 19本) (測温: 5 / 5本) (建込: 19 / 19本)																													
3 BLK (凍結: 199 / 199本) (測温: 43 / 43本) (建込: 199 / 199本)																													
4 BLK (凍結: 33(7) / 33(7)本) (測温: 7 / 7本) (建込: 33(7) / 33(7)本)																													
5 BLK (凍結: 218(23) / 218(23)本) (測温: 47(3) / 47(3)本) (建込: 218(23) / 218(23)本)																													
6 BLK (凍結: 193(19) / 193(19)本) (測温: 42 / 42本) (建込: 189(15) / 193(19)本)																													
7 BLK (凍結: 125(14) / 125(14)本) (測温: 28(0) / 29(1)本) (建込: 122(11) / 125(14)本)																													
8 BLK (凍結: 102 / 102本) (測温: 22 / 22本) (建込: 102 / 102本)																													
9 BLK (凍結: 72(7) / 72(7)本) (測温: 17(1) / 17(1)本) (建込: 72(7) / 72(7)本)																													
10 BLK (凍結: 65*(0) / 75(10)本) (測温: 19 / 20*本) (建込: 60(0) / 75(10)本)																													
11 BLK (凍結: 147(0) / 225(40)本) (測温: 35*(0) / 37*(2)本) (建込: 142(0) / 225(40)本)																													
12 BLK (凍結: 112(0) / 159(29)本) (測温: 28*(0) / 31*(2)本) (建込: 56(0) / 159(29)本)																													
13 BLK (凍結: 42(0) / 56(9)本) (測温: 15(0) / 16*(1)本) (建込: 42(0) / 56(9)本)																													

* 数値に誤りがありましたので、訂正しております。(2015年7月30日訂正)

陸側遮水壁 凍結管・測温管削孔ならびに凍結管建込実績

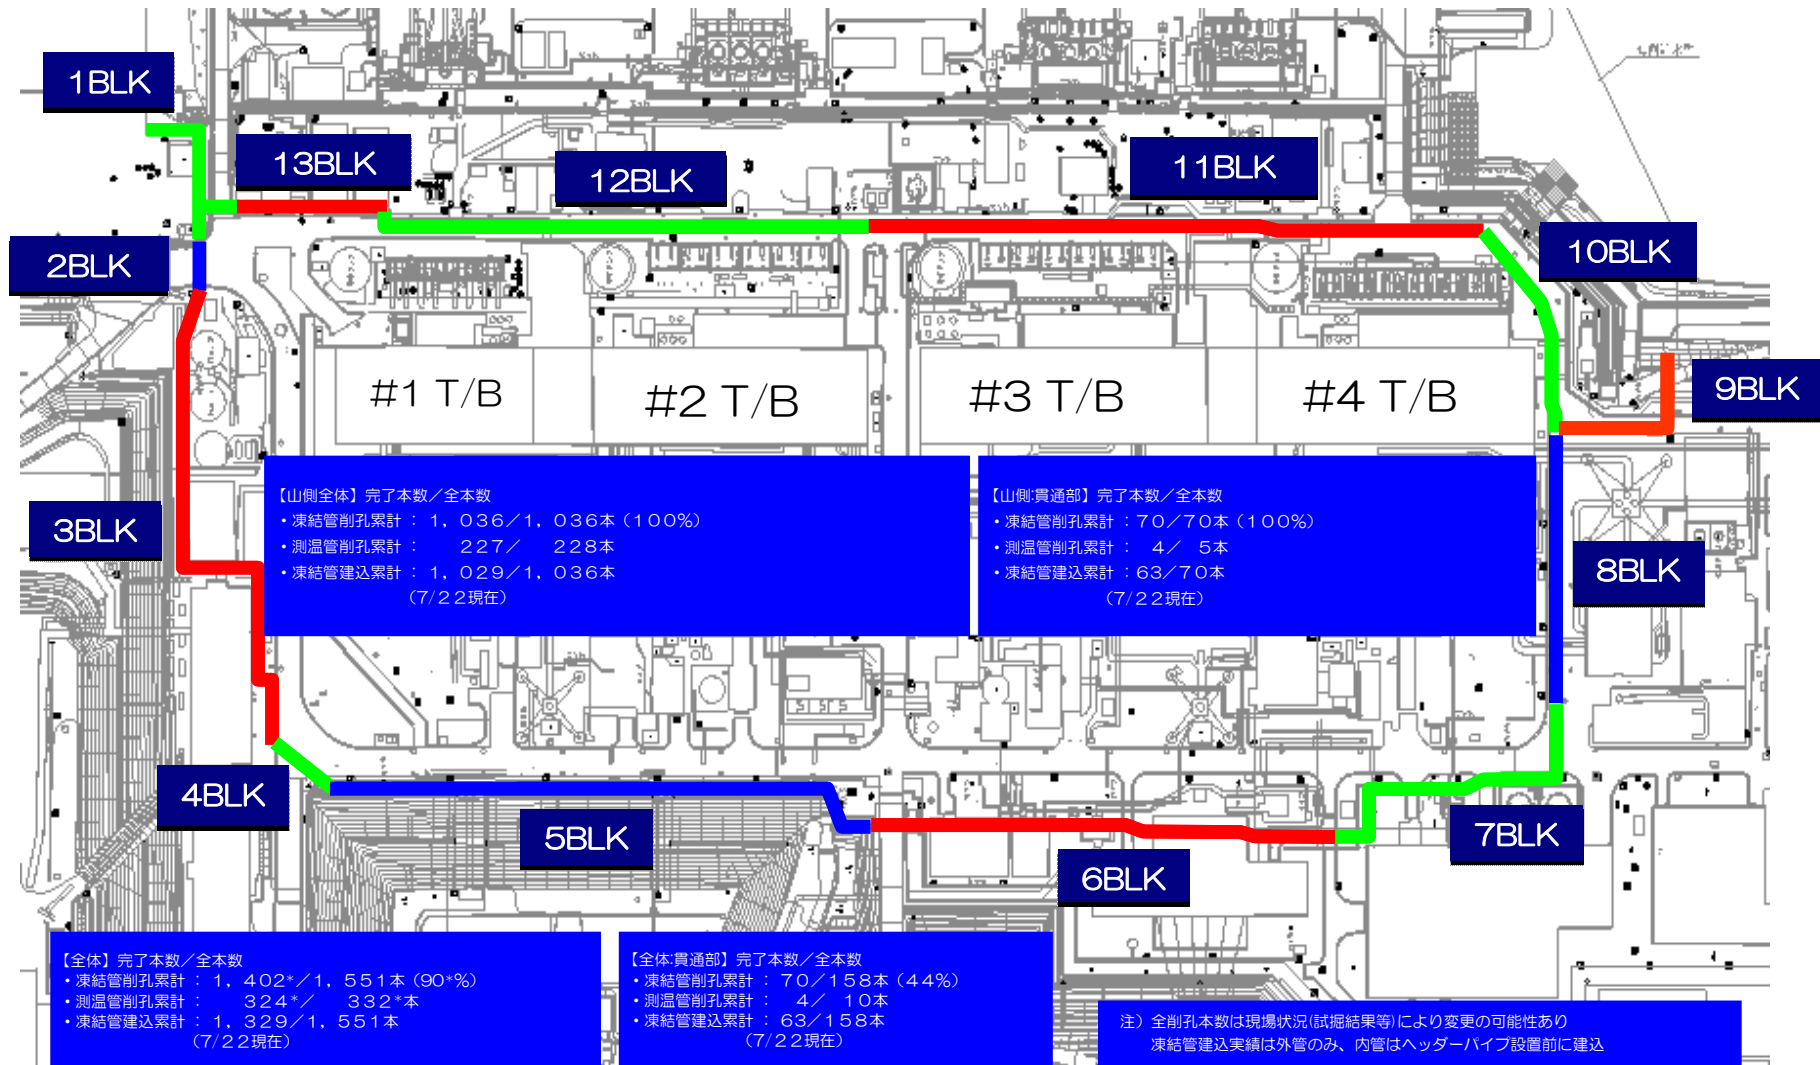

*数値に誤りがありましたので、訂正しております。(2015年7月30日訂正)
