


福島第二原子力発電所 3号機 原子炉開放作業の完了について

【参考資料】
平成27年2月27日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所


当所3号機では、2月13日より原子炉開放作業を開始し、順次、コンクリートハッチ、原子炉格納容器の蓋、原子炉圧力容器の蓋、蒸気乾燥器、気水分離器の取り外しを行い、2月26日、原子炉開放作業が完了しました。

原子炉内に装荷されている燃料の使用済燃料プールへの移動については、本日（2月27日）より開始しました。


●原子炉開放作業の流れ（作業実績）

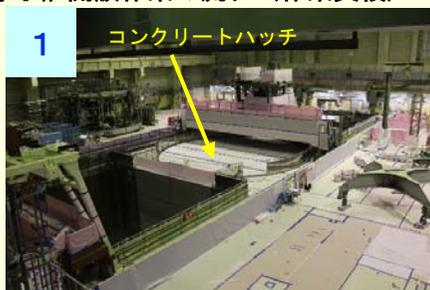

原子炉開放作業前の様子
(平成27年1月19日撮影)

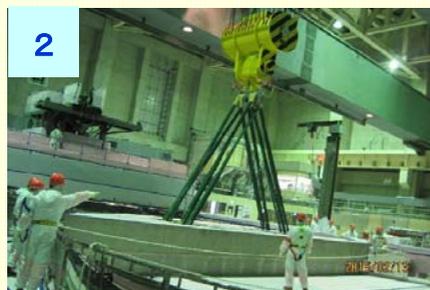

コンクリートハッチの取り外し
(平成27年2月13日撮影)

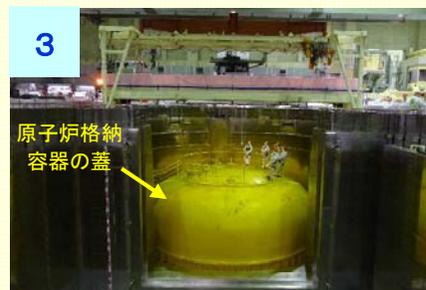

原子炉格納容器 蓋の取り外し前
(平成27年2月16日撮影)



原子炉格納容器 蓋の取り外し
(平成27年2月16日撮影)




原子炉圧力容器 蓋の取り外し
(平成27年2月23日撮影)



蒸気乾燥器の取り外し
(平成27年2月25日撮影)



気水分離器の取り外し
(平成27年2月26日撮影)


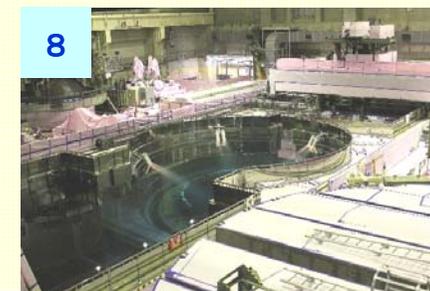


原子炉開放作業後の様子
(平成27年2月26日撮影)

●確認された主な不具合箇所

1. 原子炉ウェル*1のコンクリートハッチがのっていた箇所（1段目のひな段）に17箇所の接触痕を確認。また、コンクリートハッチの水平を調整するために、コンクリートハッチ底部に設置された金属プレート（5箇所）が外れていることを確認（図：A）
2. 原子炉圧力容器ベローズ*2保護カバーの固定ボルト（24本中1本）の折損を確認（図：B）

○ 確認された不具合は、設備の健全性に影響を与えるものではありません。

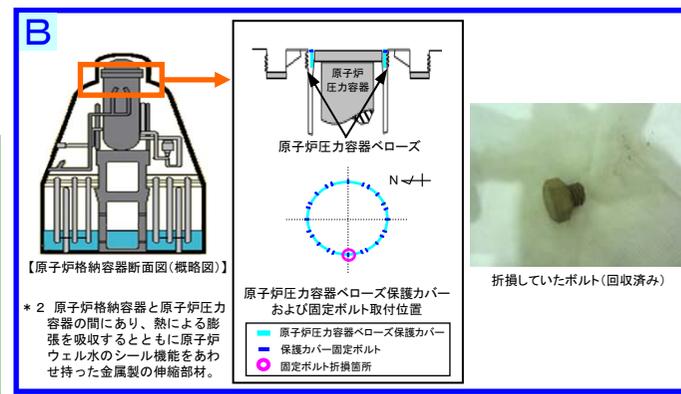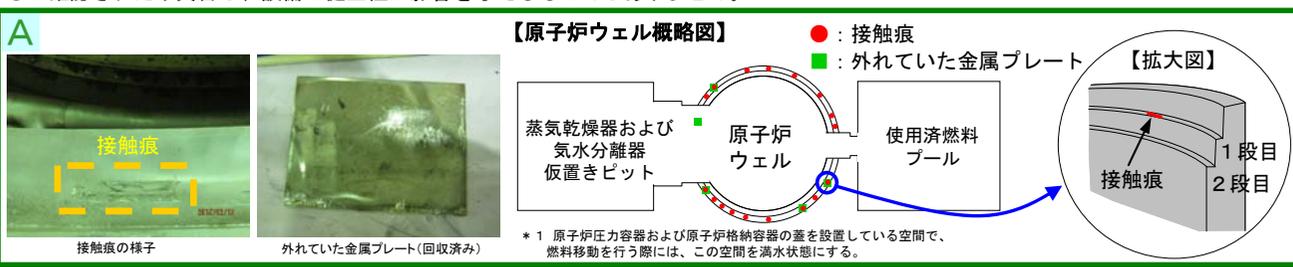

<参考>原子炉開放の流れ

