

< 参考資料 >


海側遮水壁閉合作業について

2015年9月9日
東京電力株式会社



東京電力

海側遮水壁閉合箇所の状況

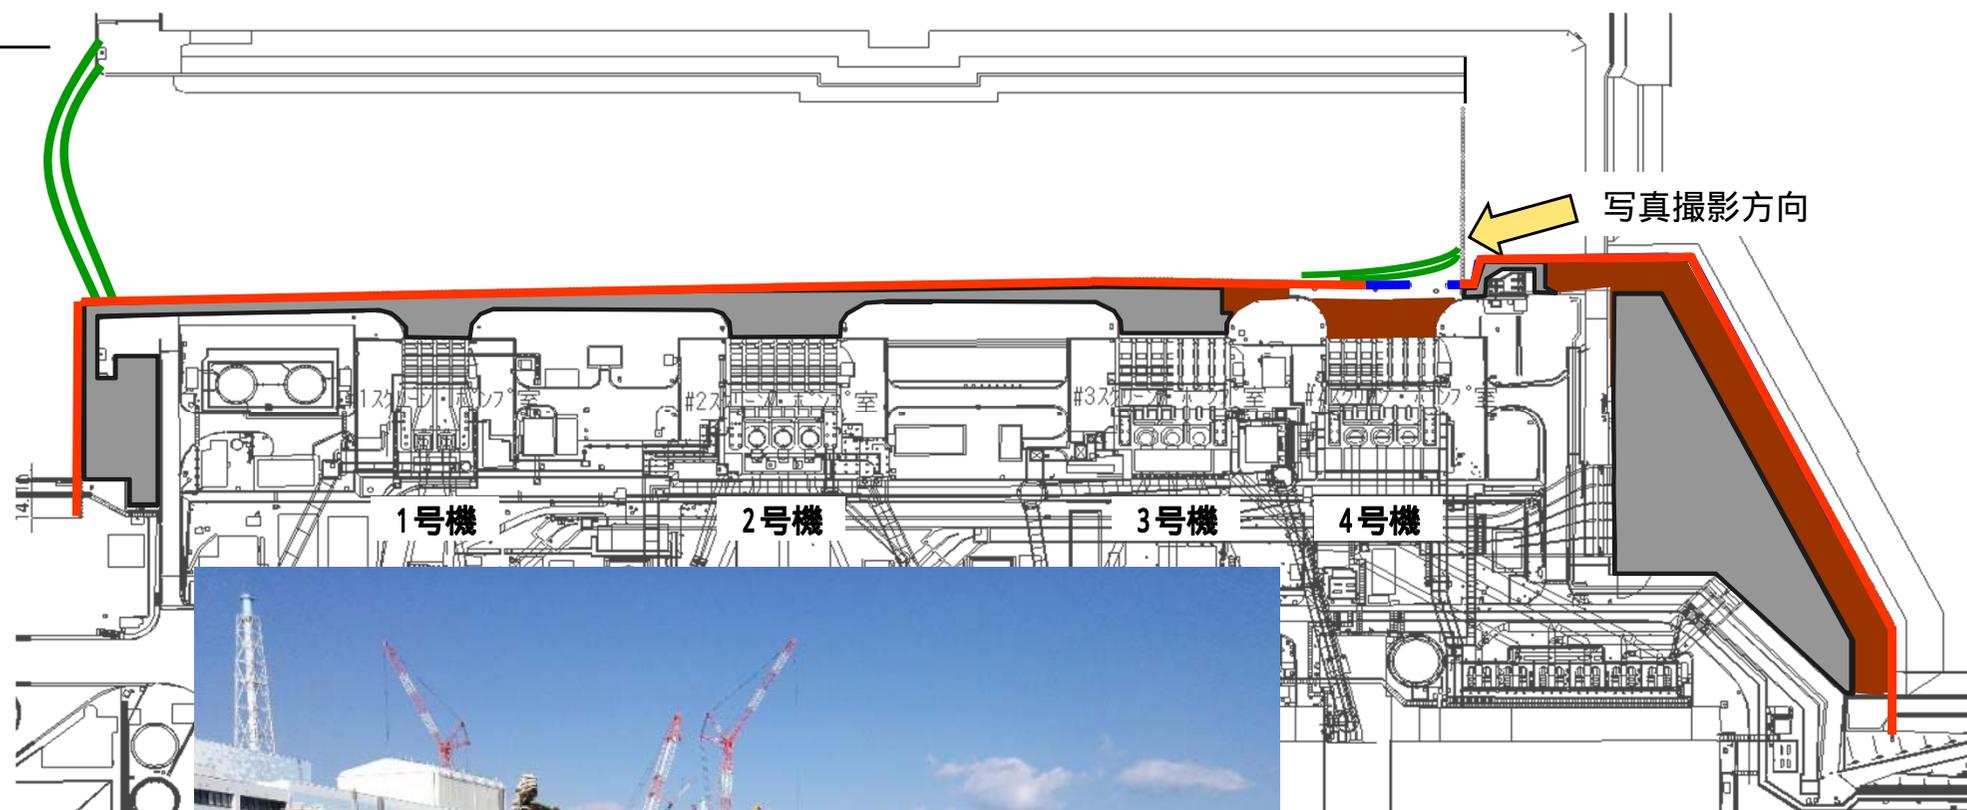


- :シルトフェンス
 - :鋼管矢板打設完了
 - :継手処理完了
 - :割栗石埋立完了
 - :舗装完了
- (9月9日時点)

海側遮水壁閉合箇所 : 鋼管矢板9本分(延長約10m)




海側遮水壁閉合作業の概略手順

- 9月3日から稼働開始しているサブドレンについては、本日まで、問題なく稼働できることを確認しました。
- 9月10日から鋼管矢板の打設作業を再開します。打設は、二段階に分けて実施する計画です。
- 鋼管矢板の打設完了後、止水性向上のための継手処理を実施します。

工程は天候等により変動する可能性があります。

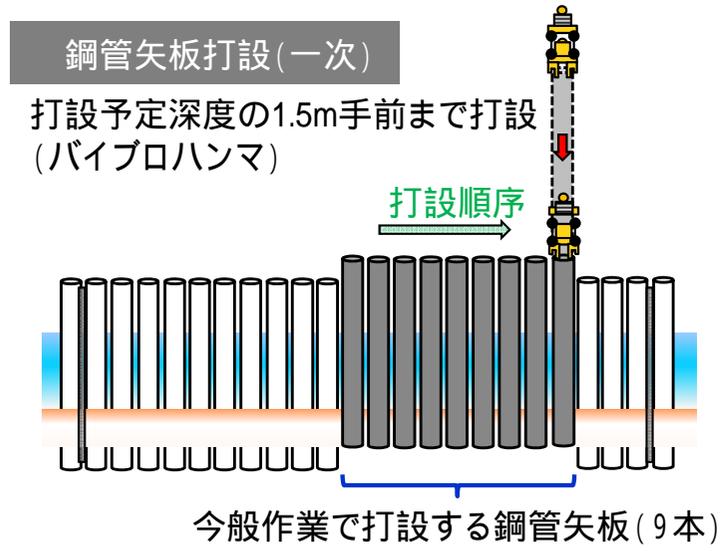


鋼管矢板一次打設状況

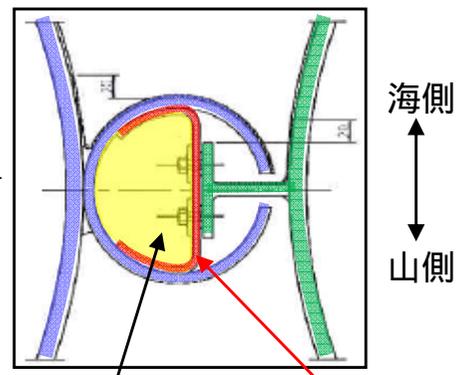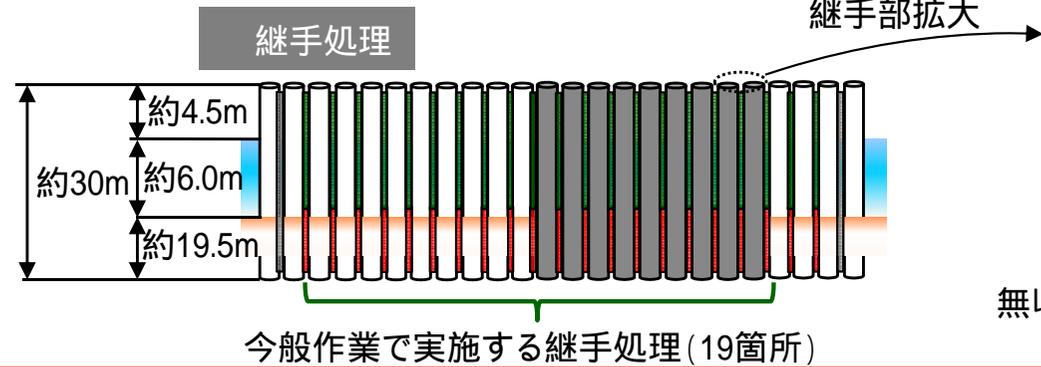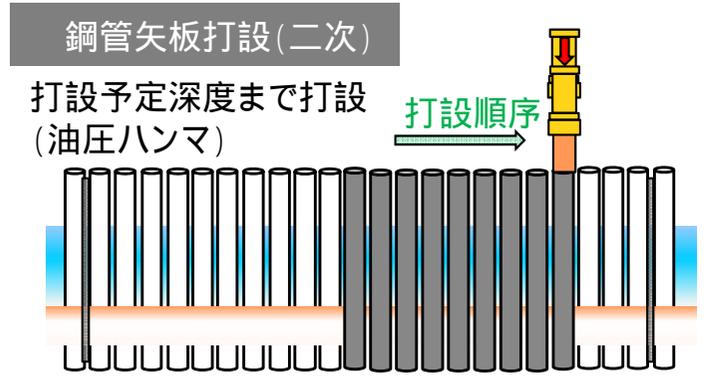

無収縮モルタル注入 遮水ゴム

海側遮水壁閉合作業の概略工程

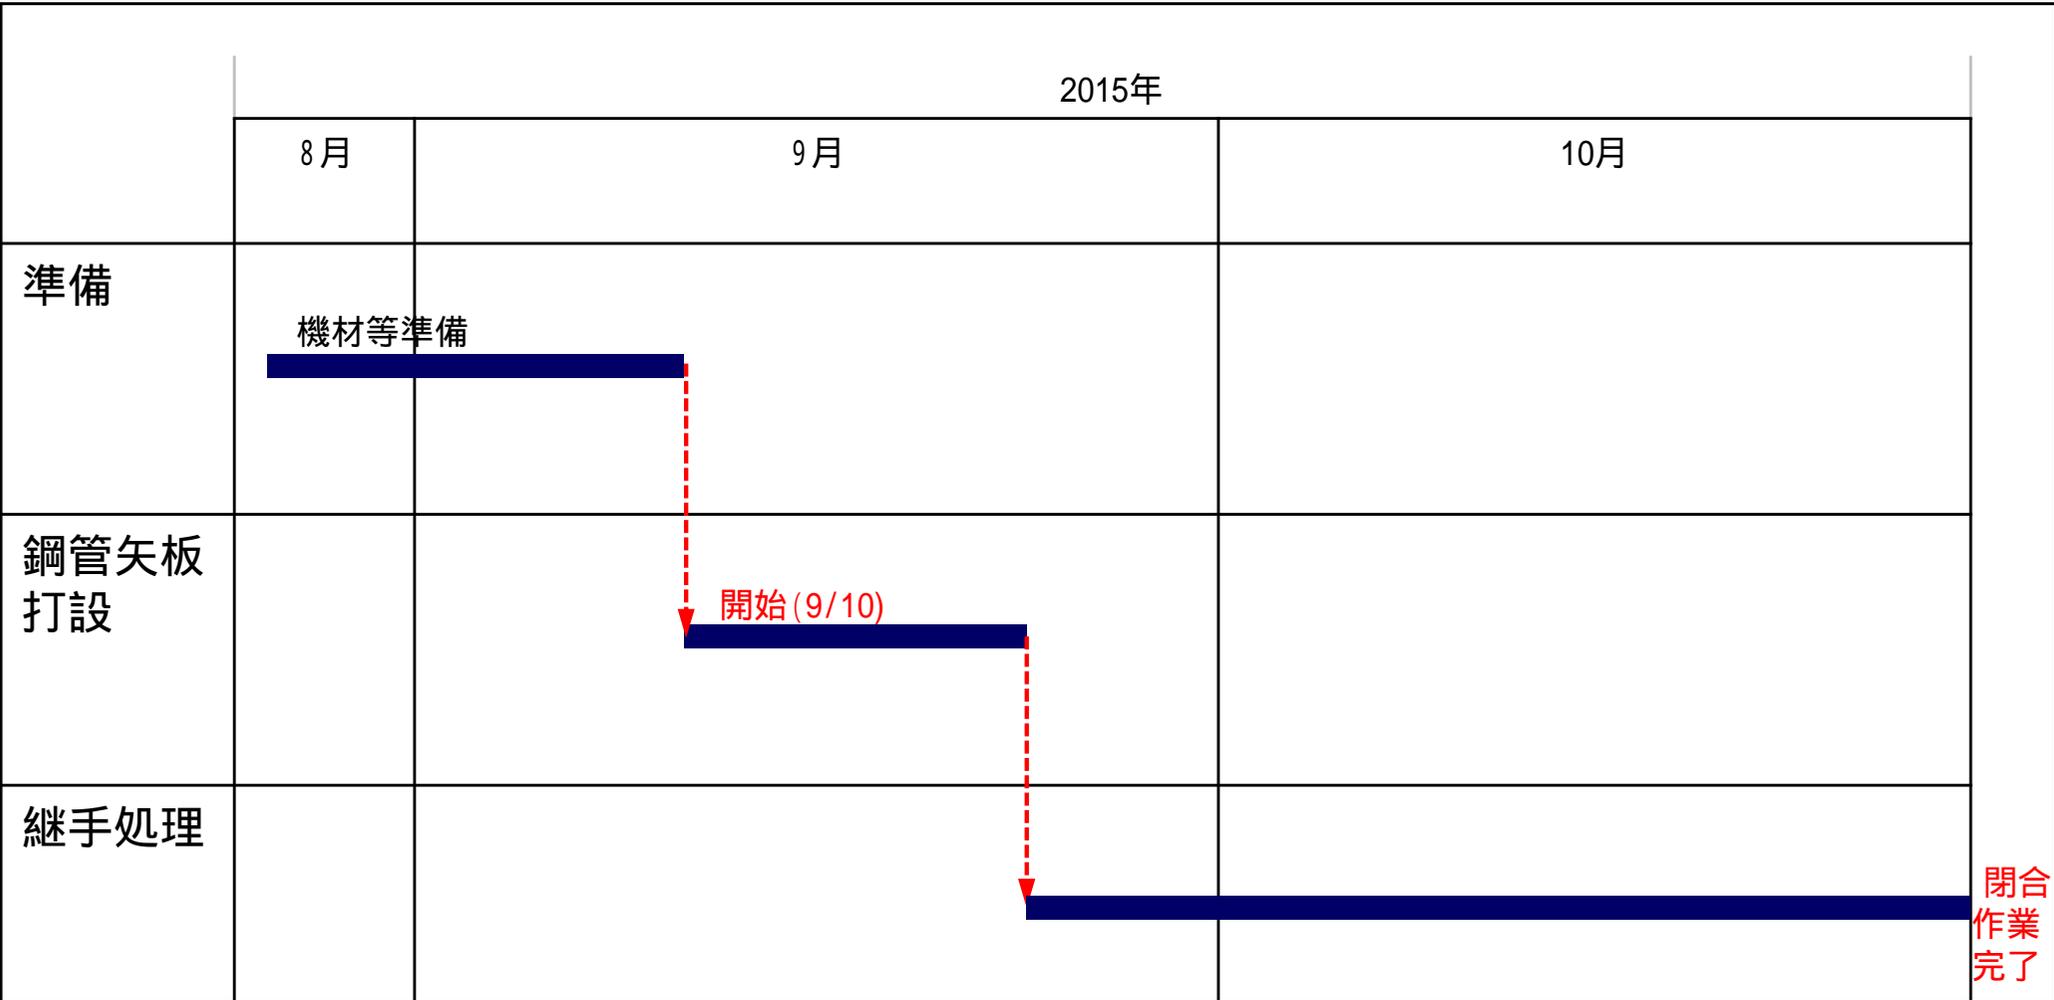

9月14日よりサブドレン他水処理施設の運用に伴う排水を開始する予定です。

工程は天候等により変動する可能性があります
