


労働環境改善スケジュール

作業区分	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		2月		3月				4月				5月	6月	備考	
			21	28	6	13	20	27	3	10	17	下	上	中	下	前		後
防護装備	1	防護装備の適正化検討 (実績) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※ ・管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化の運用開始(2016年3月8日～) (予定) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※(運用範囲の拡大等) ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による安全性と作業性の向上を図る。	21	28	6	13	20	27	3	10	17	下	上	中	下	前	後	
	現場作業	ダストフィルタ化 全面マスク着用不要化 一般作業服化 新規追加 ▼運用開始(3月8日) 管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化																
防災安全	2	重傷災害撲滅、全災害発生数の推移 (実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全推進協議会の開催(毎週):災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) (予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全推進協議会の開催(毎週):災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等)																
	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価																
健康管理	3	長期健康管理の実施 (実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2015年度対象者(社員)の「甲状腺超音波検査」(福島・柏崎刈羽・本社)実施 ・2016年度対象者(社員)への「がん検査」案内(3/18) (予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2016年度対象者(協力企業作業員)への検査案内に向けた準備																
	現場作業	健康相談受付 【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用清算手続き、2016年度検査案内(社員)及び検査案内準備(協力企業作業員) 社員・甲状腺超音波検査(柏崎刈羽) 社員・甲状腺超音波検査(本社)																
	4	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化 (実績) ・1F救急医療室の2016年6月までの医師確保完了(固定医師1名+0-7ヶ月支援医師) ・1F救急医療室の4月～6月の勤務医師調整																
	検討・設計	1F救急医療室の4月～6月の勤務医師調整																
現場作業	各医療拠点の体制検討 1F救急医療室6月までの医師確保完了 新規追加																	

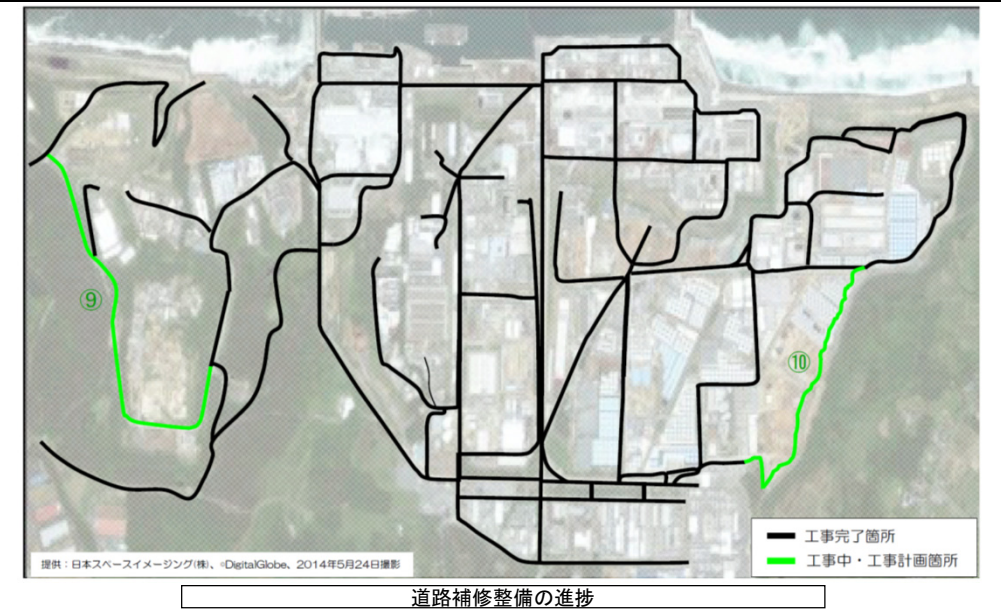

分野	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		2月		3月				4月				5月	6月	備考												
			21	28	6	13	20	27	3	10	17	下	上	中	下	部		後											
労働環境改善 要員管理、労働環境改善	5	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼				▼作業員の確保状況集約				▽作業員の確保状況調査依頼				▽作業員の確保状況集約													
		(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) ・作業員の確保状況(2月実績/4月の予定)と地元雇用率(2月実績)についての調査・集計		作業員の確保状況(2月実績/4月予定)と地元雇用率(2月実績)の実態把握				作業員の確保状況(3月実績/5月予定)と地元雇用率(3月実績)の実態把握				作業員の確保状況(4月実績/6月予定)と地元雇用率(4月実績)の実態把握																	
		(予定) ・作業員の確保状況(3月実績/5月の予定)と地元雇用率(3月実績)についての調査・集計																											
	6	労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																									
		(実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応		▼協力企業との意見交換会(2/26)											▼協力企業との意見交換会(4/1)		協力企業との意見交換会(5/27)												
		(予定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握(継続的に実施) ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック(継続的に実施) ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応	現場作業	■											■		■												
	7	大型休憩所の食堂の改修	現場作業	搬入口設置本工事																									
		(実績) ・搬入口設置本工事																											
	8	大型休憩所へのシャワー設備の設置	現場作業	シャワー設備設置本工事											▽運用開始(4月中旬予定)														
		(実績) ・シャワー設備設置本工事																											
	(予定) ・シャワー設備設置本工事 ・シャワー設備運用開始(4月中旬)																												
9	新事務本館の建設	現場作業	基礎工事				鉄骨工事				床PC工事				外壁PC工事				内装工事				設備工事				外構工事		2016年8月完了目標
	(実績) ・基礎工事 ・鉄骨工事 ・床PC工事 ・外壁PC工事 ・内装工事 ・設備工事																												
	(予定) ・床PC工事 ・外壁PC工事 ・内装工事 ・設備工事																												
10	道路整備の実施	検討・設計												新規追加 ⑩Jエリア周辺道路工事の検討・設計				→											
	(実績) ・⑨土捨場周辺道路工事(路盤工・舗装)																												
	(予定) ・⑨土捨場周辺道路工事(路盤工・舗装)	現場作業	⑨土捨場周辺道路工事(路盤工・舗装)																										

福島第一原子力発電所 大型休憩所内
シャワー室の運用開始について

2016年3月31日

東京電力株式会社



東京電力

概要

- 作業員の皆さまの労働環境改善に向け大型休憩所にシャワー室の設置を進めておりました。3月31日工事が完了し、4月中旬より運用を開始する予定です。

シャワー室概要

- 設置場所 大型休憩所3階
- 設置台数 30台
- 利用時間 9:00~16:00
- 利用者 発電所に入構できる方
- 運用開始日 4月中旬（予定）



<参考>シャワー室設置場所

<設置場所：大型休憩所3階>

