

労働環境改善スケジュール

分野	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	1月		2月				3月				4月		5月		備考
				22	29	5	12	19	26	5	12	19	下	上	中	下	前	
防護装備	1	防護装備の適正化検討 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による安全性と作業性の向上を図る。	(実績) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※ ・管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化の運用開始(2016年3月8日～) (予定) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※(運用範囲の拡大等)	管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討(1~4号機周辺のG zone拡大に向けた検討)														
				管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化														
防災安全	2	重傷災害撲滅、全災害発生数の推移	(実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全推進協議会の開催(毎週):災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) (予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全推進協議会の開催(毎週):災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等)	情報共有、安全施策の検討・評価														
				健康相談受付														
健康管理	3	長期健康管理の実施	(実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・インフルエンザ予防接種の実施(10/26~1/31 1F構内臨時会場、近隣医療機関) (予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き	【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き														
				インフルエンザ予防接種の実施														
健康管理	4	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室の2017年3月までの医師確保完了(固定医師1名+0-テック支援医師) ・1F救急医療室の4月~6月の勤務医師調整 (予定) ・1F救急医療室の4月~6月の勤務医師調整	各医療視点の体制検討														
				1F救急医療室の4月~6月の勤務医師調整														
				1F救急医療室3月までの医師確保完了														



分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		1月		2月			3月			4月	5月	備考				
			22	29	5	12	19	26	5	12	19	下	上	中		下	前	後	
労働環境改善 要員管理、労働環境改善	5	<p>作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握</p> <p>(実績) ・作業員の確保状況(1月実績/3月予定)と地元雇用率(1月実績)についての調査・集計</p> <p>(予定) ・作業員の確保状況(1月実績/3月予定)と地元雇用率(1月実績)についての調査・集計 ・作業員の確保状況(2月実績/4月予定)と地元雇用率(2月実績)についての調査・集計 ・作業員の確保状況(3月実績/5月予定)と地元雇用率(3月実績)についての調査・集計</p>	検討・設計		▼作業員の確保状況調査依頼 [黒帯]		▼作業員の確保状況集約 [黒帯]		▼作業員の確保状況調査依頼 [黒帯]				▽作業員の確保状況集約 [黒帯]						
	6	<p>労働環境・生活環境・就業環境に関する企業との取り組み</p> <p>(実績) ・労働環境・生活環境・就業環境に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握 ・雇用契約を確認する仕組みの検討と実施準備</p> <p>(予定) ・労働環境・生活環境・就業環境に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 ・雇用契約を確認する仕組みの検討と実施準備</p>	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施 [黒帯]															
			現場作業		雇用契約を確認する仕組みの検討と実施準備 [黒帯]											協力企業との意見交換会 ▽(3/6) [青帯]			
7	<p>新事務棟の協力企業棟化</p> <p>(実績) ・企業棟化改修工事</p>	検討・設計																	
			現場作業	企業棟化改修工事 [青帯]															2017年2月20日 協力企業移転開始

協力企業棟の運用開始について

2017年2月23日

東京電力ホールディングス株式会社

運用開始状況

- 新事務棟の協力企業棟化については、当初からの計画通り、2月20日より各企業が順次移転し、利用を開始している。
これにより、協力企業と東京電力が密着した場所で執務し、発電所全体が一体となって廃炉作業に取り組める環境となる。


運用開始概要

- 利用予定企業数 37社
- 執務予定人員数 約1,000名
- 運用開始日 2月20日
- 開設時間帯 24時間利用可能予定
- 食堂設備 既設の再開に向け調整中
- 契約駐車台数 200台



<参考>レイアウト

1階

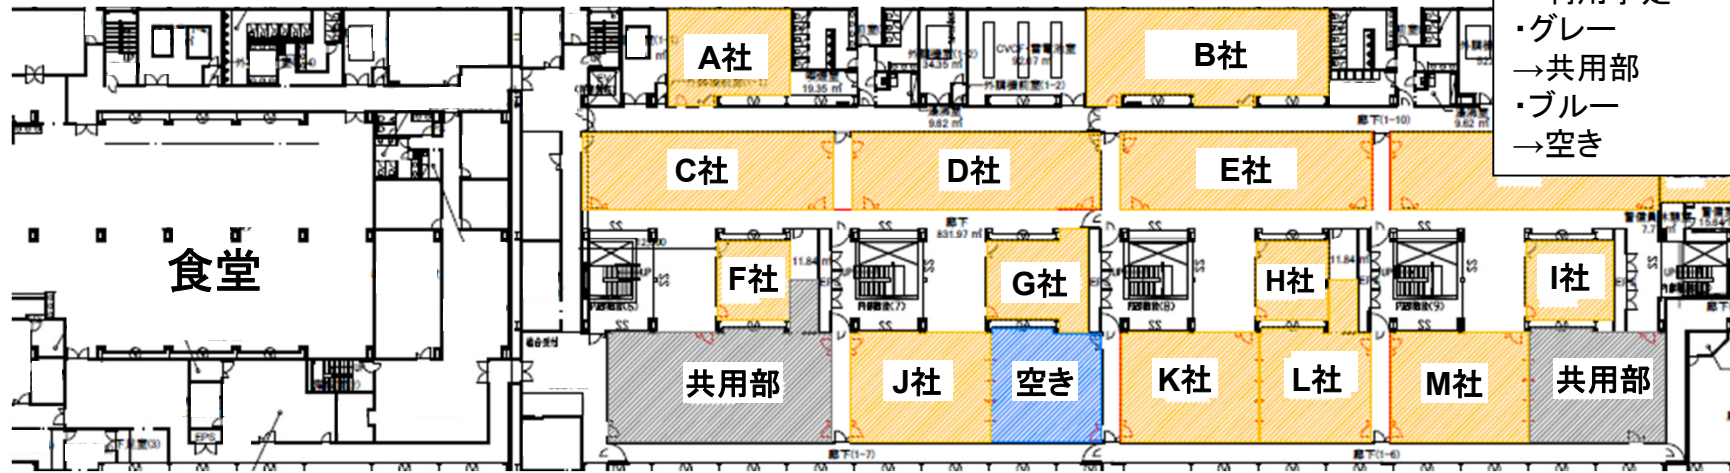

2階

