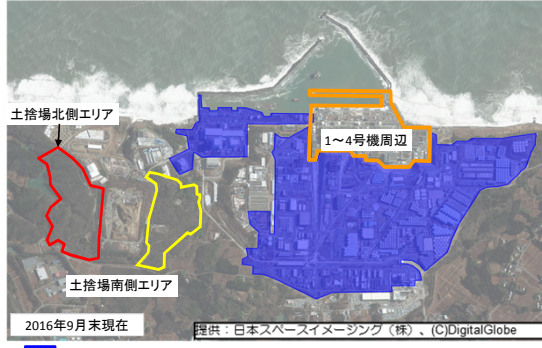


環境線量低減対策 スケジュール

| 分野 | 括り | 作業内容 | これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定 | | 4月 | | 5月 | | | 6月 | | | | 7月 | | 8月 | 備考 | | | |
|--------|---------------------------------|--|---------------------|---|----|----|---------------|----|---|----|----|---|---|----|---|----|----|--|---|--|
| | | | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 下 | 上 | 中 | 下 | 終 | | | | |
| 放射線量低減 | 敷地内線量低減 ・段階的な線量低減 | <p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 線量率測定 <ul style="list-style-type: none"> 構内全域の状況把握サーベイ (30mメッシュの全測定箇所を年度内にデータ更新) 構内全域の走行サーベイ[1回/3ヶ月] 線量低減対策 <ul style="list-style-type: none"> 土捨場南側エリア (伐採・造成工・路盤舗装 等) 土捨場北側エリア (伐採・盛土工 等) 建屋エリア (3号機海側等) (建物除去・路盤舗装 等) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 線量率測定 <ul style="list-style-type: none"> 構内全域の状況把握サーベイ (30mメッシュの全測定箇所を年度内にデータ更新) 構内全域の走行サーベイ[1回/3ヶ月] 線量低減対策 <ul style="list-style-type: none"> 土捨場南側エリア (伐採・造成工・路盤舗装 等) 土捨場北側エリア (伐採・盛土工 等) 建屋エリア (3号機海側等) (建物除去・路盤舗装 等)  <p>2016年9月末現在 提供：日本スペースイメージング(株)、(C)DigitalGlobe</p> <p>■ エリア平均で5μSv/hを達成したエリア</p> | 検討・設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 現場作業 | <p>■線量率測定 構内全域の状況把握サーベイ(30mメッシュサーベイ) ▼下期報告</p> <p>■線量低減対策 ①1~4号機周辺 ※ 建屋エリア(3号機海側等) (建物除去・路盤舗装 等)</p> <p>②その他エリア 土捨場南側エリア (伐採・造成工・路盤舗装 等)</p> <p>土捨場北側エリア (伐採・盛土工 等)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | 4号機海側：2017年10月完了 3号機海側：～2018年7月完了予定 その他海側エリア：工程検討中 ※1～4号機周辺の線量低減は、原子炉建屋上部の線量低減対策及び周辺ヤードの整備等を実施中。 (使用済燃料プール対策分野 参照) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ～2019年3月予定 ※造成レベル変更に伴う付帯設備の位置・構造が変更となる。 |
| 放射線量低減 | 海洋汚染拡大防止 ・モニタリング ・排水路整備 | <p>(実績)</p> <p>【護岸エリア地下水対策】 港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング</p> <p>【排水路対策】 排水路モニタリング K排水路上流部調査(浄化材の効果の確認) 排水路清掃等(道路・排水路清掃)</p> <p>【港湾復旧改造工事】 北防波堤改造工事 南防波堤改造工事 ブロック製造工(2F構内)</p> <p>(予定)</p> <p>【護岸エリア地下水対策】 港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング</p> <p>【排水路対策】 排水路モニタリング K排水路上流部調査(浄化材の効果の確認) K排水路上流部調査(枝管サンプリング(雨期)) 排水路清掃等(道路・排水路清掃)</p> <p>【港湾復旧改造工事】 北防波堤改造工事 南防波堤改造工事 ブロック製造工(2F構内)</p> | 検討・設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 現場作業 | <p>■護岸エリア地下水対策 港湾内外海水モニタリング</p> <p>地下水モニタリング</p> <p>■排水路対策 排水路モニタリング</p> <p>K排水路上流部調査(浄化材の効果の確認)</p> <p>排水路清掃等</p> <p>■港湾復旧改造工事 潜水調査・測量(ドローン調査等)</p> <p>海上工事開始</p> <p>北防波堤改造工事(ケーソン岸) ブロック設置</p> <p>北防波堤改造工事(防波堤) ブロック設置</p> <p>南防波堤改造工事(ケーソン岸/防波堤) ブロック設置</p> <p>南防波堤改造工事 上部工撤去工</p> <p>南防波堤改造工事(防波堤) 海水モニター電線管防護工事</p> <p>南防波堤改造工事(防波堤) BC、K排水路横断補強工事</p> <p>マブロック製造開始</p> <p>ブロック製造工(2F構内)</p> | | | | | | | | | | | | | | | 2017年9月16日1号機タービン建屋下屋の雨樋に浄化材を試験設置。浄化材の効果を確認中。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ～2019年6月予定 ～2020年7月予定 ～2020年7月予定 | |
| 評価 | 環境影響評価 ・モニタリング ・傾向把握、効果評価 | <p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1~4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 降下物測定(月1回) 発電所周辺、沿岸海域モニタリング(毎日～月1回) 20km圏内 魚介類モニタリング(月1回 11点) 茨城県沖における海水採取(毎月) 宮城県沖における海水採取(毎月) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1~4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 降下物測定(月1回) 発電所周辺、沿岸海域モニタリング(毎日～月1回) 20km圏内 魚介類モニタリング(月1回 11点) 茨城県沖における海水採取(毎月) 宮城県沖における海水採取(毎月) | 検討・設計 | | | | 1,2,3,4u放出量評価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 現場作業 | <p>降下物測定</p> <p>海水・海底土測定(発電所周辺 茨城県沖、宮城県沖)</p> <p>20km圏内 魚介類モニタリング</p> | | | | | | | | | | | | | | | 1,2,3,4u放出量評価 | |

タービン建屋東側における 地下水及び海水中の放射性物質濃度の状況について

2018年5月31日

TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

モニタリング計画（観測点の配置）

● 港湾口北東側

● 港湾口東側


● 港湾口南東側

● 北防波堤北側

● 南防波堤南側

● 海洋への影響のモニタリング
● 港湾内の放射能濃度分布のモニタリング

● 港湾内への影響のモニタリング
■ 地下水濃度のモニタリング

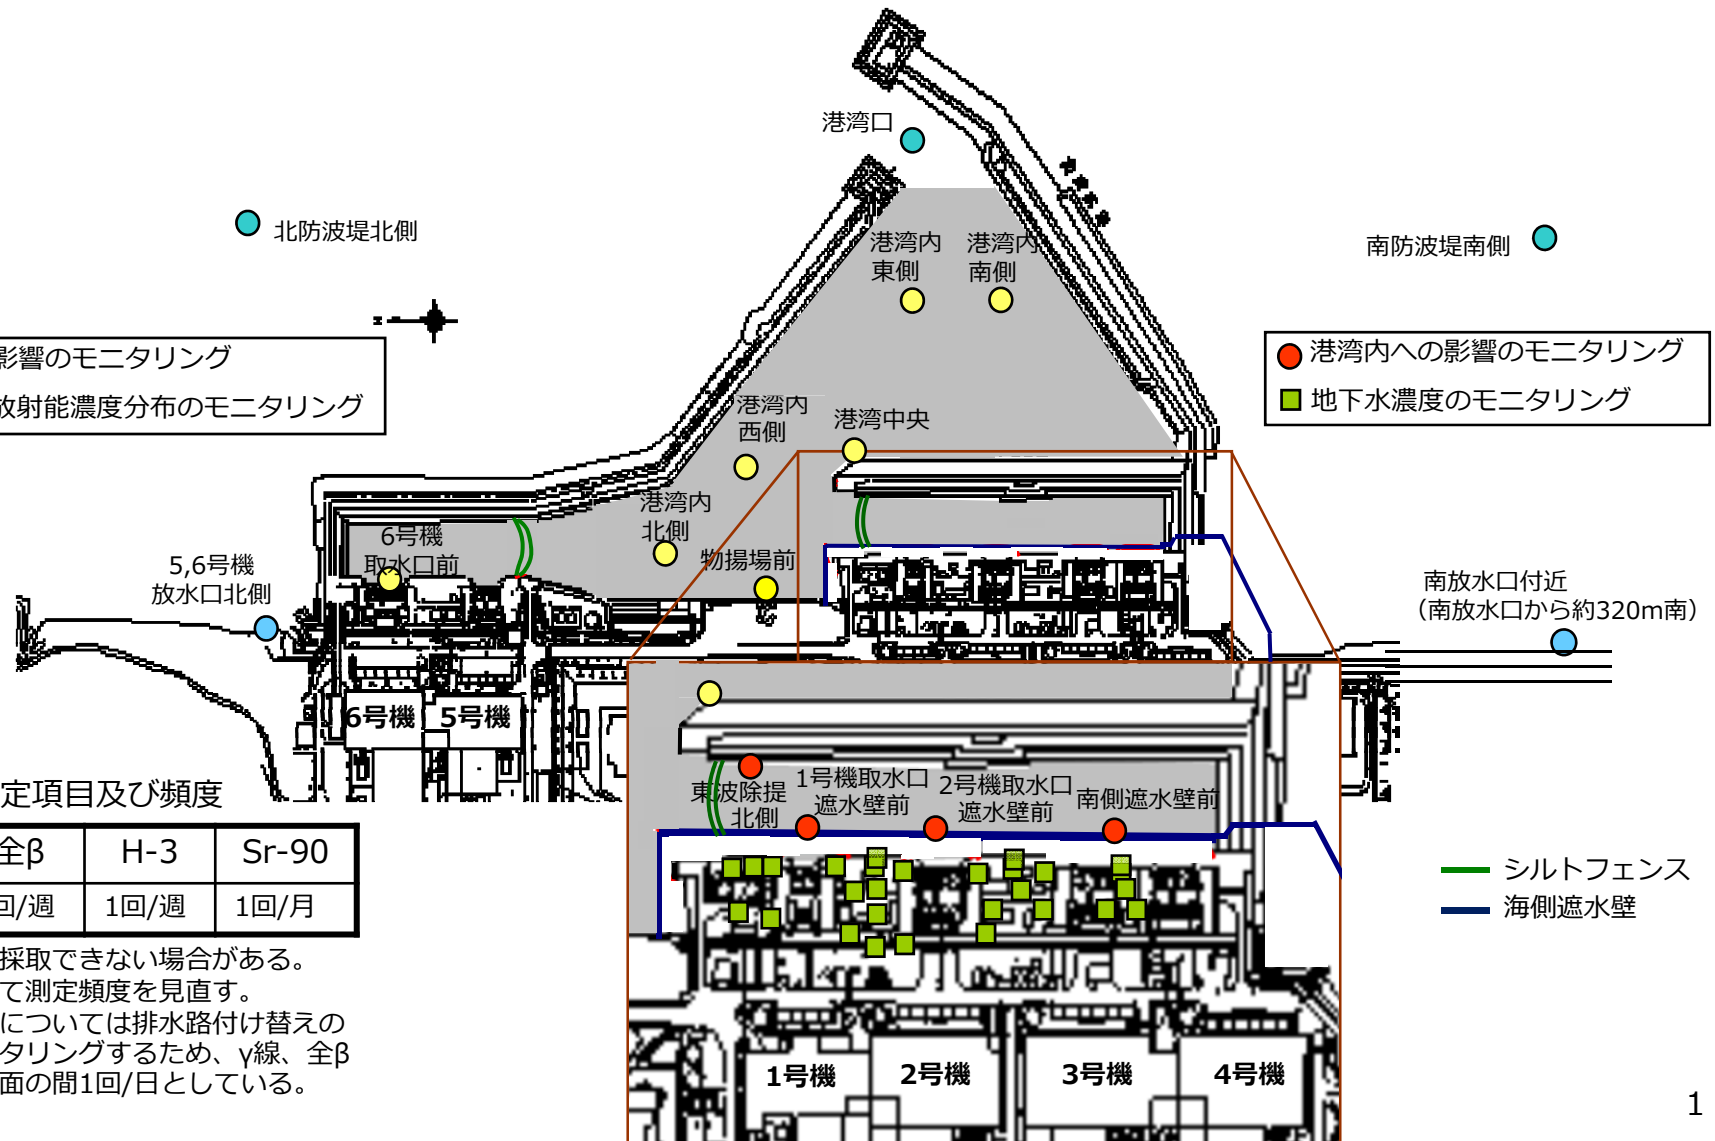

基本的な測定項目及び頻度

| γ線 | 全β | H-3 | Sr-90 |
|------|------|------|-------|
| 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/月 |

- ・天候により採取できない場合がある。
- ・必要に応じて測定頻度を見直す。
- ・港湾内海水については排水路付け替えの影響をモニタリングするため、γ線、全βについて当面の間1回/日としている。

<タービン建屋東側の地下水濃度>

- 観測点によっては大雨時に一時的な変動が見られるが、全体的に低下もしくは横ばい傾向にあり、大きな変化は見られていない。

<排水路における排水濃度>


- 降雨時に濃度が上昇する傾向にあるが、全体的に低下傾向にある。
 - ・ 道路及び排水路の清掃を実施中、排水路及び枝管に浄化材を設置中

<港湾内外の海水濃度>

- 港湾内では大雨時に上昇が見られるが、港湾外では変化は見られず告示濃度未満で推移している。
 - ・ 港湾内（取水路開渠内含む）の濃度について、上昇時においても告示濃度を十分に下回っている。
 - ・ 道路・排水路の清掃、フェーシング、海側遮水壁閉合、取水路開渠出口へのシルトフェンス設置等の対策の効果によるものと考えられる。

タービン建屋東側の地下水濃度 (1/2)


<1号機北側、1,2号機取水口間>

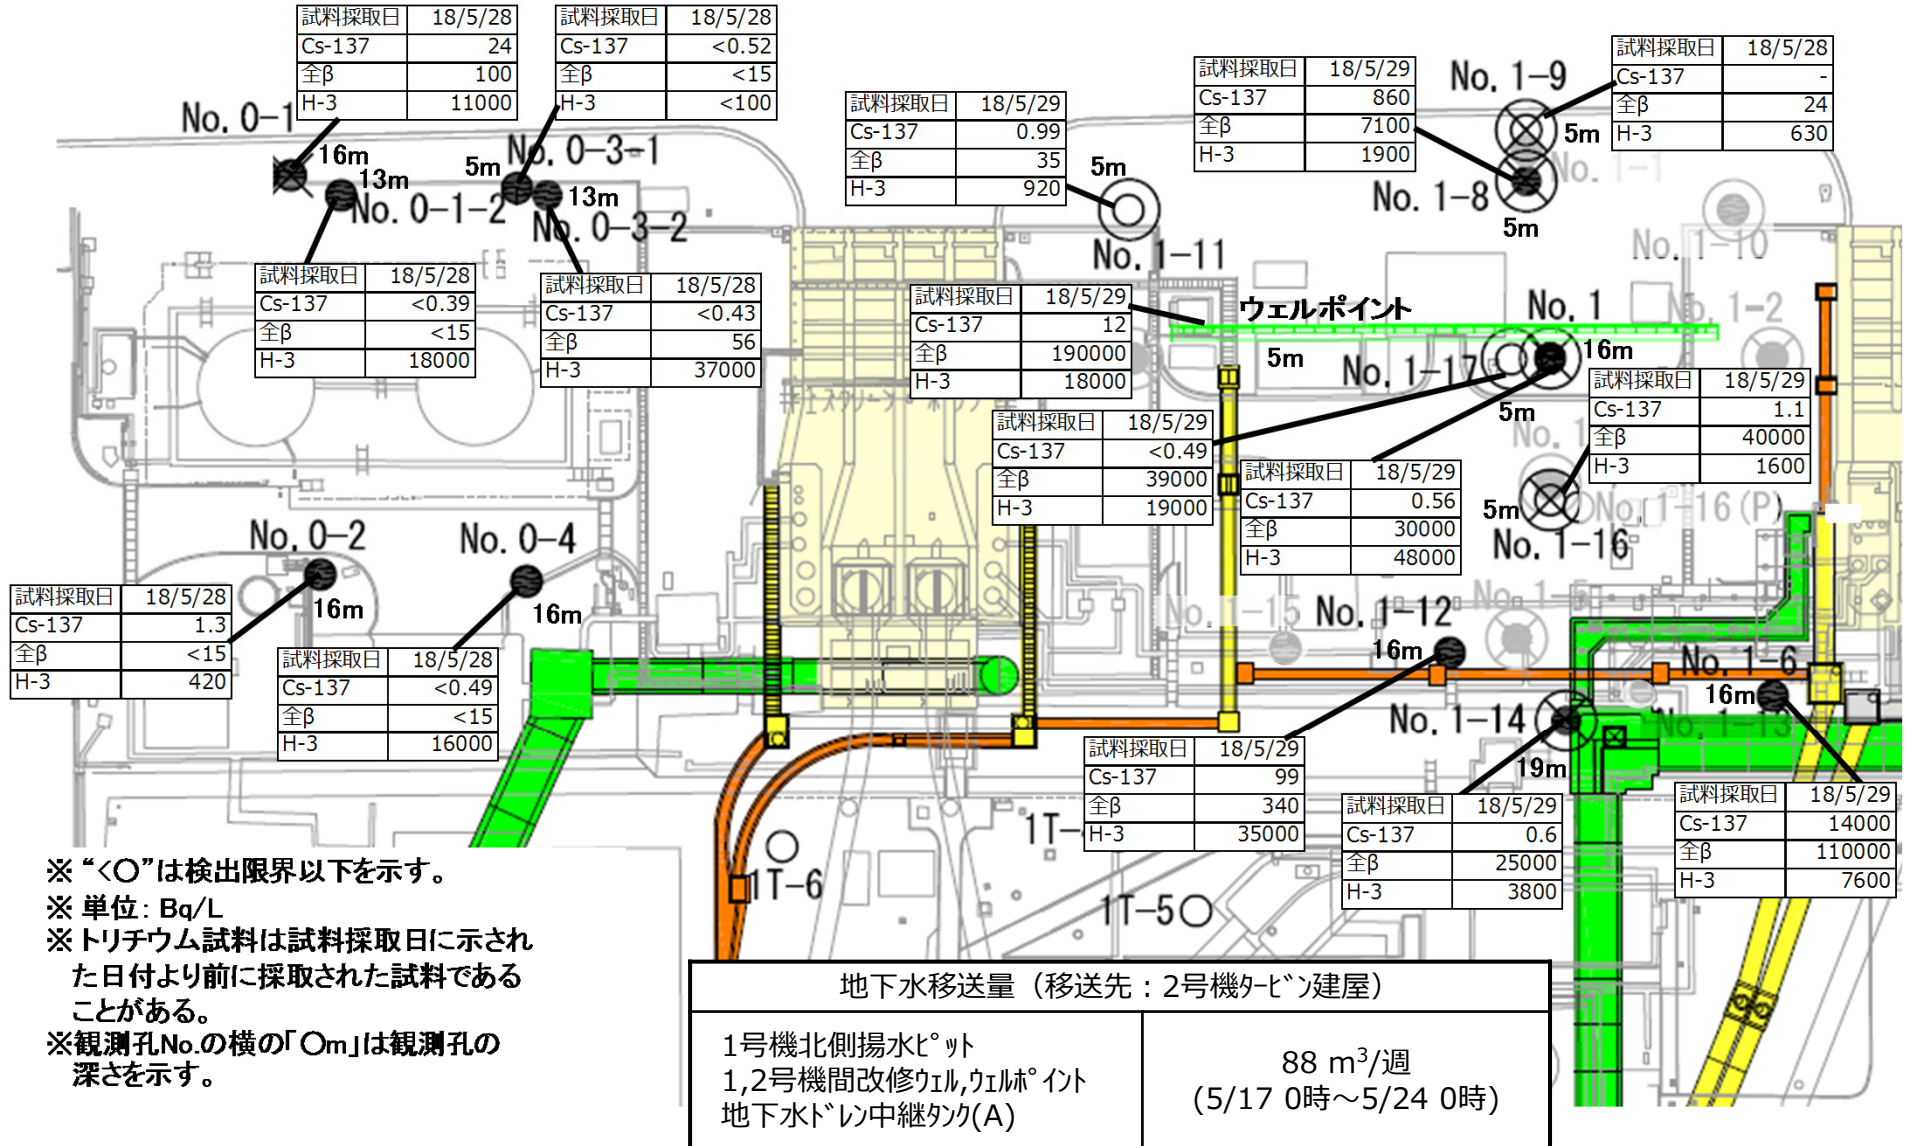

- ※ “<”は検出限界以下を示す。
- ※ 単位: Bq/L
- ※ トリチウム試料は試料採取日に示された日付より前に採取された試料であることがある。
- ※ 観測孔No.の横の「Om」は観測孔の深さを示す。

タービン建屋東側の地下水濃度 (2/2)

<2,3号機取水口間、3,4号機取水口間>

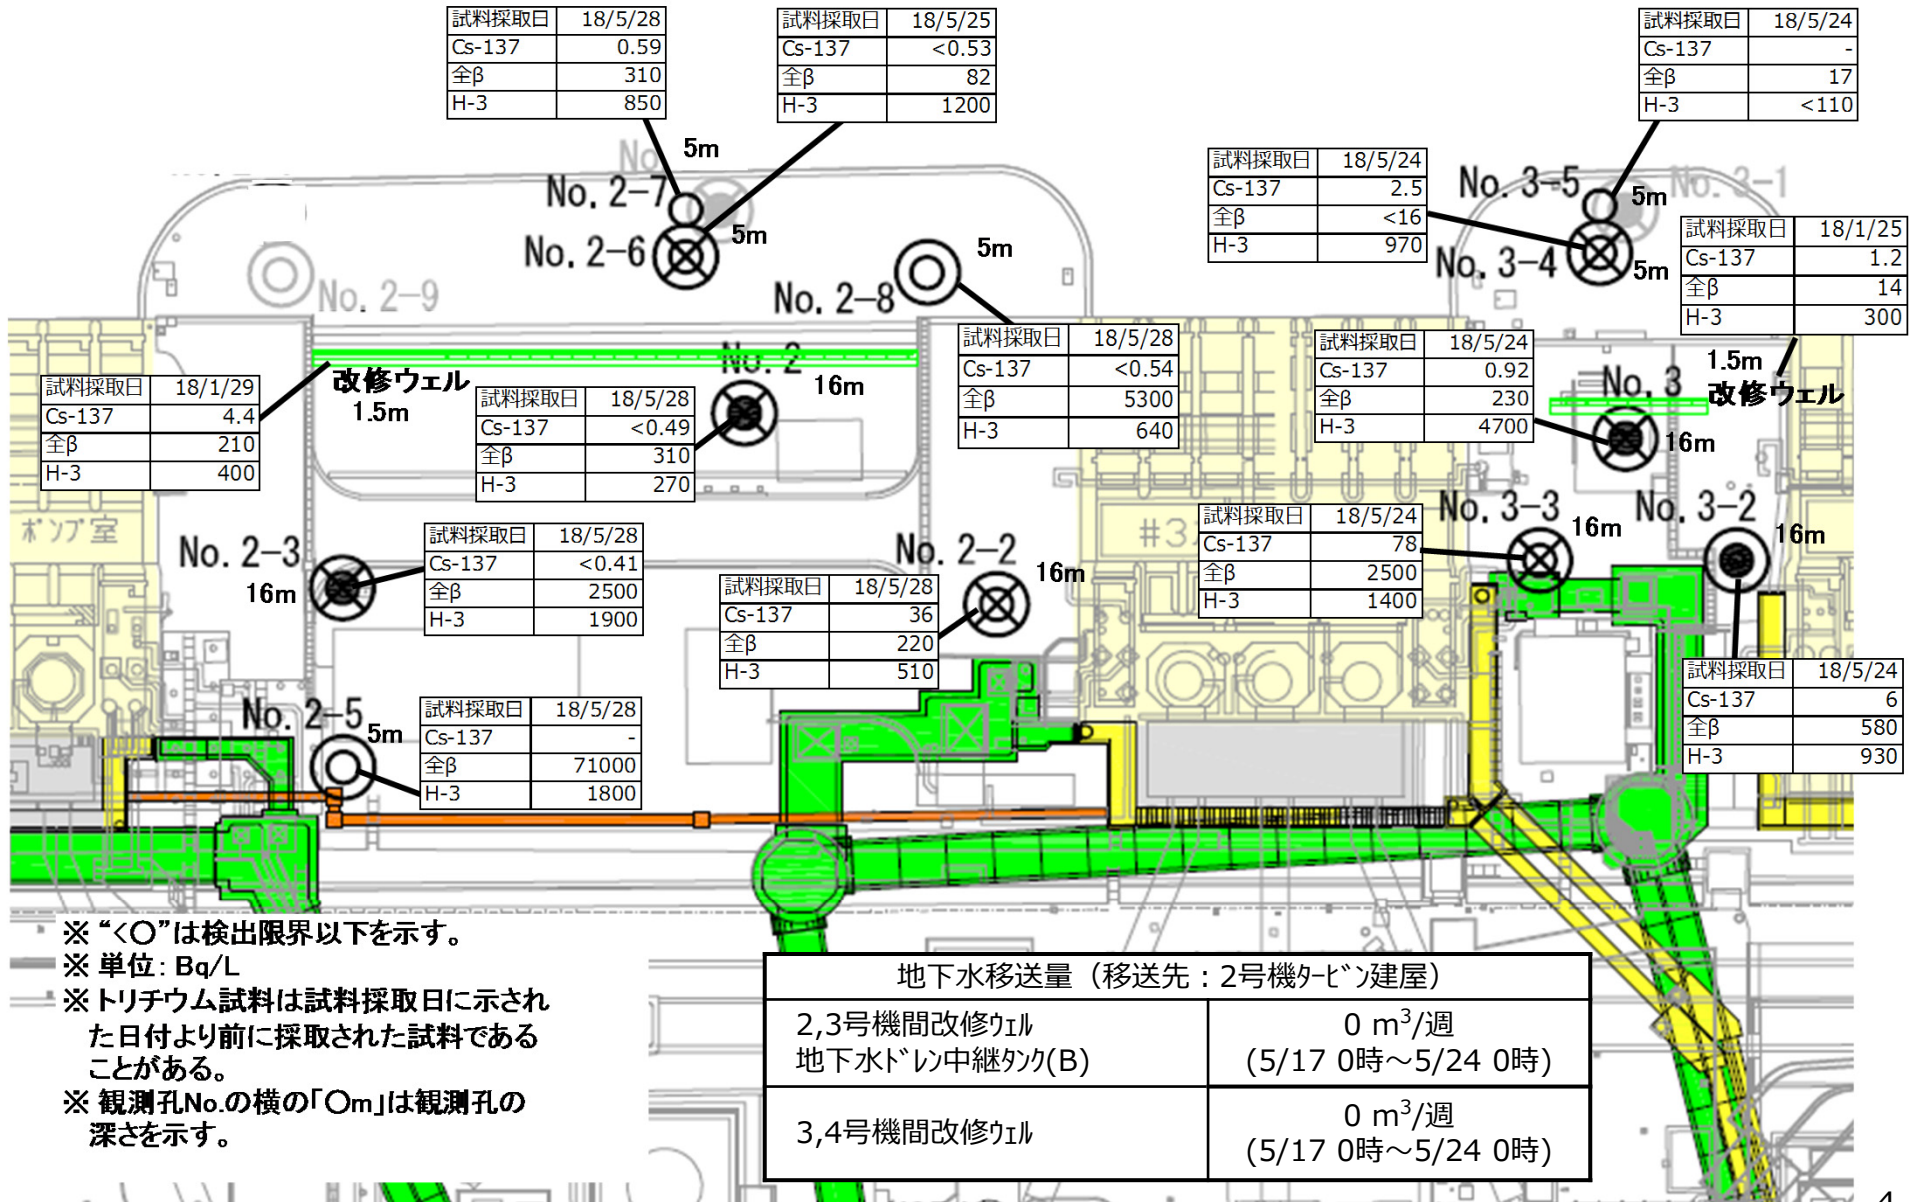

※ “○”は検出限界以下を示す。
 ※ 単位: Bq/L
 ※ トリチウム試料は試料採取日に示された日付より前に採取された試料であることがある。
 ※ 観測孔No.の横の「Om」は観測孔の深さを示す。

<1,2号機取水口間エリア>

- No.1-6でH-3濃度は2017.11より2,000Bq/ℓ程度から15,000Bq/ℓ程度まで上昇したが、2018.3以降低下上昇を繰り返し、現在8,000Bq/ℓ程度となっている。
- No.1-8でH-3濃度は2017.12より900Bq/ℓ程度から上昇し、現在2,000Bq/ℓ程度となっている。
- No.1-12で全β濃度は2018.1より2,000Bq/ℓ程度から低下傾向にあり、現在400Bq/ℓ程度となっている。
- No.1-16でH-3濃度は2018.3より3,000Bq/ℓ程度から低下傾向にあり、現在1,600Bq/ℓ程度となっている。
- No.1-17でH-3濃度は2017.12より30,000Bq/ℓ程度から低下傾向にあり、現在20,000Bq/ℓ程度となっている。

<2,3号機取水口間エリア>

- No.2-3でH-3濃度は2017.11より1,000Bq/ℓ程度から上昇傾向にあり、現在2,000Bq/ℓ程度となっている。全β濃度は2017.12より600Bq/ℓ程度から上昇傾向にあり、現在2,000Bq/ℓ程度となっている。
- No.2-5でH-3濃度は2017.11より700Bq/ℓ程度から上昇傾向にあり、現在1,800Bq/ℓ程度となっている。全β濃度は2018.3より40,000Bq/ℓ程度から上昇傾向にあり、現在70,000Bq/ℓ程度となっている。


<3,4号機取水口間エリア>

- No.3-4でH-3濃度は2018.1より2,000Bq/ℓ程度から低下傾向にあり、現在1,000Bq/ℓ程度となっている。

1号機北側の地下水の濃度推移 (1/2)




1号機北側の地下水の濃度推移 (H-3)

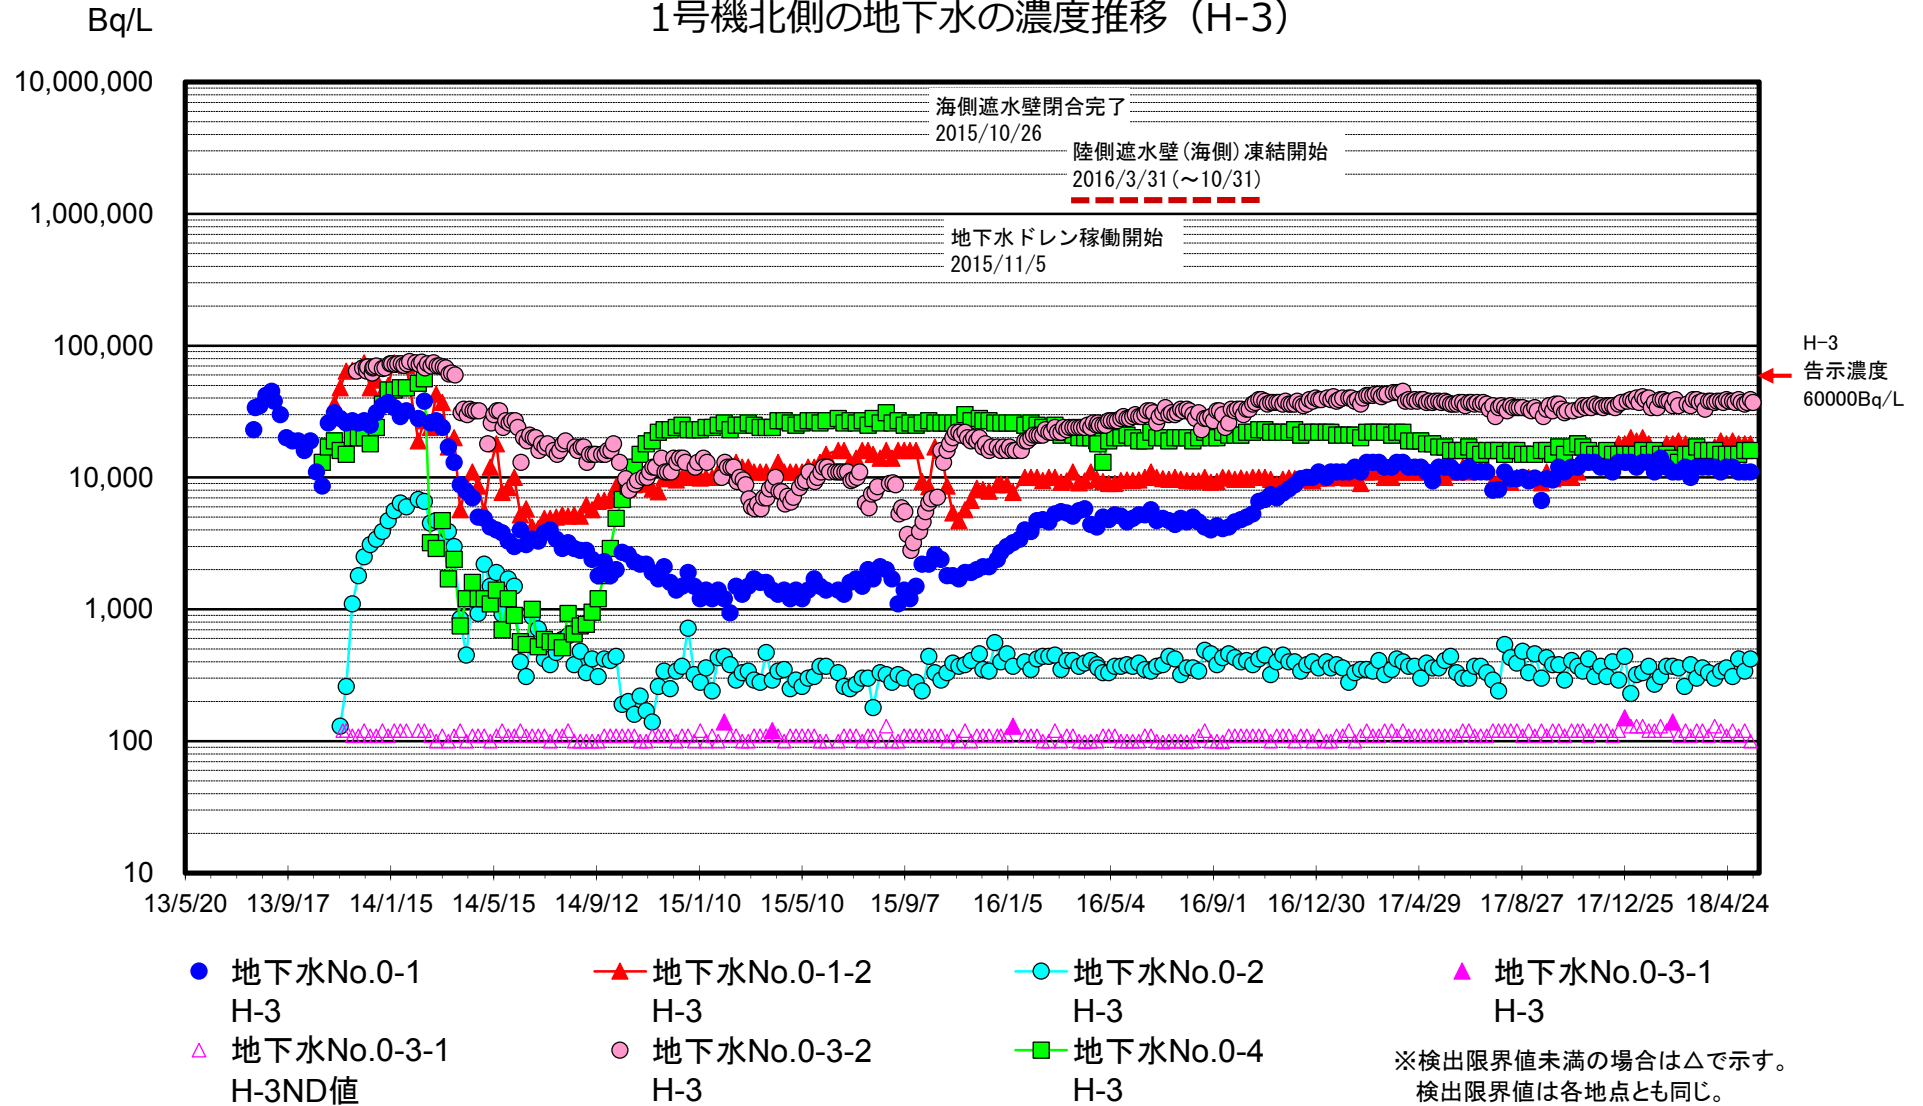

1号機北側の地下水の濃度推移 (2/2)




1号機北側の地下水の濃度推移 (全β)

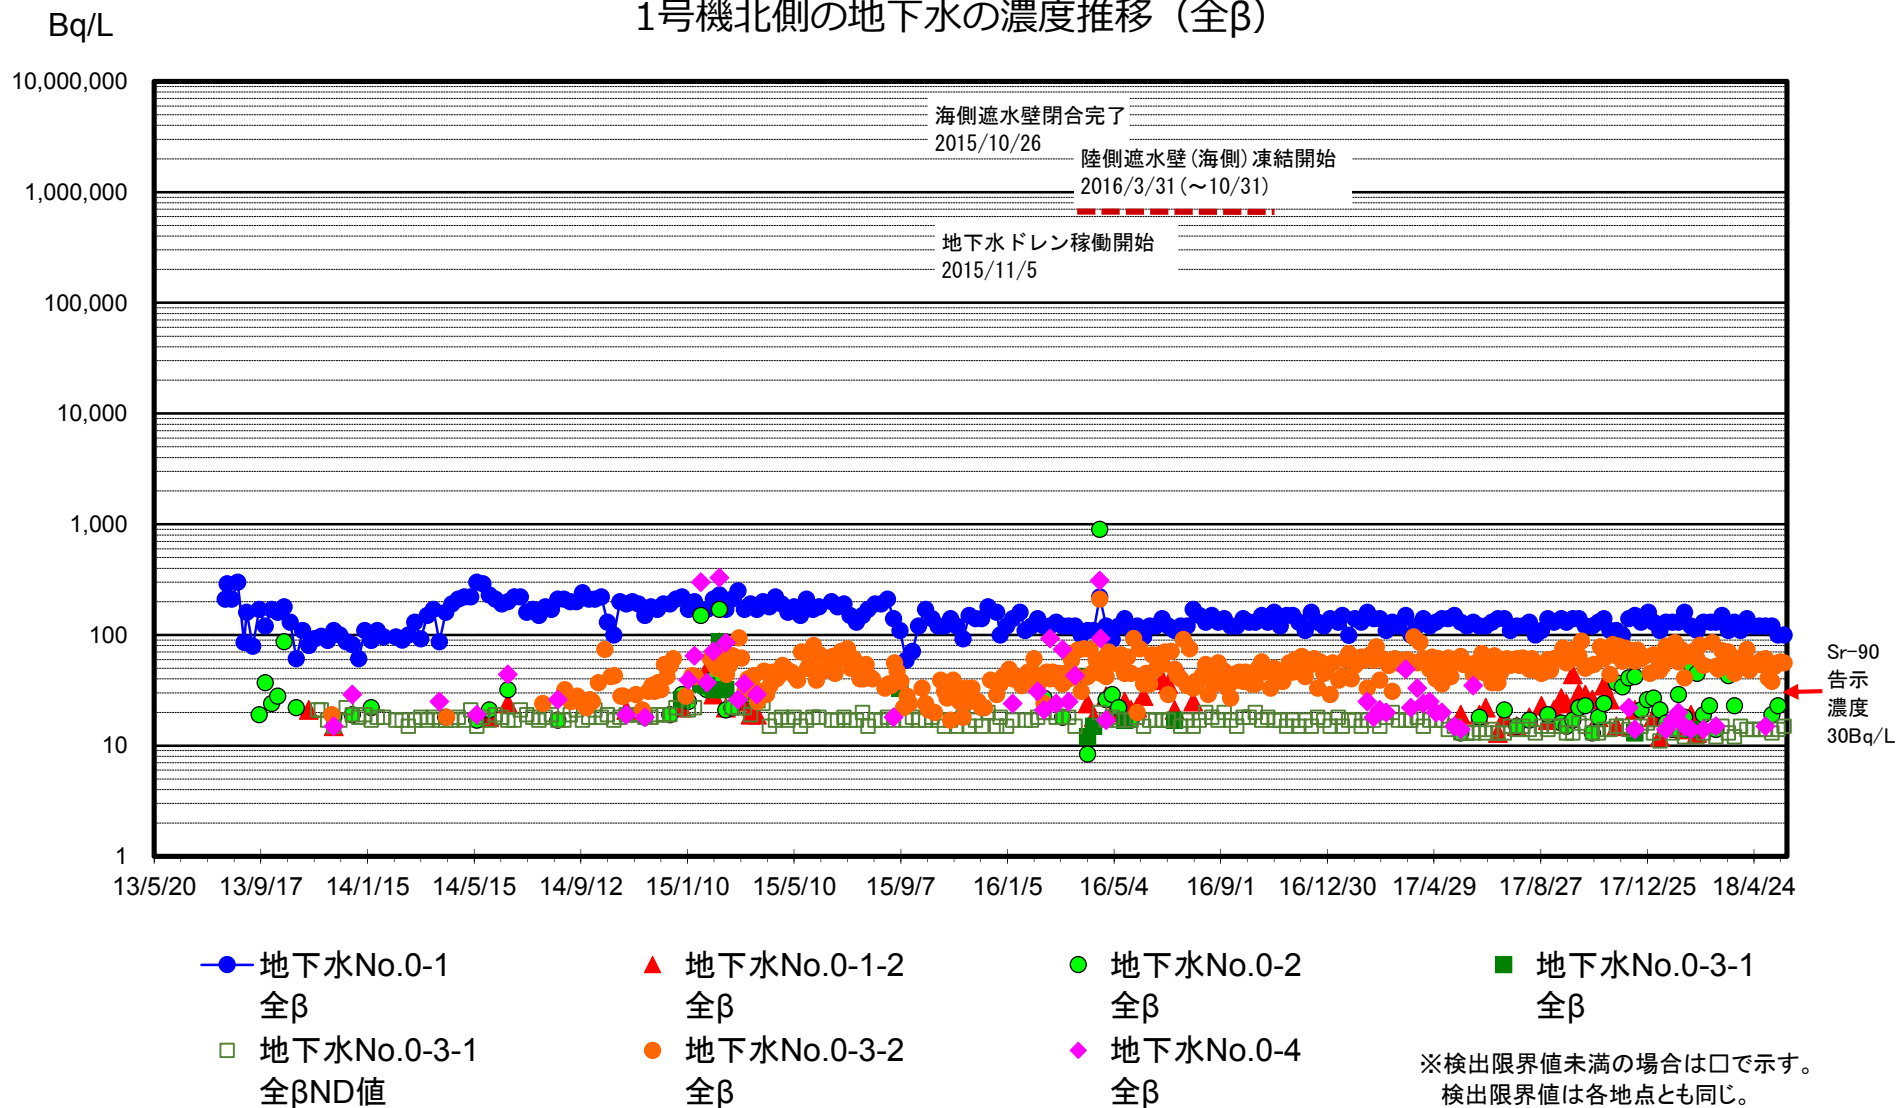

1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (1/2)



1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (H-3)

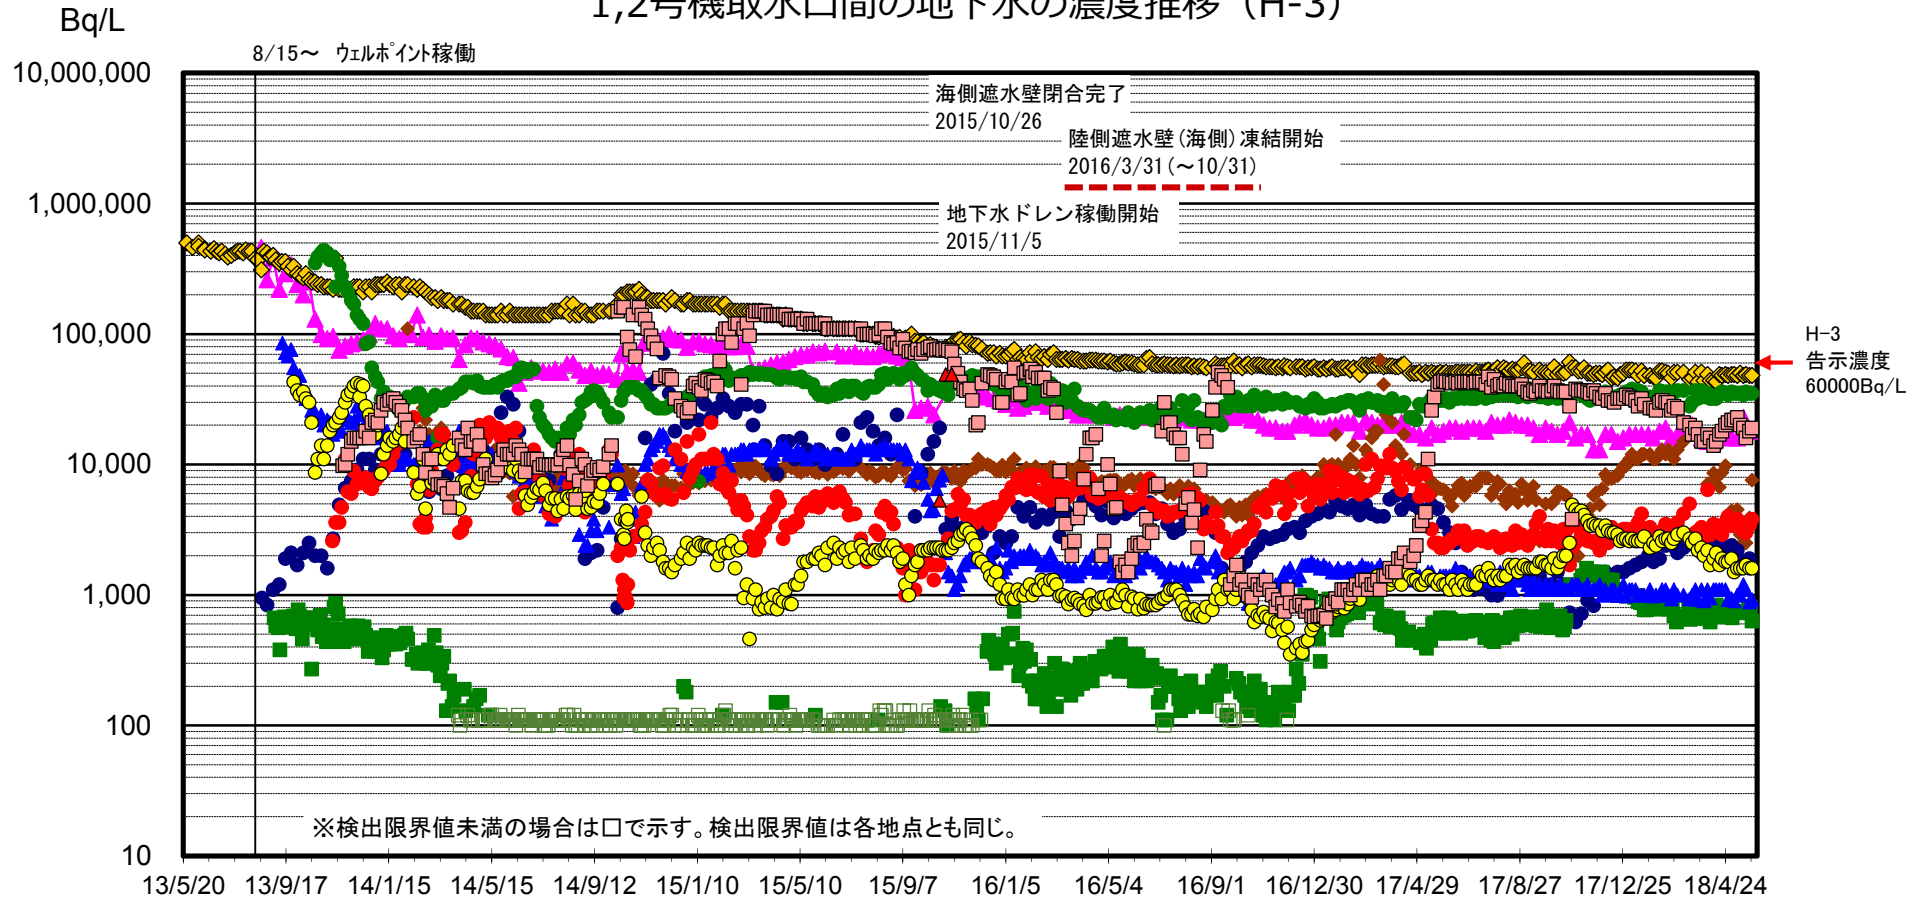


- | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| ◆ 地下水No.1 H-3 | ◆ 地下水No.1-6 H-3 | ● 地下水No.1-8 H-3 | ■ 地下水No.1-9 H-3 | □ 地下水No.1-9 H-3ND値 | ▲ 地下水No.1-11 H-3 |
| ● 地下水No.1-12 H-3 | ● 地下水No.1-14 H-3 | ● 地下水No.1-16 H-3 | ■ 地下水No.1-17 H-3 | ▲ 1,2uウェルポイント H-3 | ▲ 1,2u改修ウェル H-3 |

1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (2/2)



1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (全β、Sr-90)

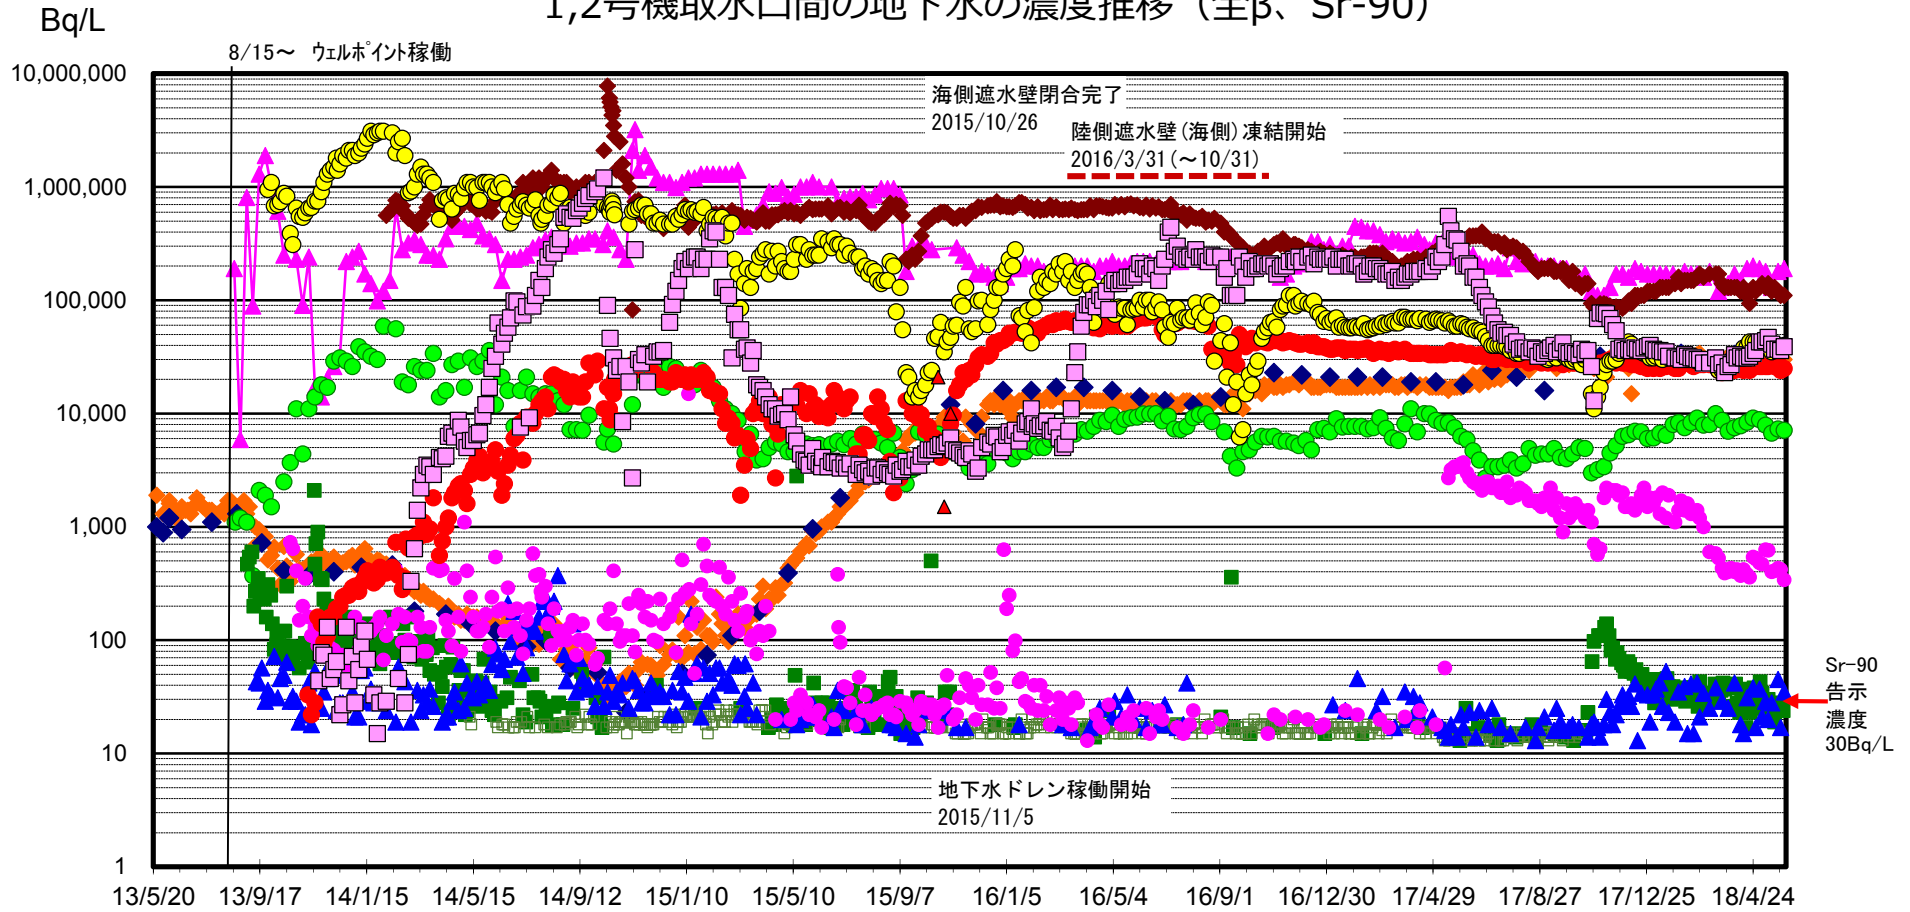


- ◆ 地下水No.1 全β
- ◆ 地下水No.1 Sr-90
- ◆ 地下水No.1-6 全β
- 地下水No.1-8 全β
- 地下水No.1-9 全β
- 地下水No.1-9 全βND値
- ▲ 地下水No.1-11 全β
- 地下水No.1-12 全β
- 地下水No.1-14 全β
- 地下水No.1-16 全β
- 地下水No.1-17 全β
- ▲ 1,2uウエルポイント 全β
- ▲ 1,2u改修ウエル 全β

※検出限界値未満の場合は口で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

2,3号機取水口間の地下水の濃度推移 (1/2)




2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(H-3)

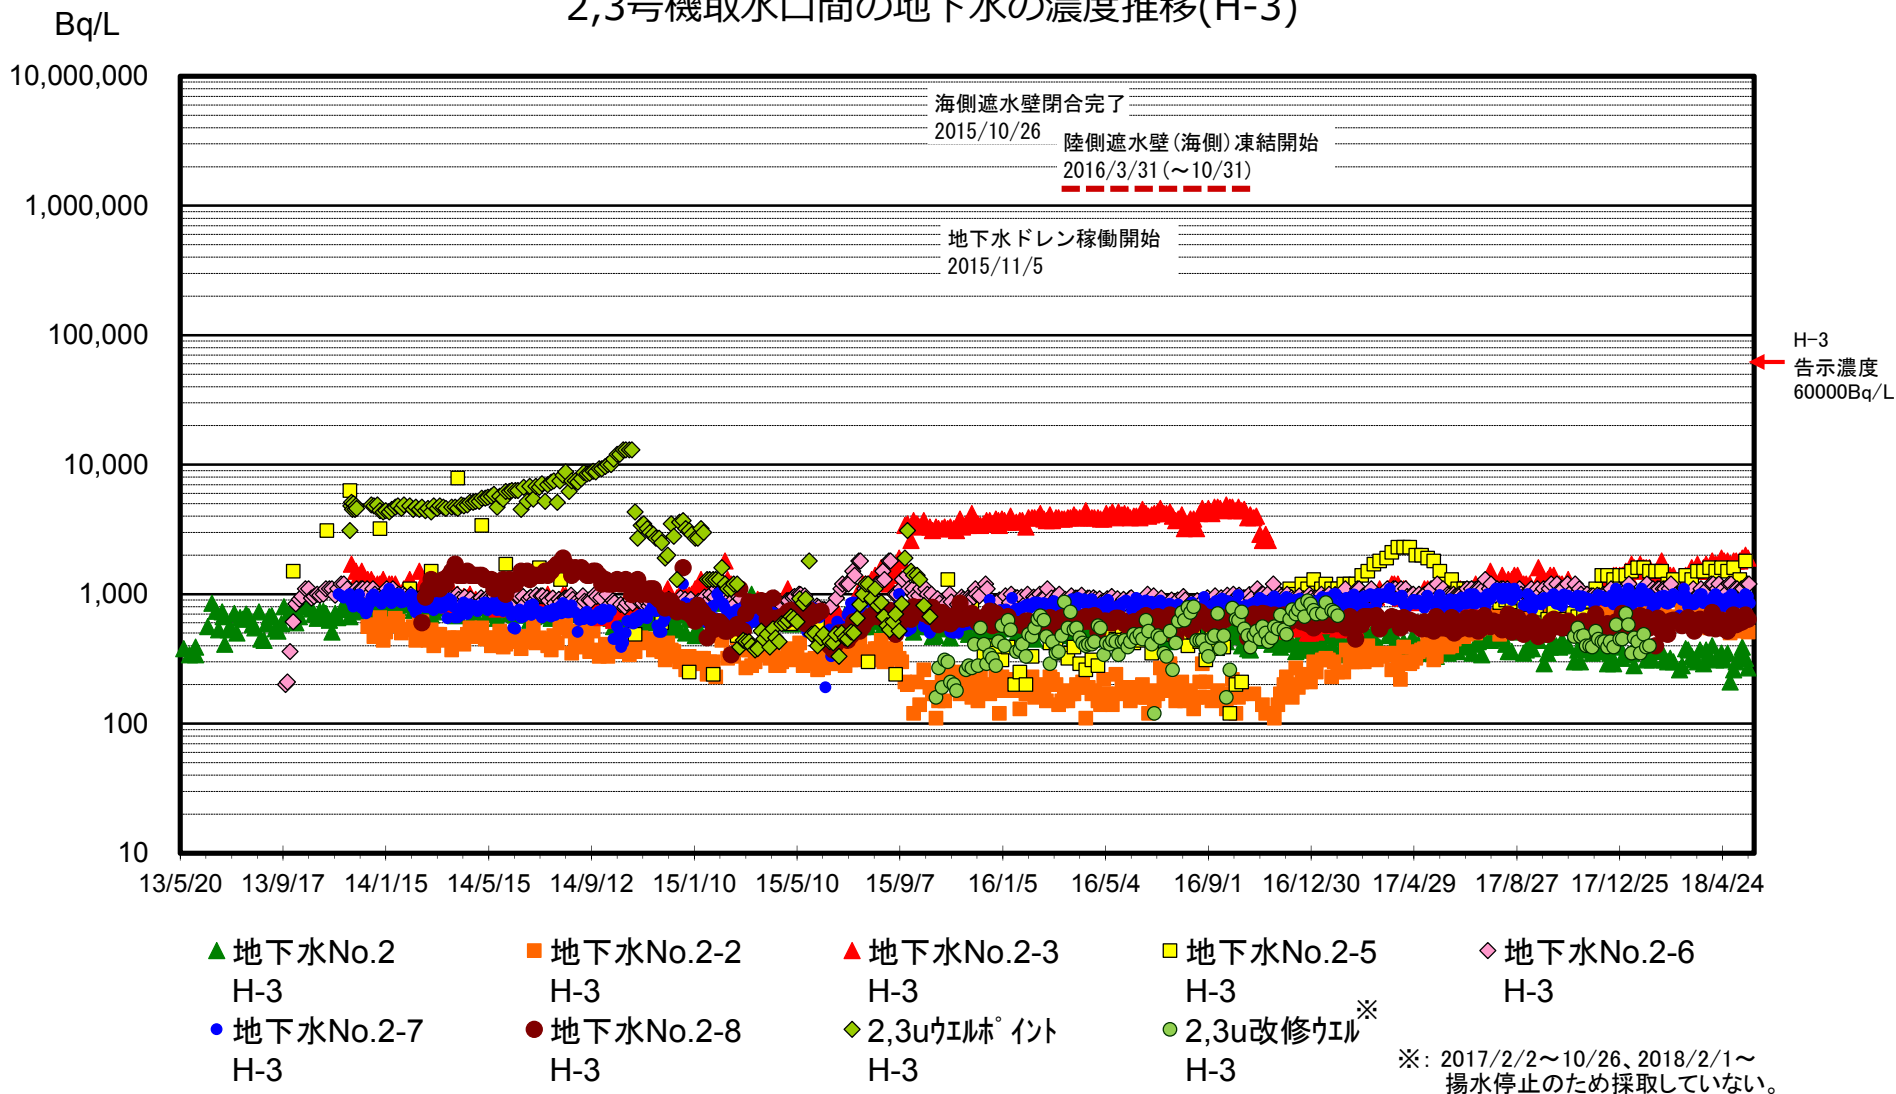

2,3号機取水口間の地下水の濃度推移 (2/2)



2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(全β、Sr-90)

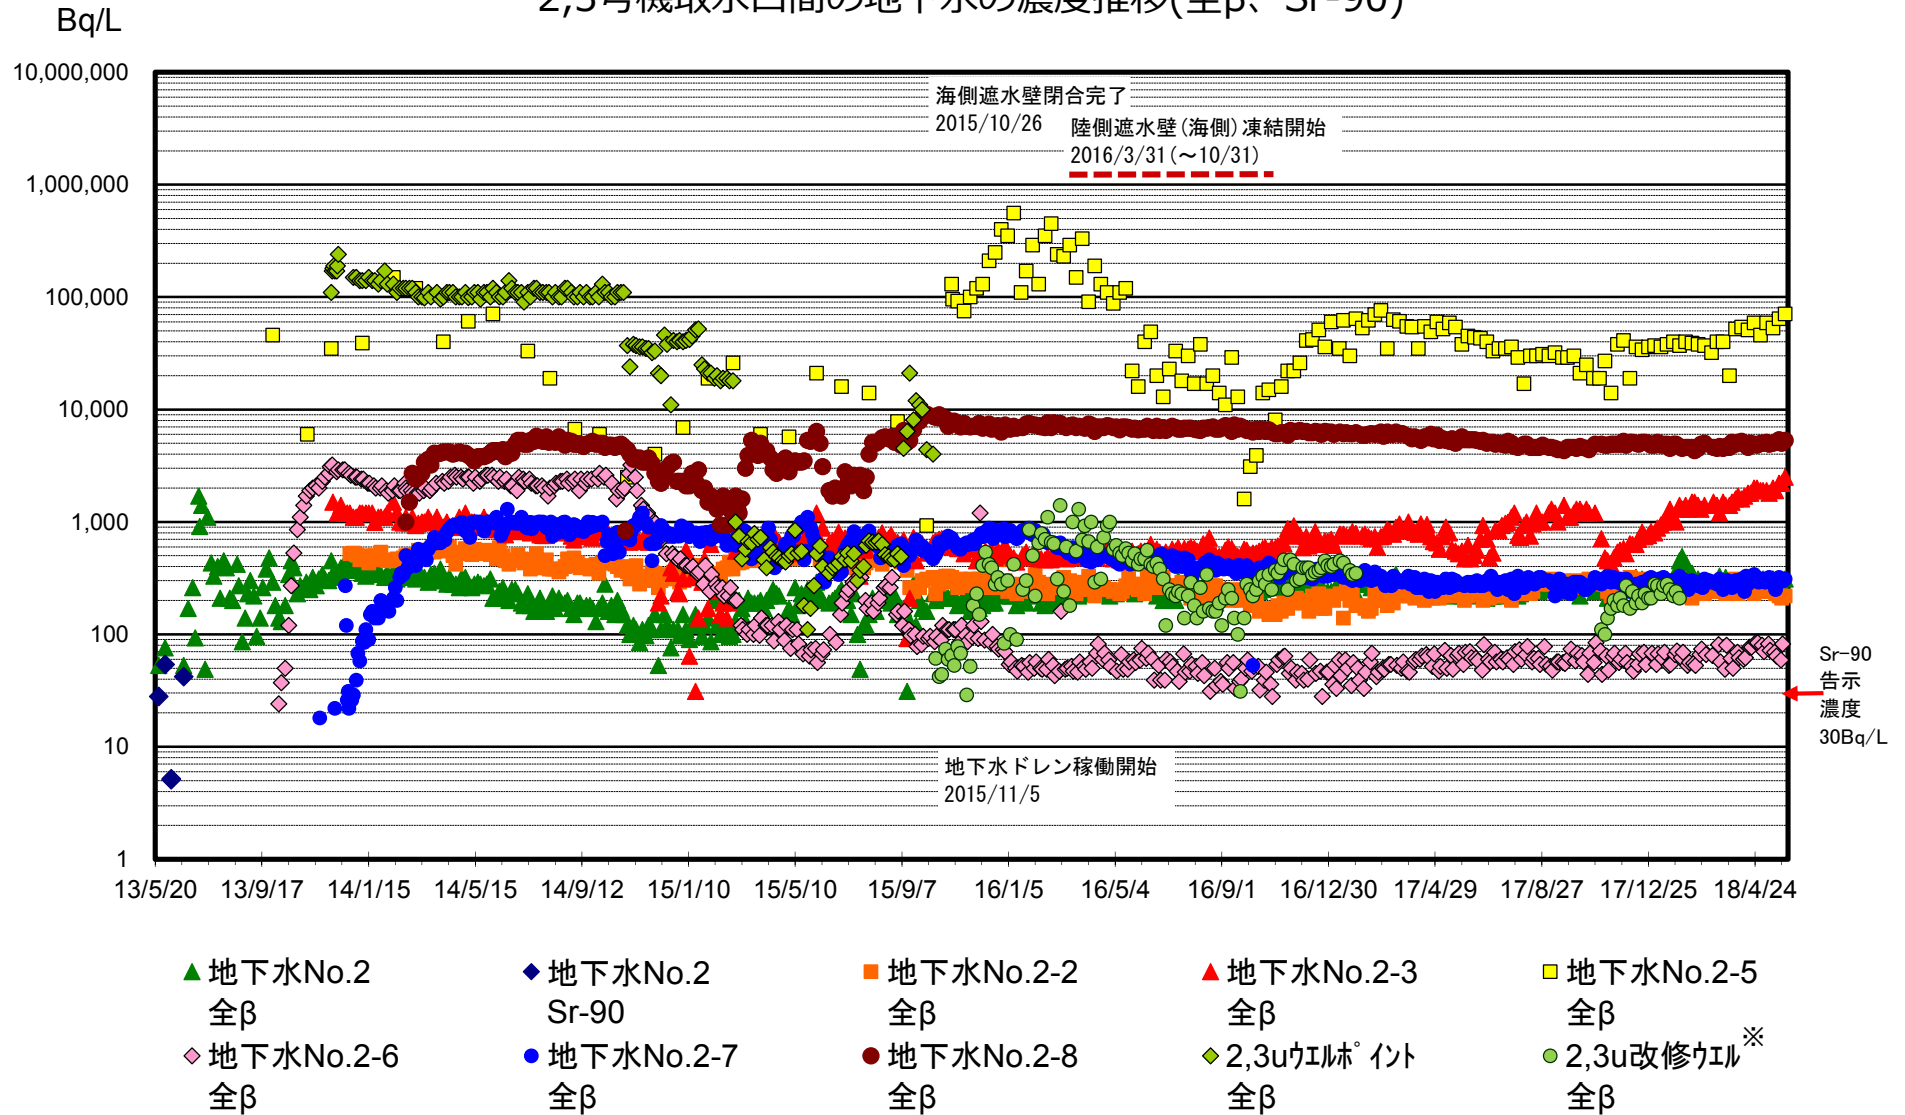


※: 2017/2/2~10/26、2018/2/1~揚水停止のため採取していない。

3,4号機取水口間の地下水の濃度推移 (1/2)



3,4号機取水口間の地下水の濃度推移 (H-3)

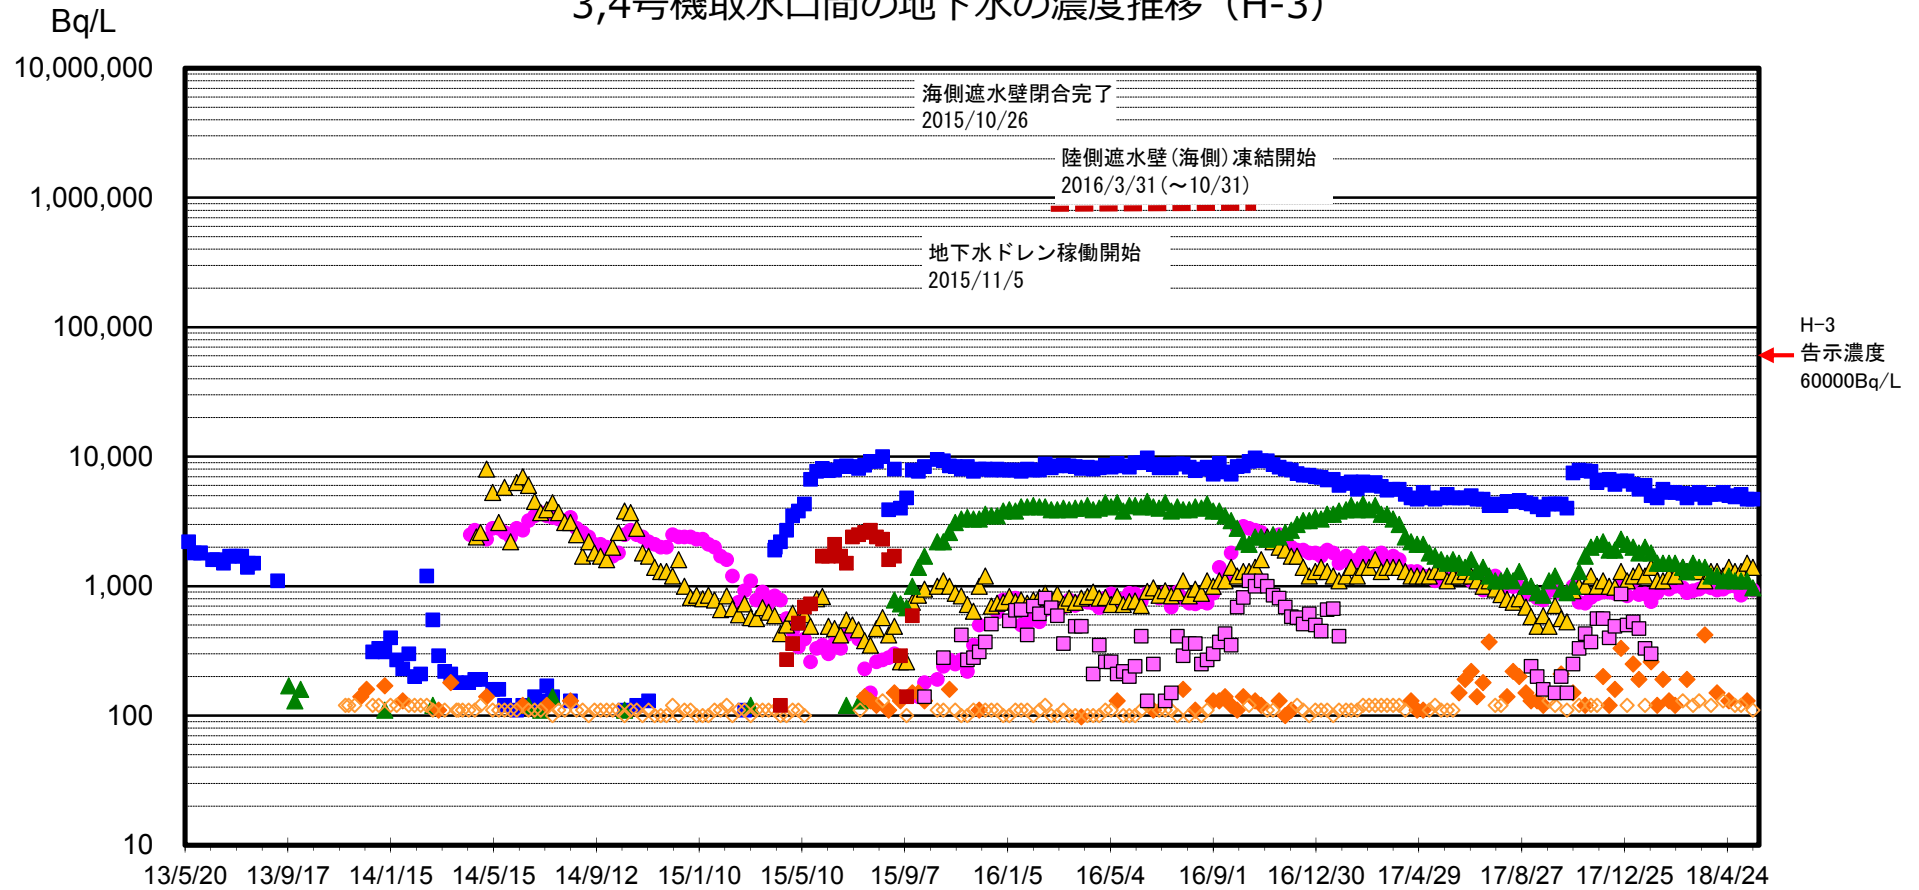

- 地下水No.3 H-3
- 地下水No.3-2 H-3
- ▲ 地下水No.3-3 H-3
- ▲ 地下水No.3-4 H-3
- ◆ 地下水No.3-5 H-3
- ◇^{※1} 地下水No.3-5 H-3ND値
- 3,4uウエル^{※2} イント H-3
- 3,4u改修ウエル H-3

※検出限界値未満の場合は◇で示す。検出限界値は各地点とも同じ。


※1: 2015/5/20~7/8 水位低下のため採取できず。

※2: 2015/10/15,29,11/5 水位低下のため採取できず。2017/2/2~2017/8/31、2018/2/1~揚水停止のため採取していない。

3,4号機取水口間の地下水の濃度推移 (2/2)



3,4号機取水口間の地下水の濃度推移 (全β)

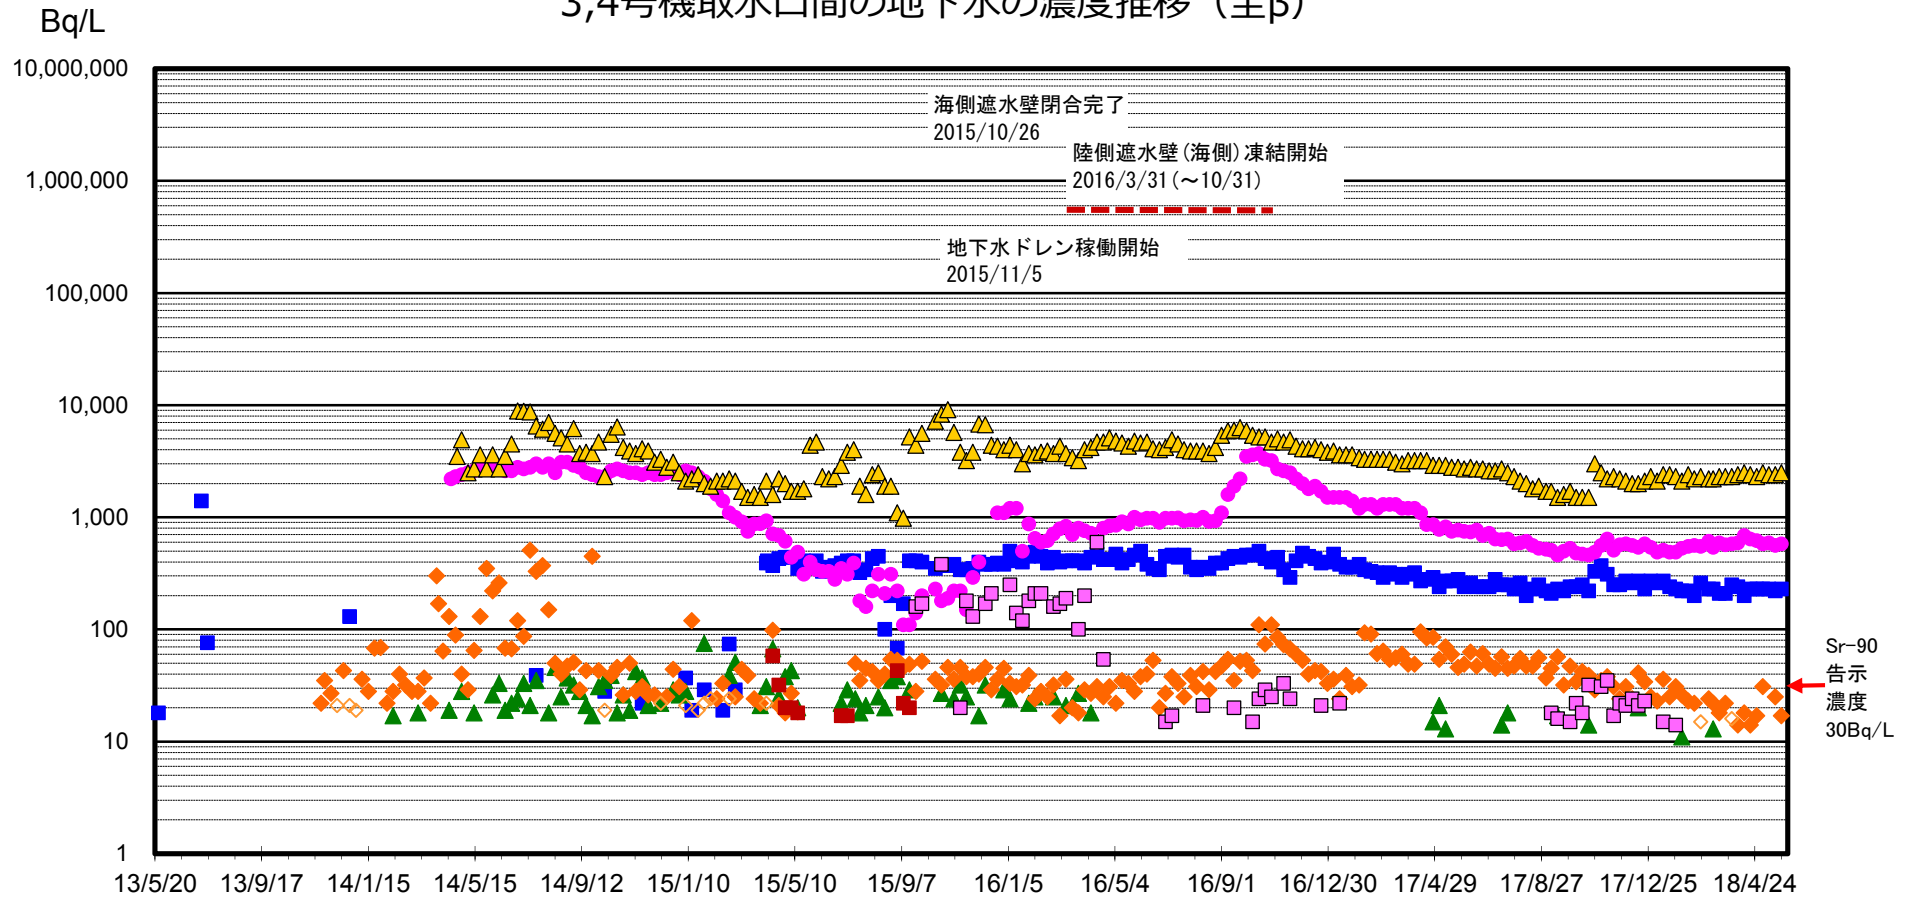

- 地下水No.3 全β
- 地下水No.3-2 全β
- ▲ 地下水No.3-3 全β
- ▲ 地下水No.3-4 全β
- ◆ 地下水No.3-5 全β
- ◇ 地下水No.3-5 全βND値
- 3,4uウレイト 全β
- 3,4u改修ウレイト 全β

※検出限界値未満の場合は◇で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

※1: 2015/5/20~7/8 水位低下のため採取できず。

※2: 2015/10/15,29,11/5 水位低下のため採取できず。2017/2/2~2017/8/31、2018/2/1~揚水停止のため採取していない。

<A排水路>

- 道路・排水路の清掃を実施中
- 多核種除去設備工リアの排水を港湾外から港湾内へ付け替える工事を完了
(2018年3月26日通水開始)
- Cs-137濃度が高めであるが低下傾向の推移となっている。

<物揚場排水路>

- 道路・排水路の清掃を実施中
- H-3濃度、Cs-137濃度、全β濃度とも低下傾向にある。


<K排水路>

- 道路・排水路の清掃を実施中、排水路及び枝管に浄化材を設置中
- H-3濃度、Cs-137濃度が高めであるが低下傾向の推移となっている。
- Cs-137、Cs-134濃度と全β濃度がほぼ等しい。

<C排水路>

- 道路・排水路の清掃を実施中
- 降雨時にCs-137濃度よりも全β濃度が上昇する傾向にあるが、全体的に低下傾向にある。


排水路における排水の濃度推移 (Cs-137)

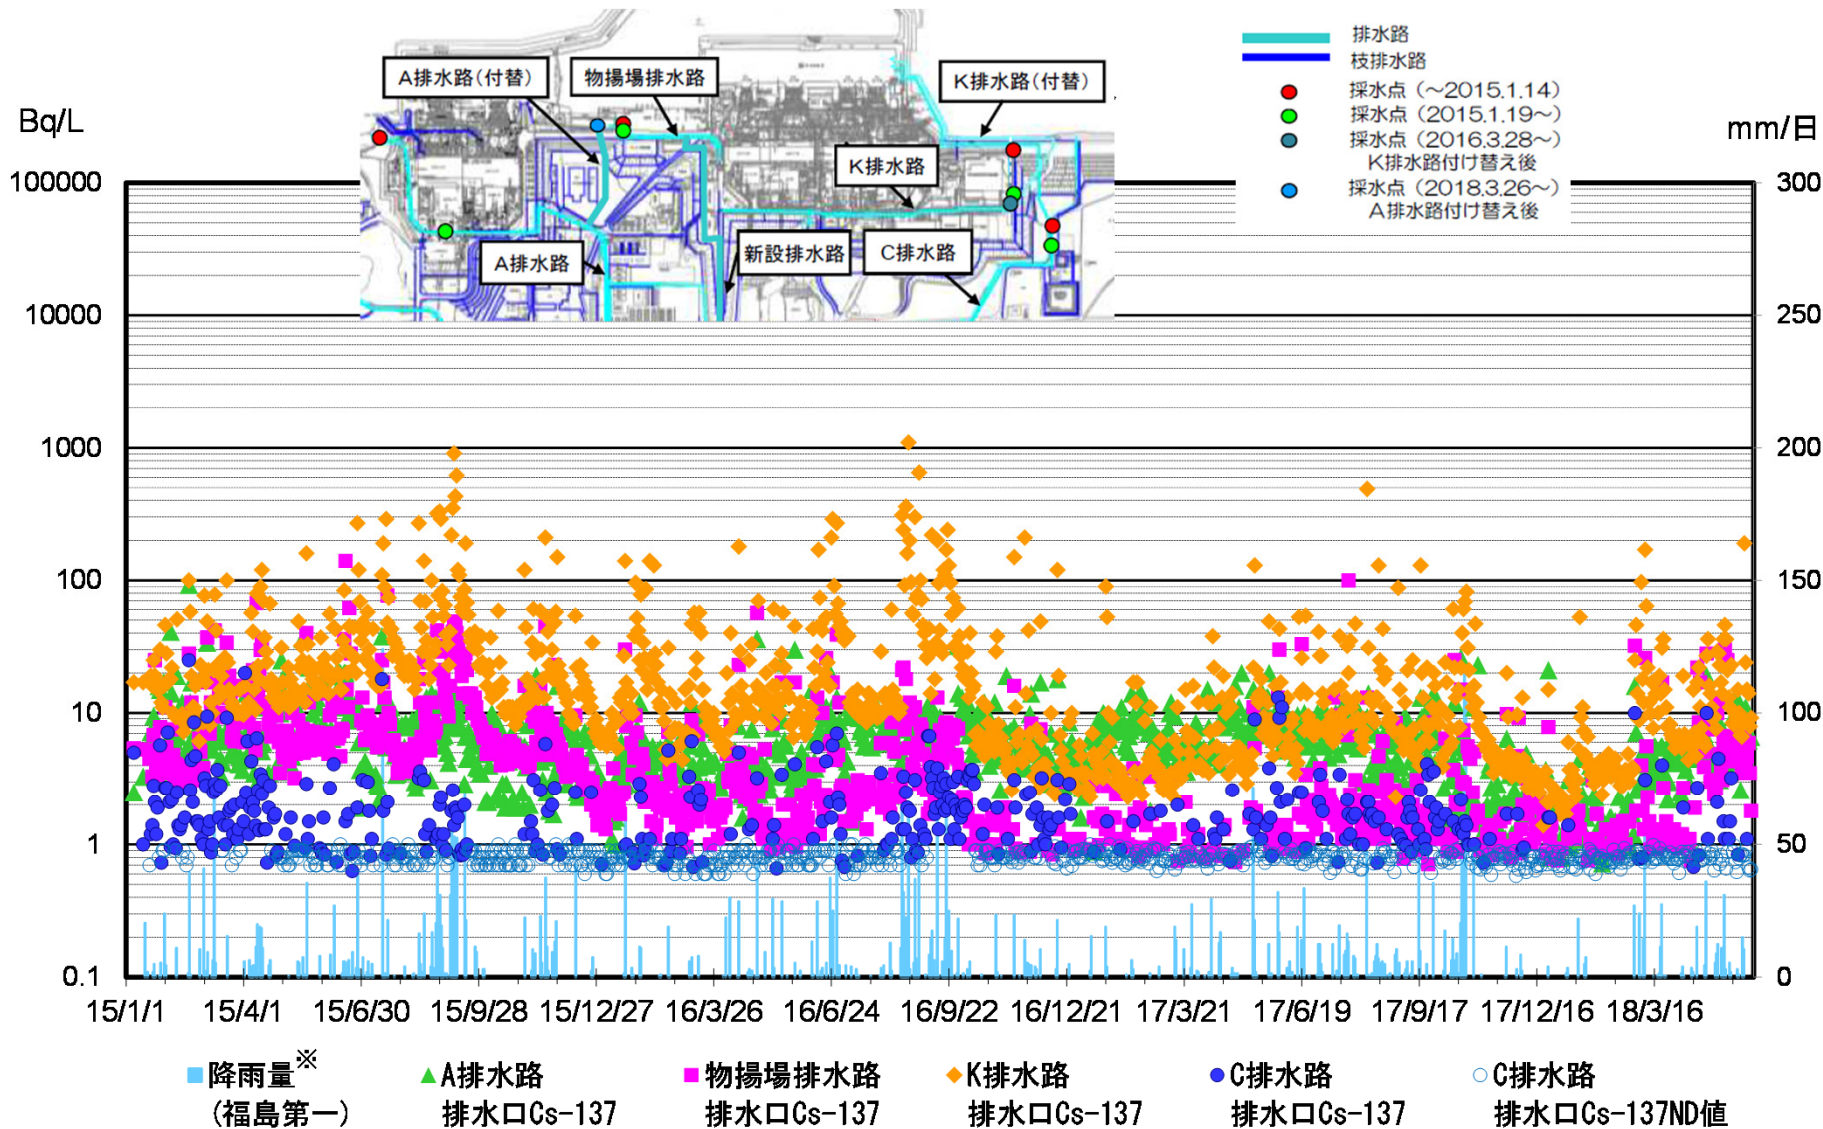

※: 2017/5/13～5/15 欠測につき浪江アタ'スのデータを使用

注: 検出限界値未満の場合は○で示す。検出限界値は各地点とも同等


排水路における排水の濃度推移 (H-3)

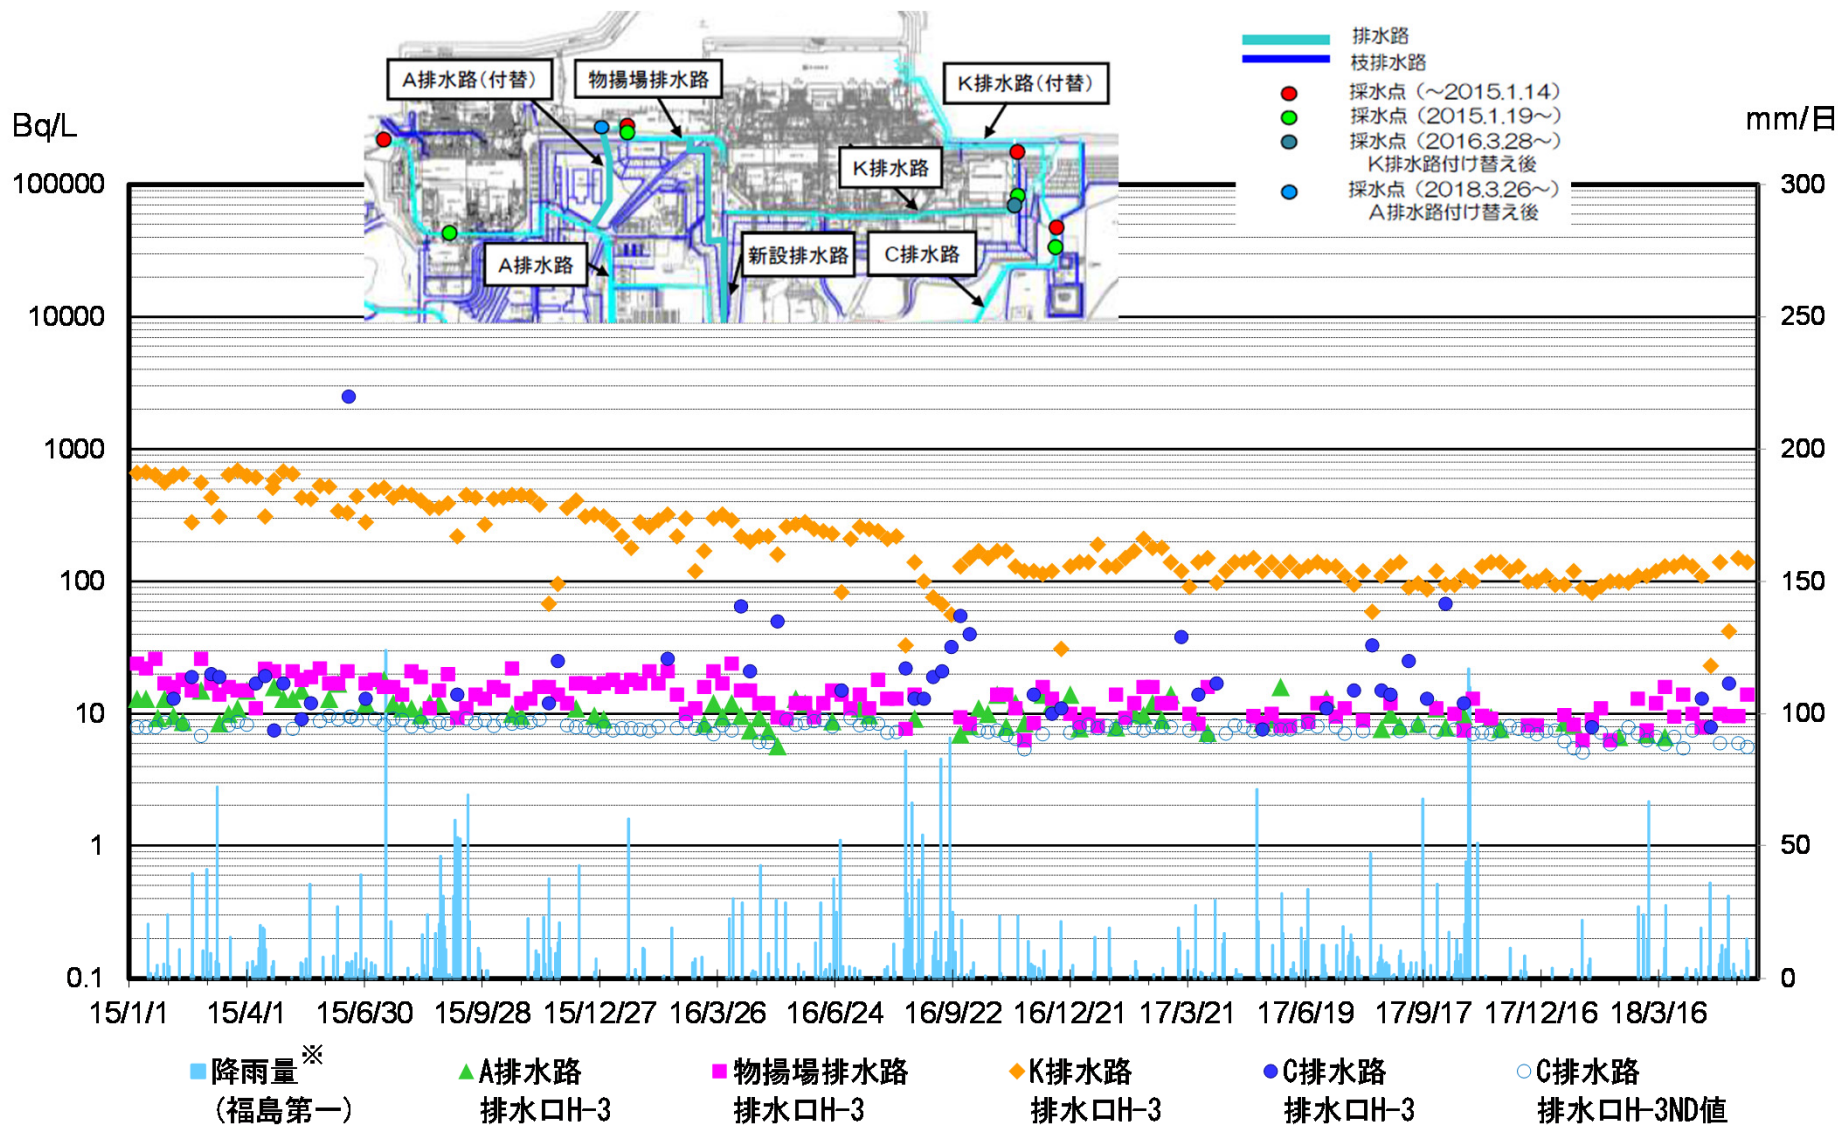


※: 2017/5/13~5/15 欠測につき浪江アダスのデータを使用

注: 検出限界値未満の場合は○で示す。検出限界値は各地点とも同じ

排水路における排水の濃度推移 (全β)

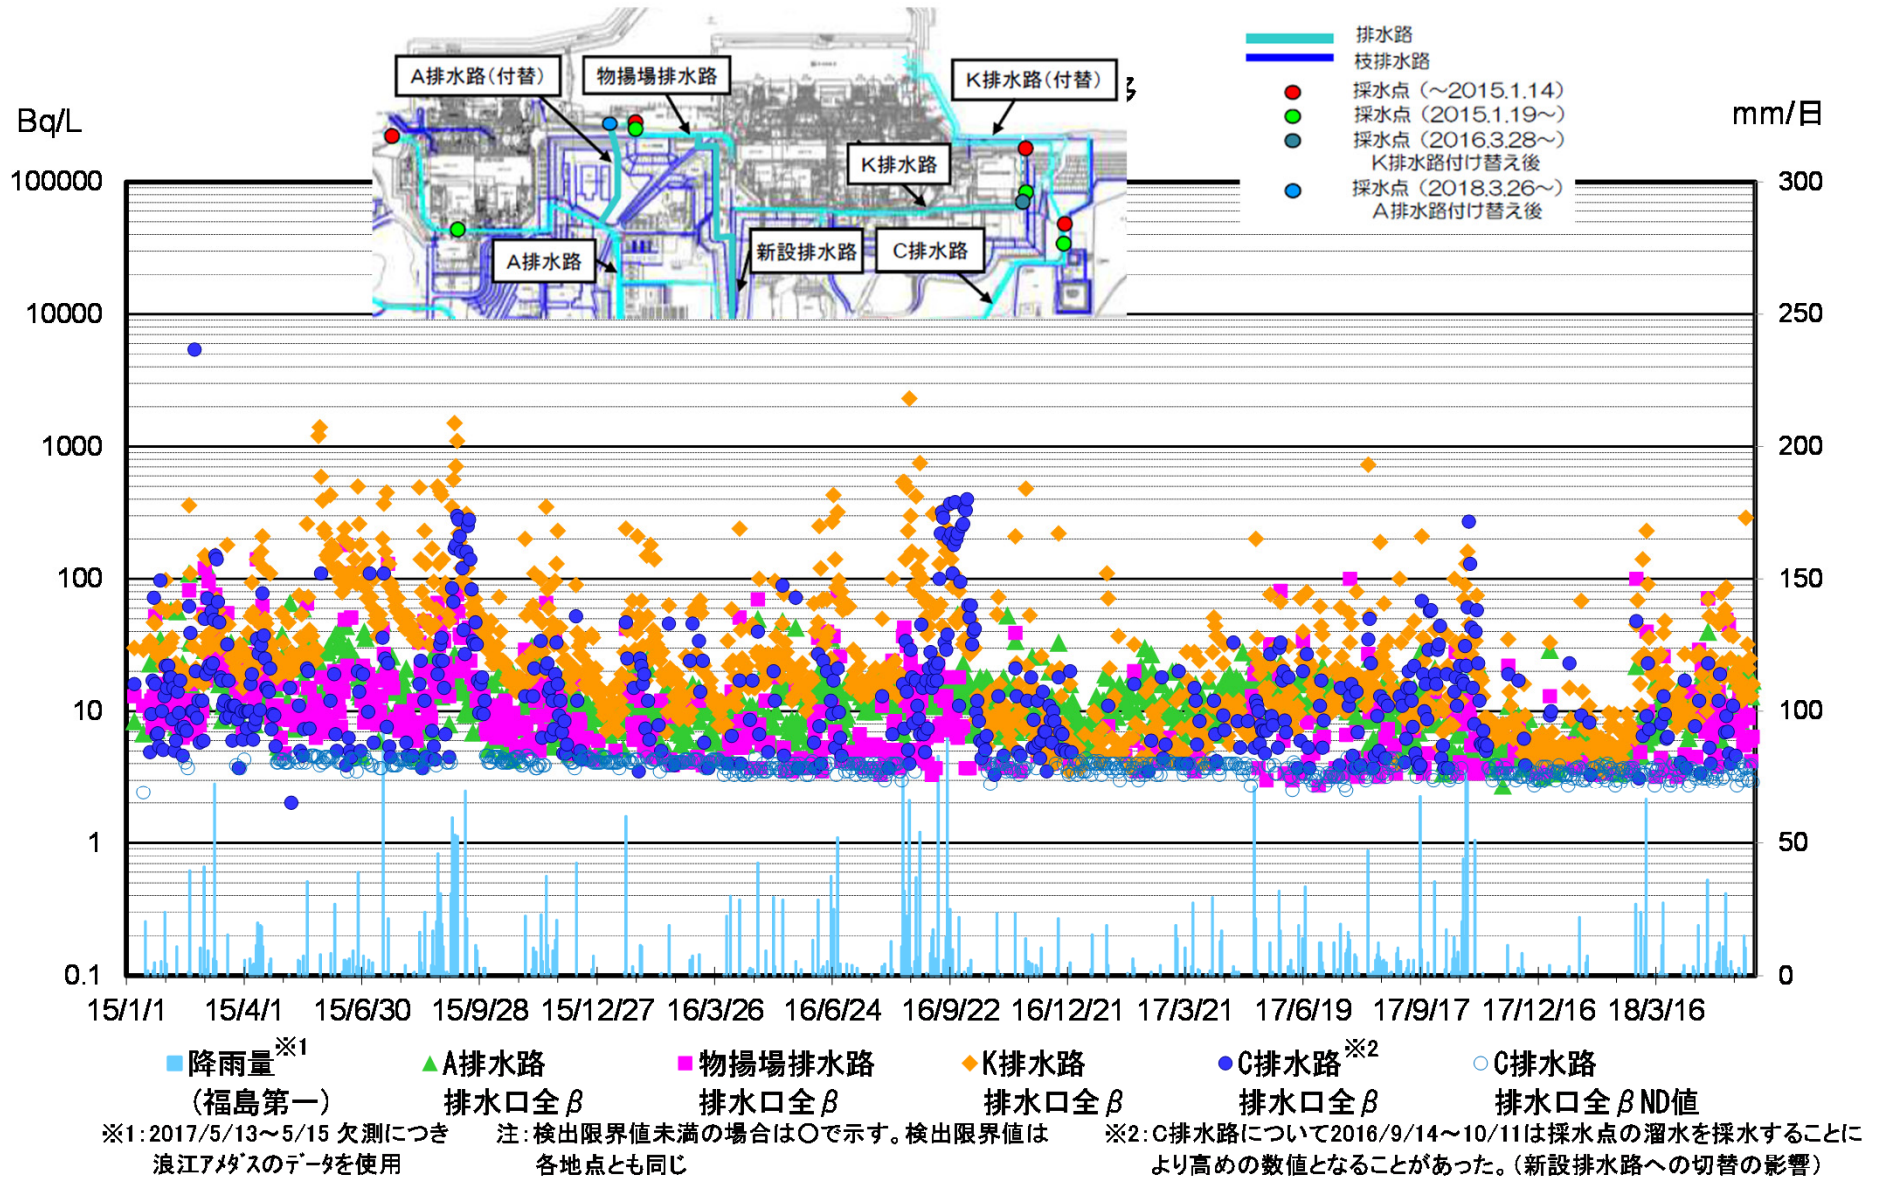

港湾内外の海水濃度

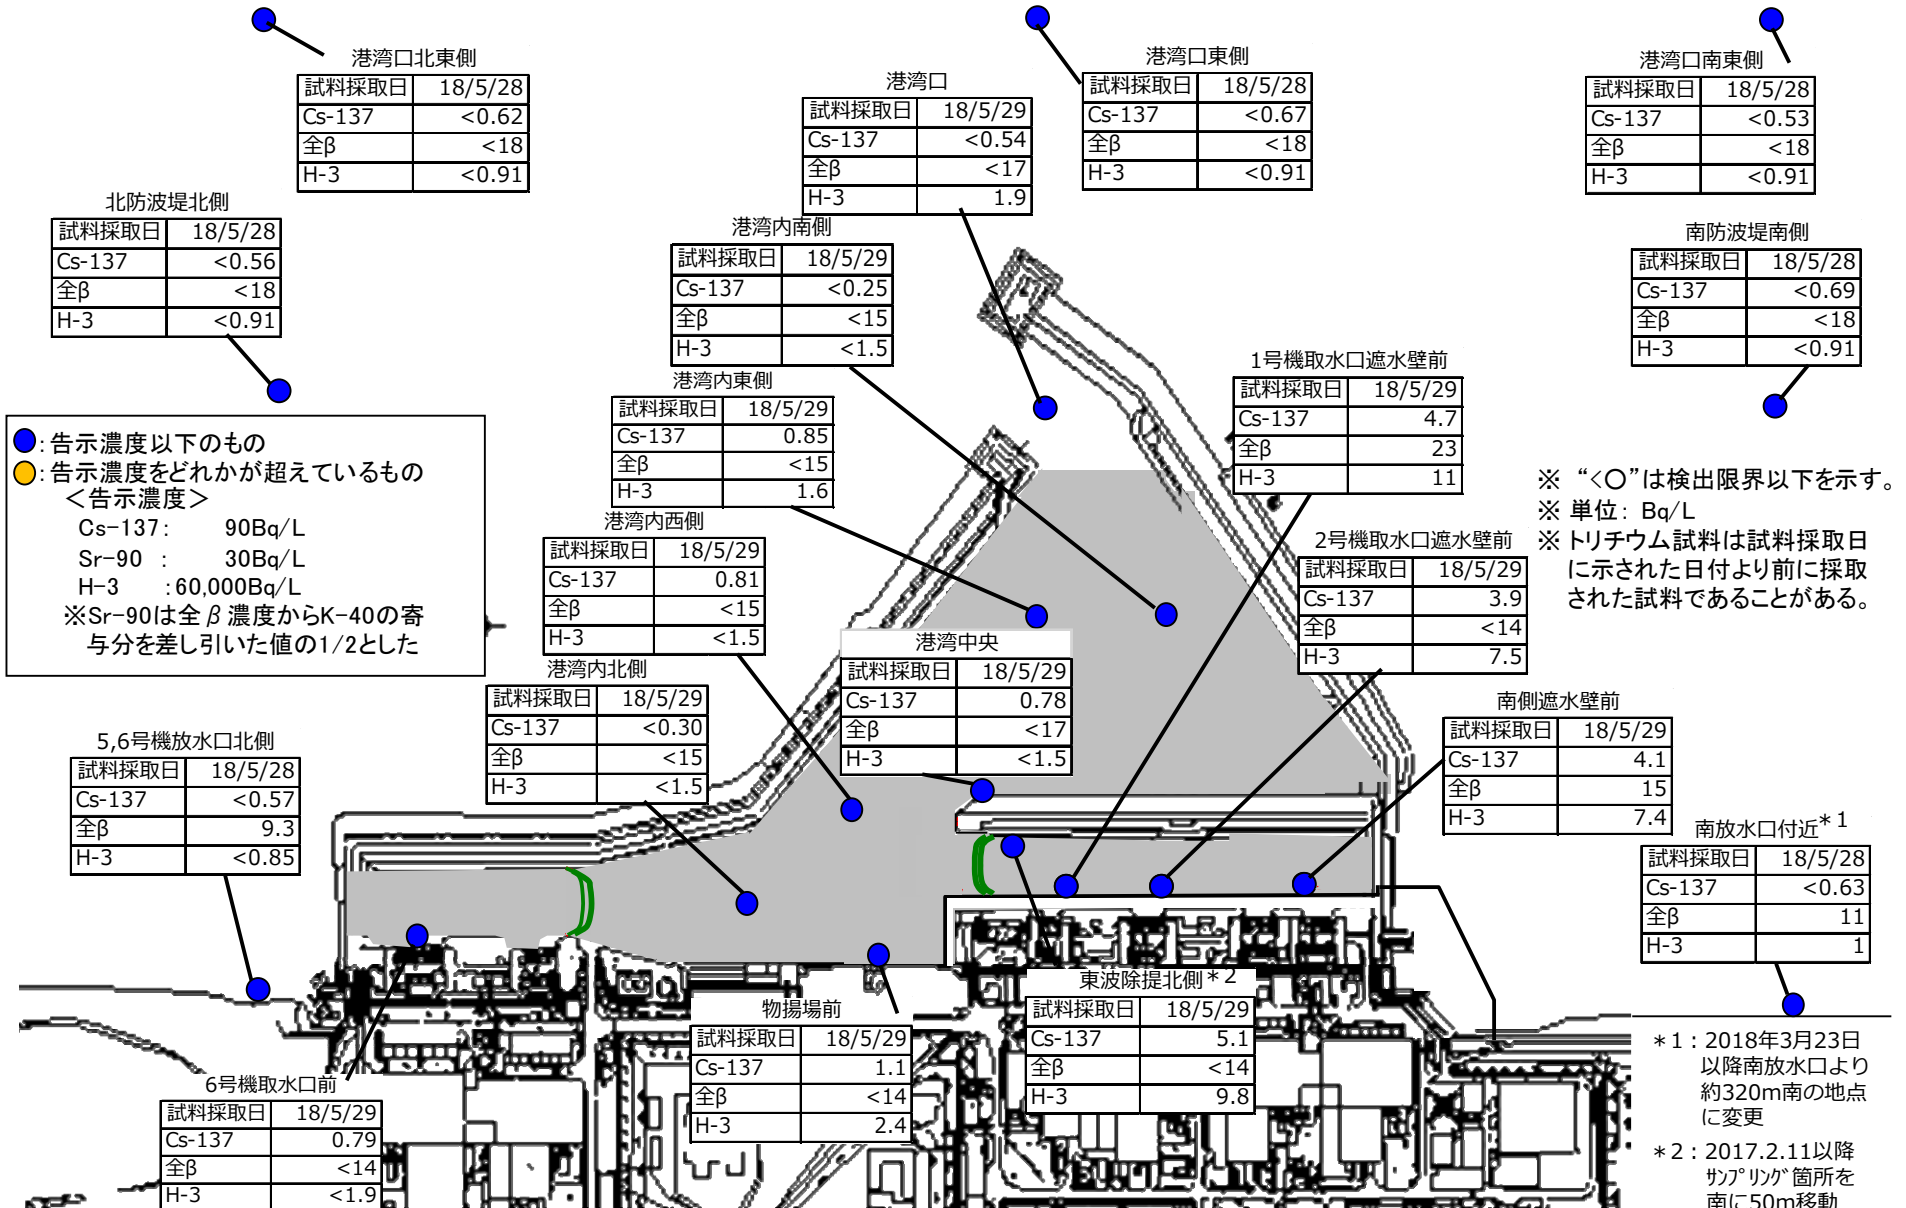

<1～4号機取水路開渠内エリア>

- 告示濃度未満で推移しているが、大雨時にCs-137濃度、Sr-90濃度の上昇が見られる。
- 海側遮水壁鋼管矢板打設・継手処理の完了後、濃度の低下が見られる。
- 位置変更のために新しいシルトフェンスを設置した2017.1.25以降、Cs-137濃度の上昇が見られる。


<港湾内エリア>

- 告示濃度未満で推移しているが、大雨時にCs-137濃度、Sr-90濃度の上昇が見られる。
- 1～4号機取水路開渠内エリアより低いレベルとなっている。
- 海側遮水壁鋼管矢板打設・継手処理の完了後、濃度の低下が見られる。


<港湾外エリア>

- 海側遮水壁鋼管矢板打設・継手処理の完了後、Cs-137濃度、Sr-90濃度の低下が見られ、告示濃度未満で推移していて変化は見られていない。

1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (1/3)

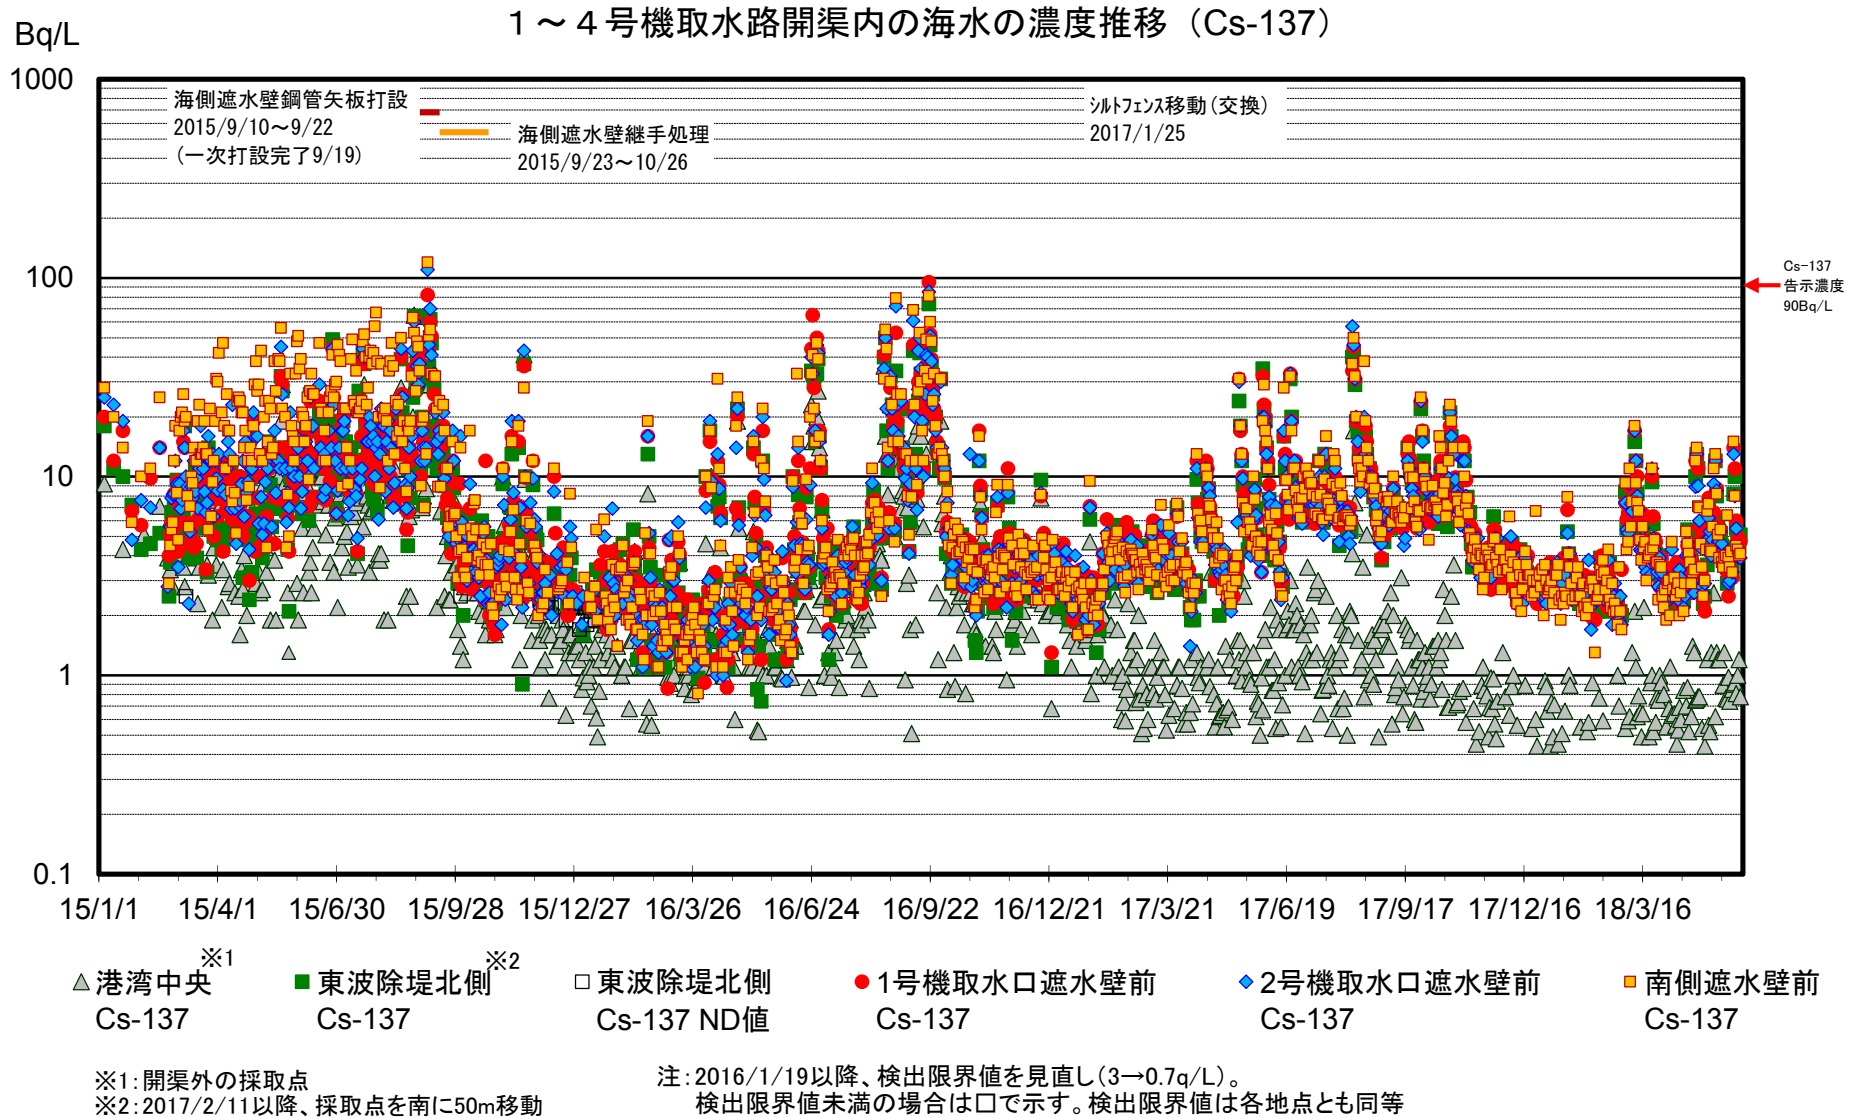

1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (2/3)

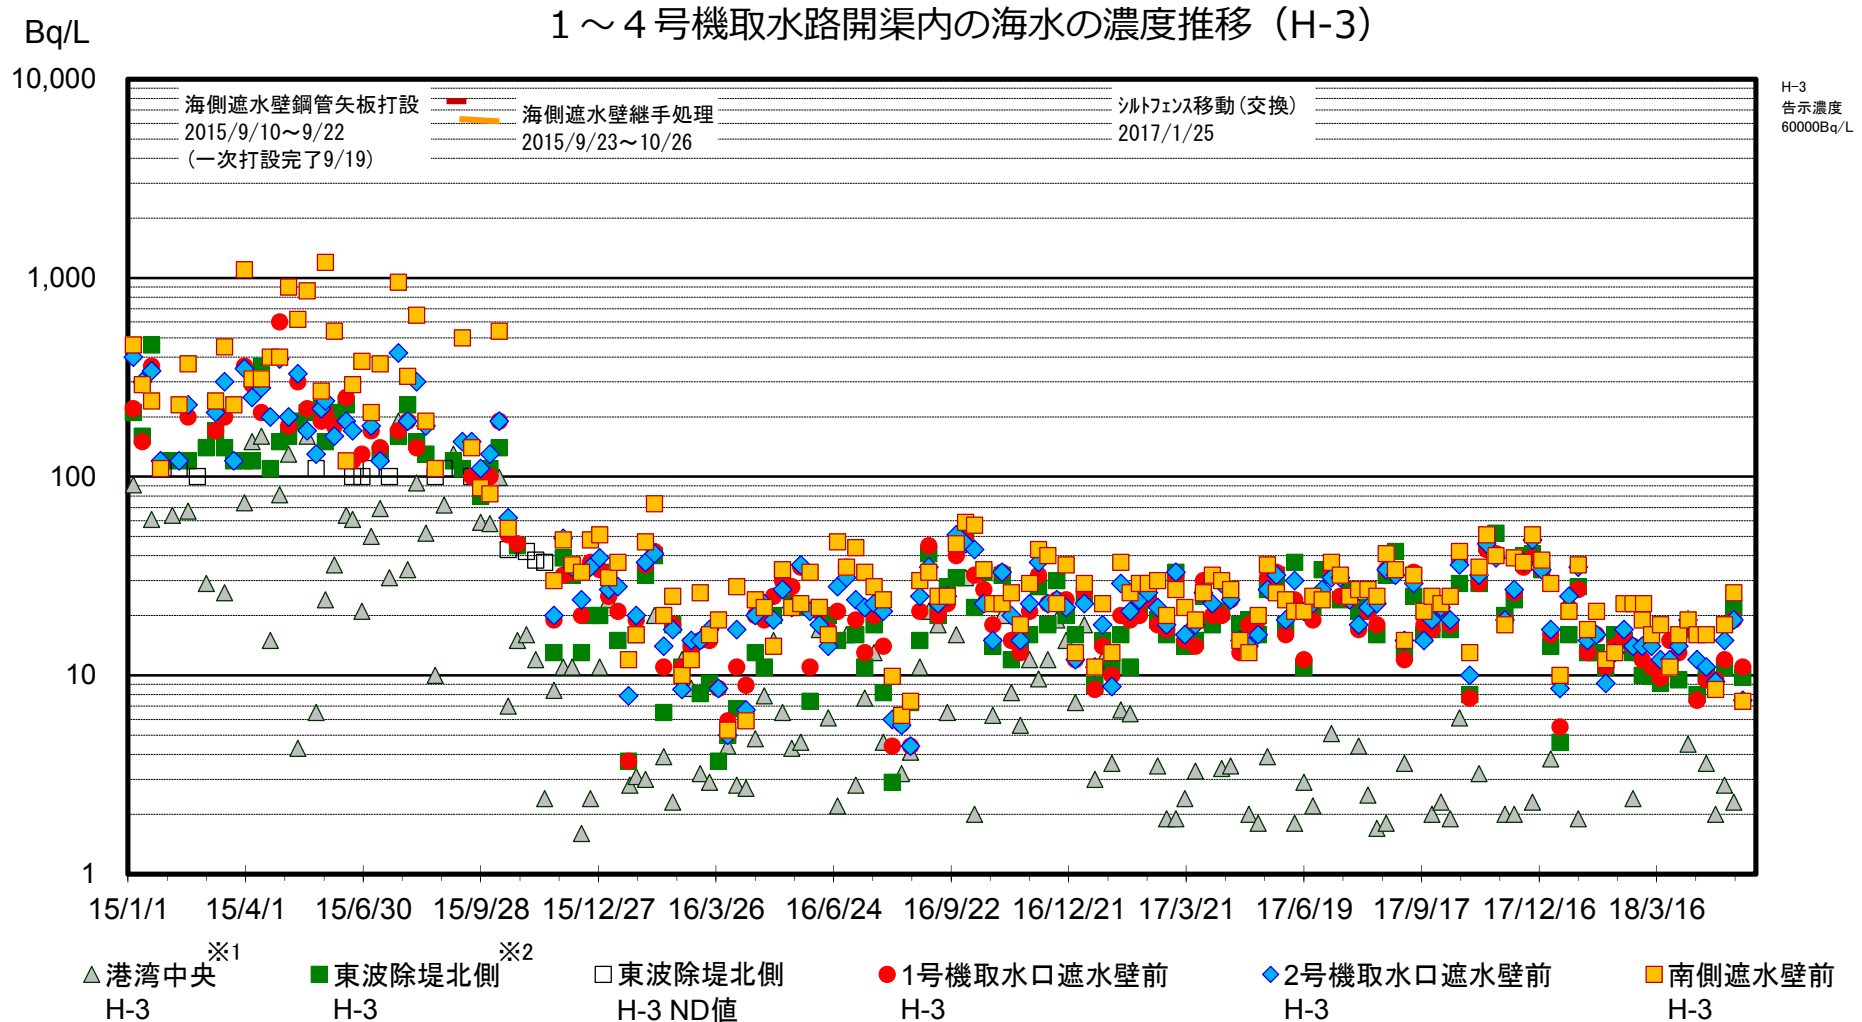


※1: 開渠外の採取点
 ※2: 2017/2/11以降、採取点を南に50m移動

注: 2015/11/23以降、検出限界値を見直し(50→3Bq/L)。
 検出限界値未満の場合は□で示す。検出限界値は各地点とも同じ。(但し、港湾中央は2Bq/L)

1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (3/3)

1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (全β、Sr-90)

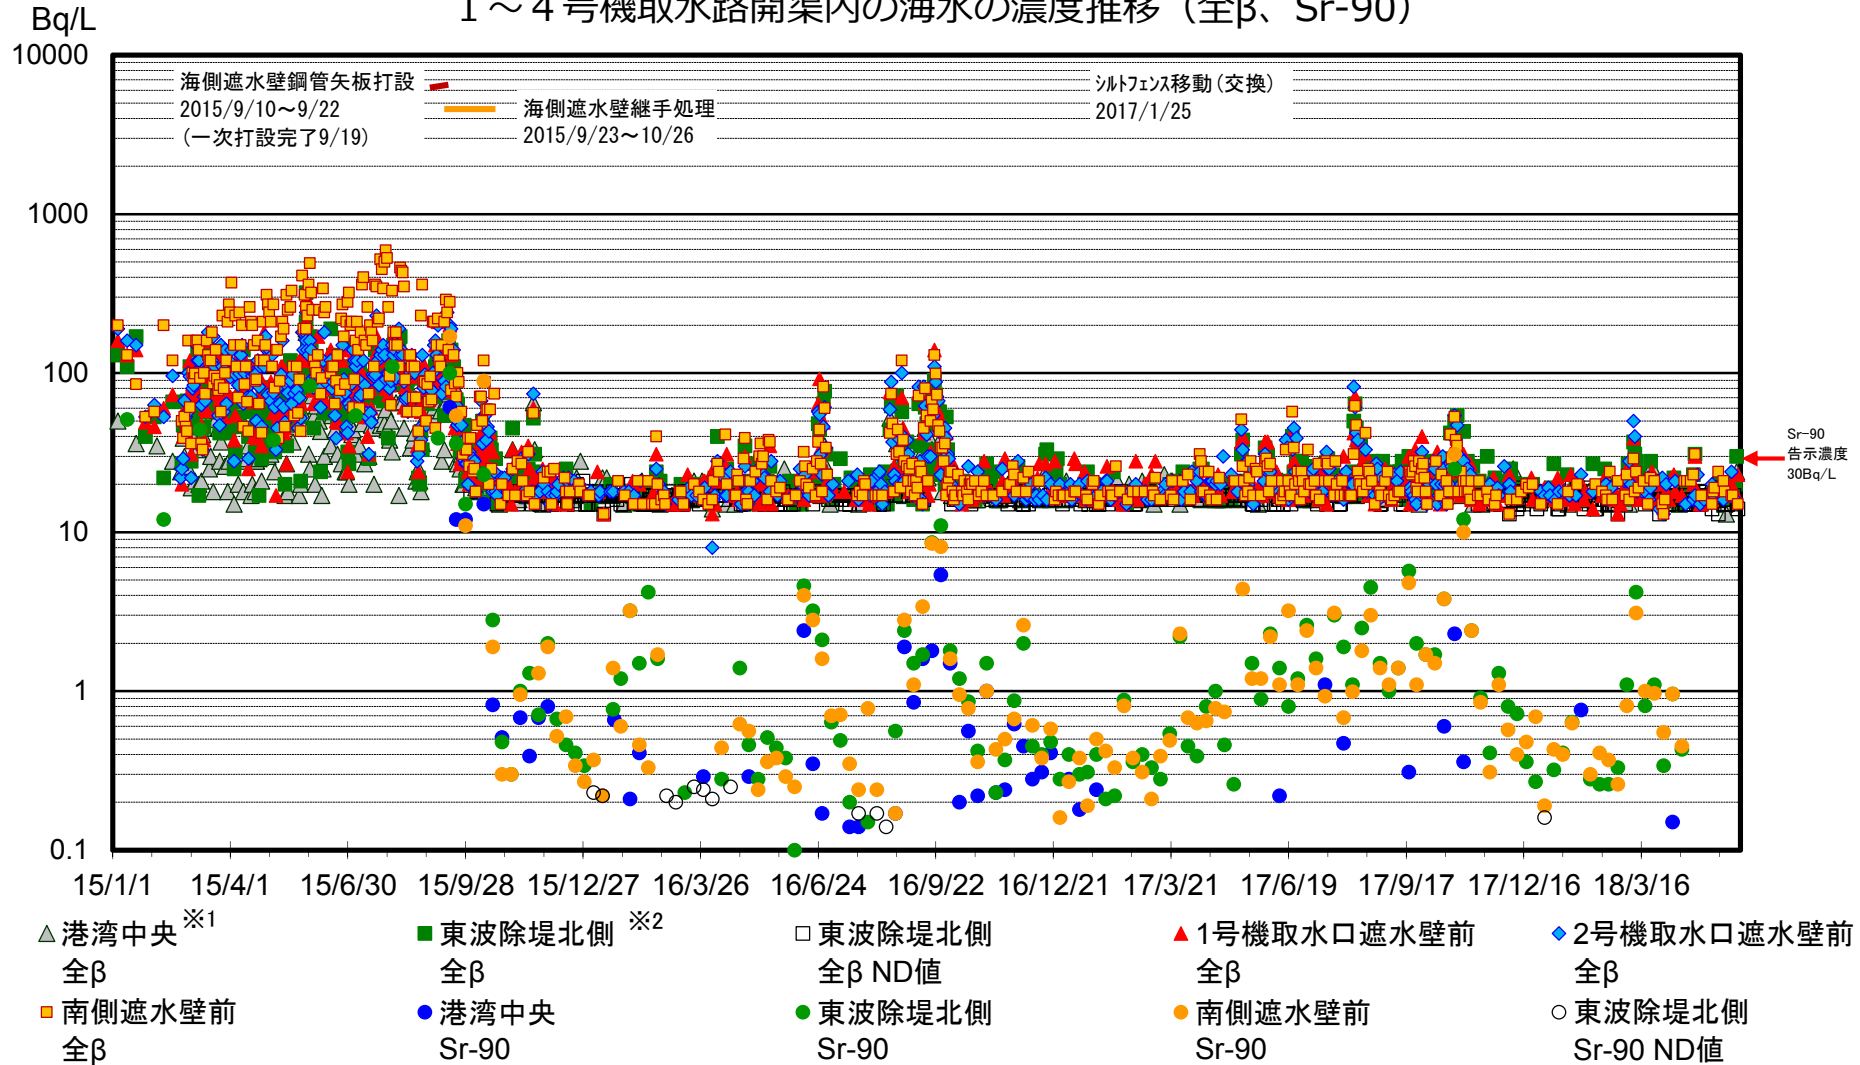


※1: 開渠外の採取点 ※2: 2017/2/11以降、採取点を南に50m移動

注: Sr-90について検出限界値未満の場合は○で示す。検出限界値は各地点とも同じ。


注: 全βは天然の放射性物質K-40(10～20Bq/L)を含む。

全βについて検出限界値未満の場合は□で示す。検出限界値は各地点とも同じ。


港湾内の海水の濃度推移 (1/3)

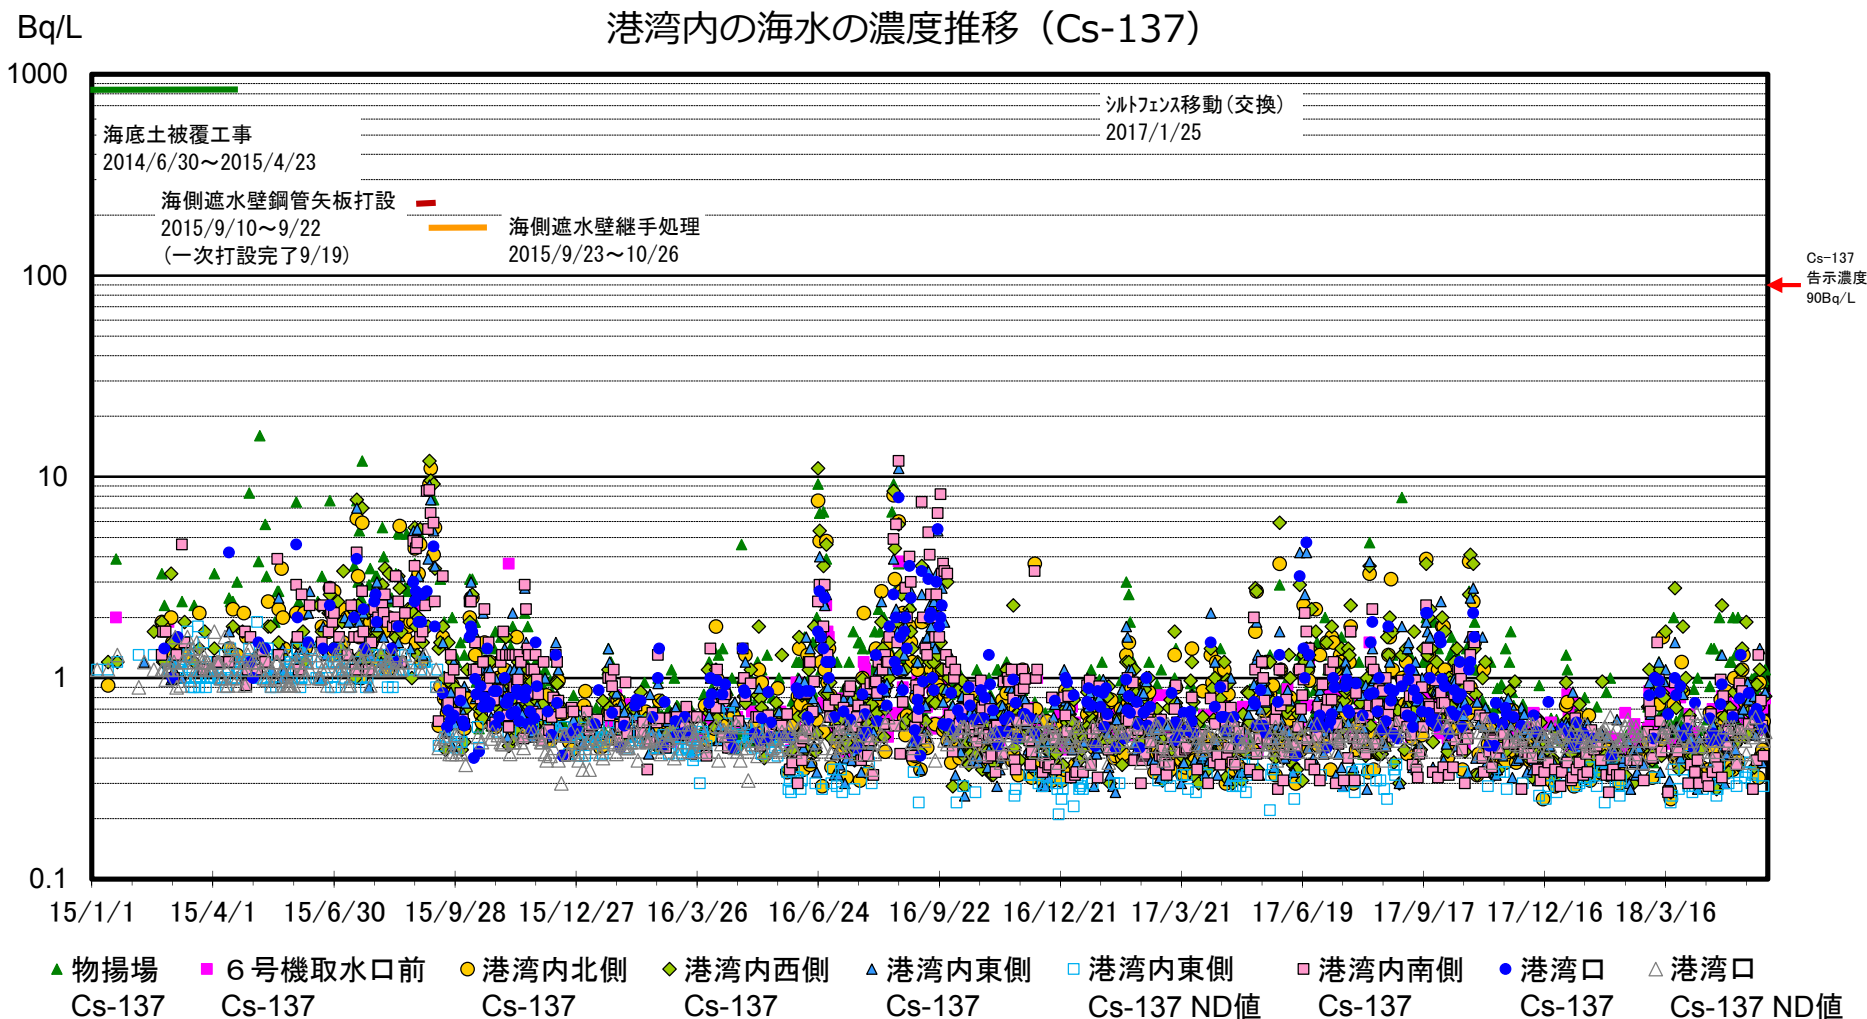

注: 2015/9/16以降、検出限界値を見直し(1.5→0.7Bq/L)。
 港湾口が検出限界値未満の場合は △ で示す。(検出限界値は物揚場、6号機取水口前も同等)
 港湾内北側・西側・東側・南側について2016/6/1以降、検出限界値を見直し(0.7→0.4Bq/L)。検出限界値未満の場合は □ で示す。

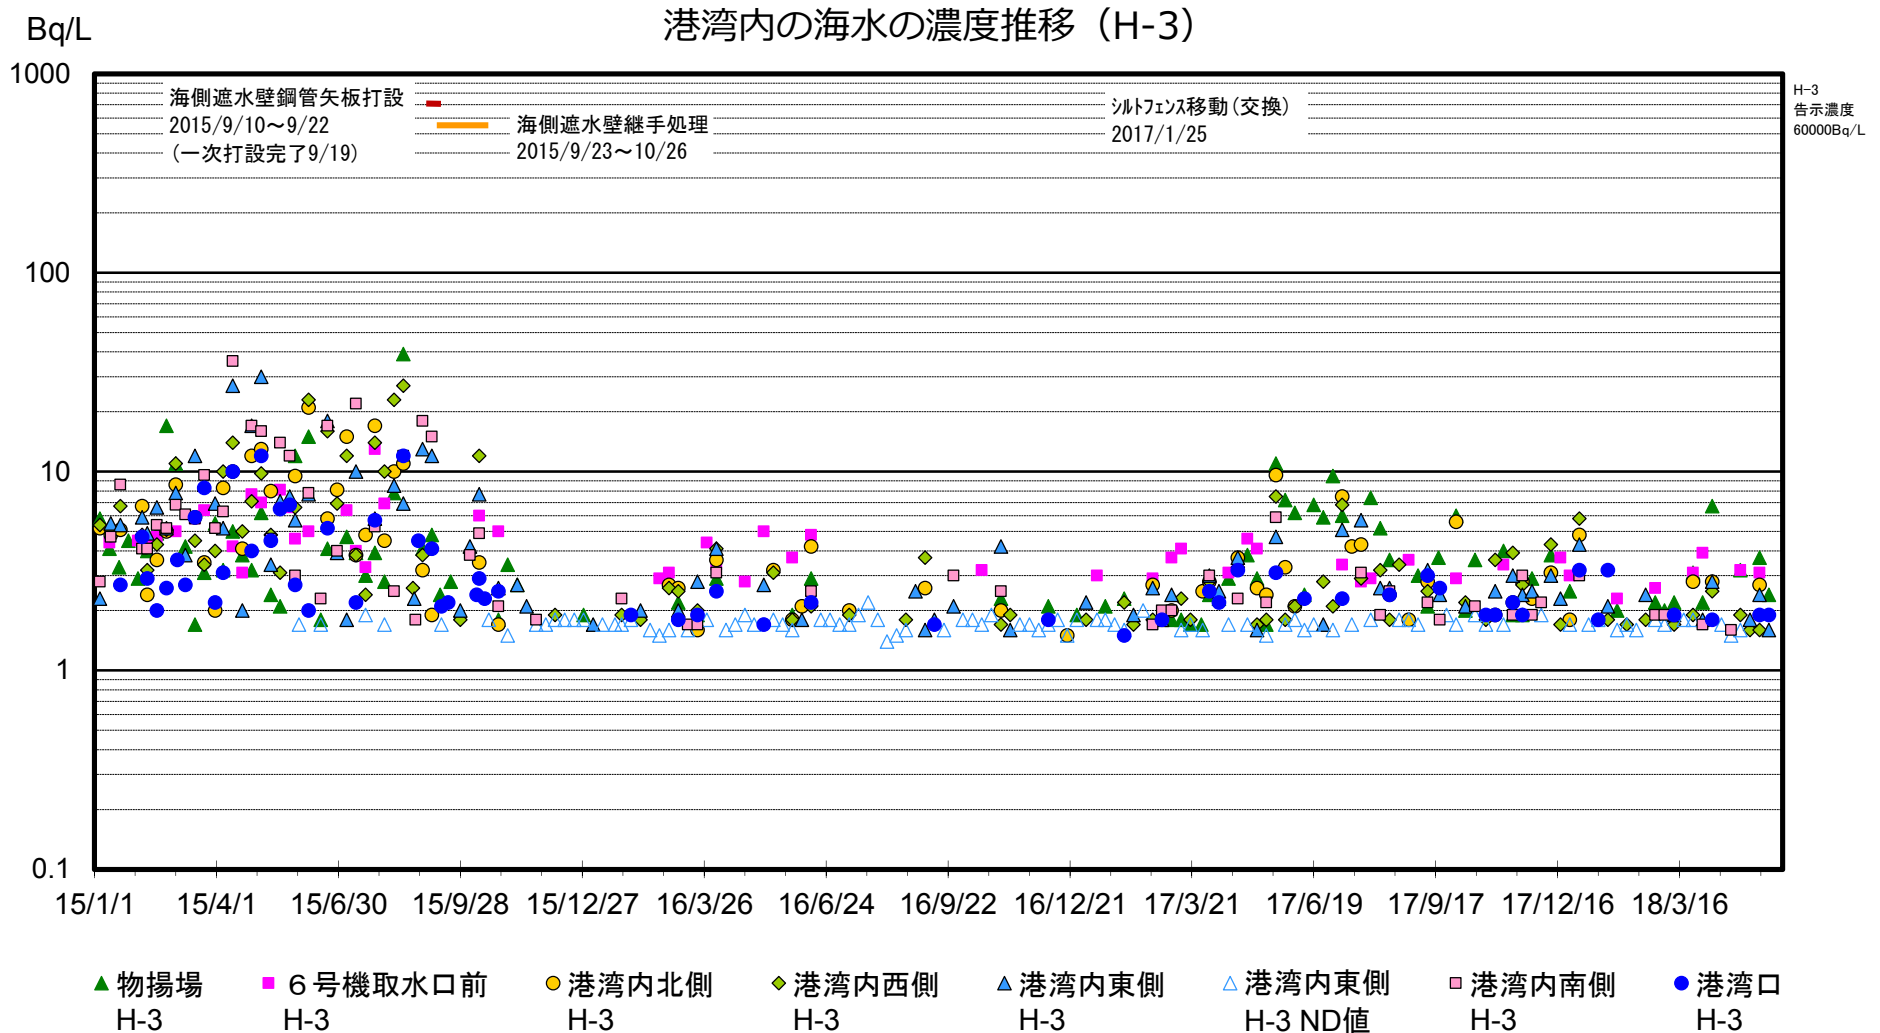


港湾内の海水の濃度推移 (3/3)

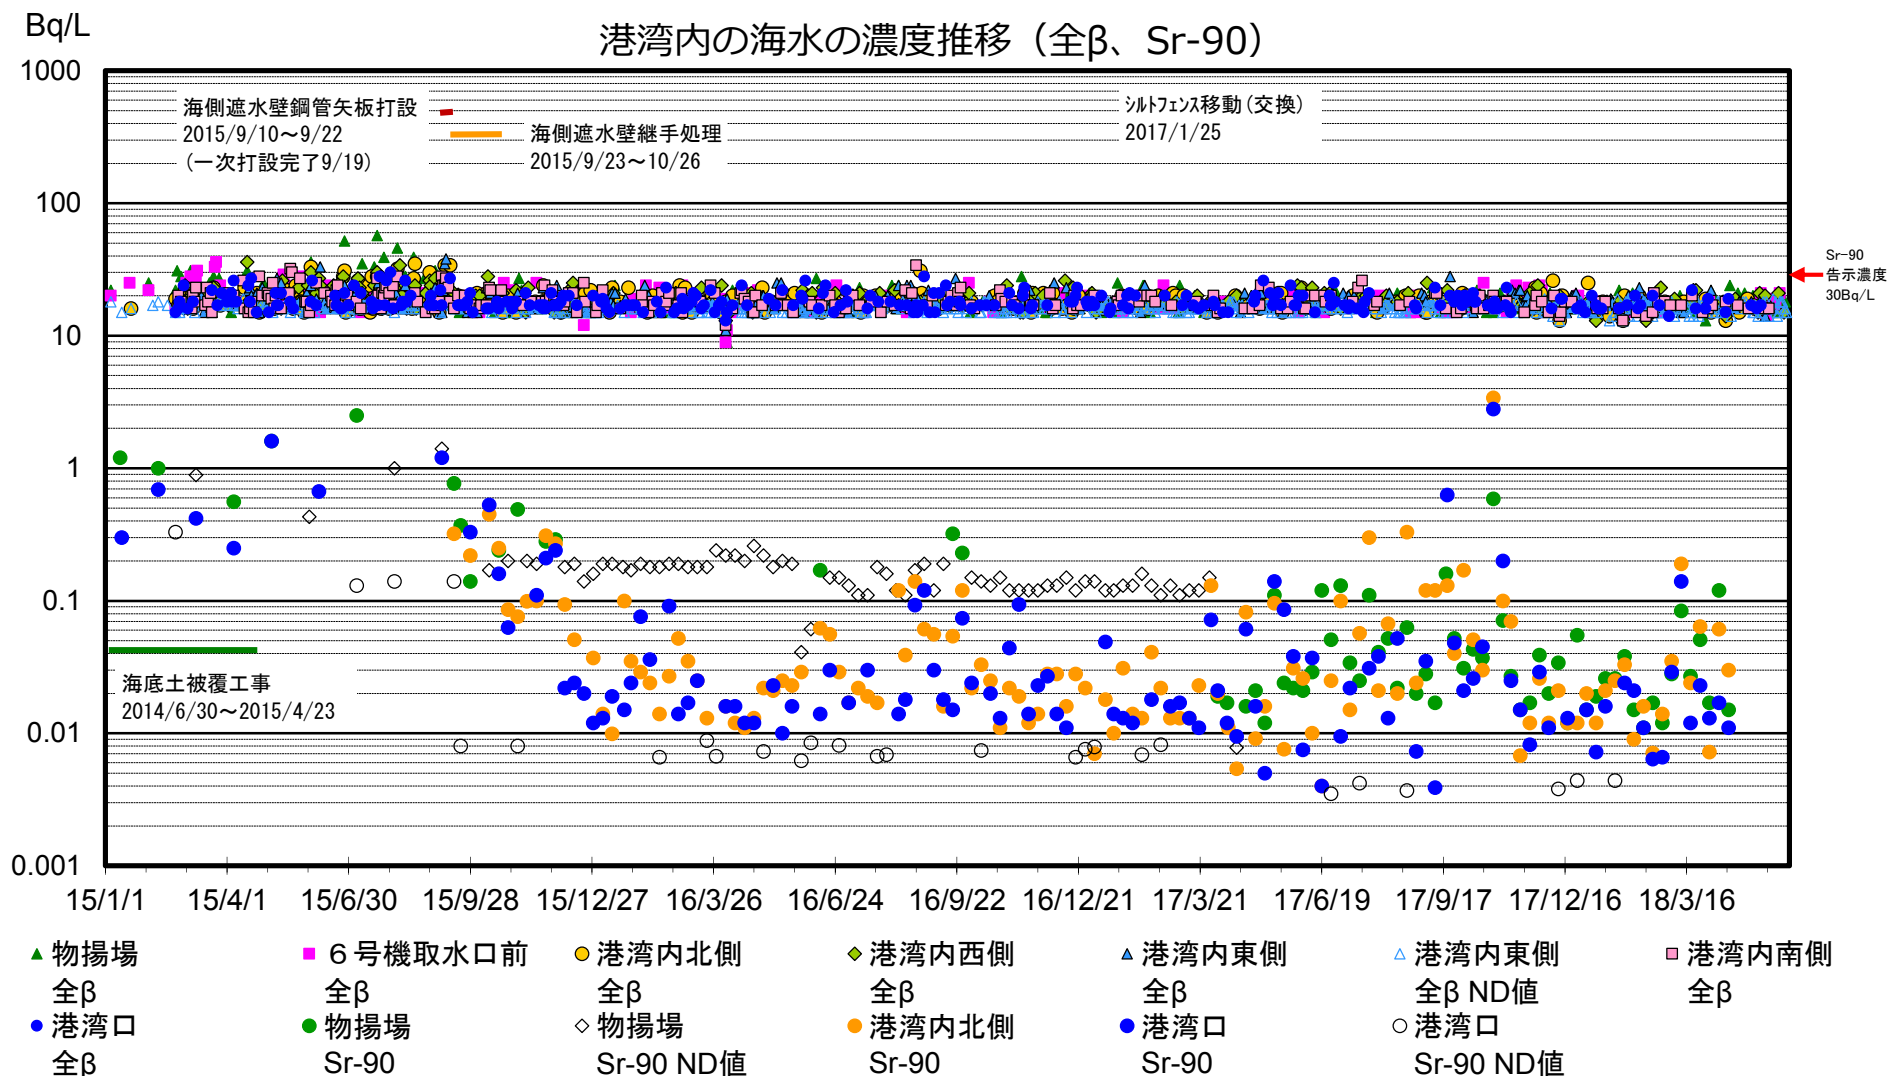

注: 全βは天然の放射性物質K-40(10~20Bq/L)を含む。全βについて、検出限界値未満の場合は△で示す(検出限界値は各地点とも同じ)。Sr-90について、物揚場が検出限界値未満の場合は◇で示す。2017/4/3以降、検出限界値を見直し(0.3→0.01Bq/L)。港湾口が検出限界値未満の場合は○で示す(検出限界値は港湾内北側も同じ)。


港湾外の海水の濃度推移 (Cs-137)

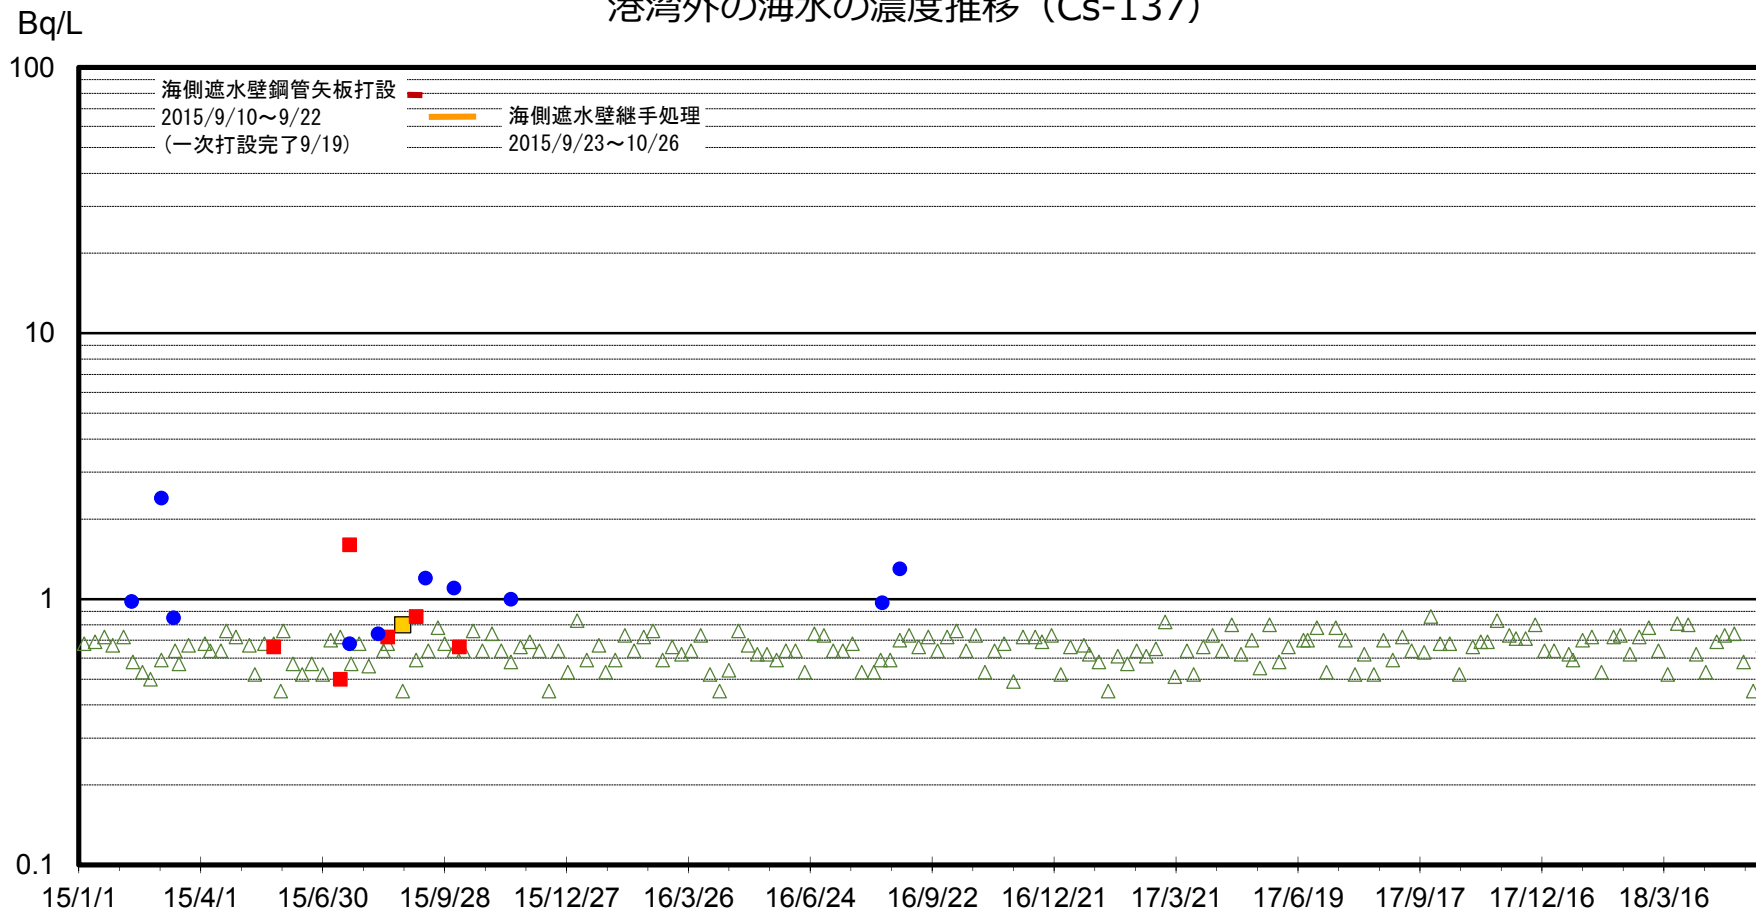

▲ 港湾口東側 Cs-137
 △ 港湾口東側 Cs-137 ND値
 ■ 港湾口北東側 Cs-137
 ■ 北防波堤北側 Cs-137
 ● 港湾口南東側 Cs-137
 ● 南防波堤南側 Cs-137
 ■ 5,6号機放水口北側 Cs-137
 ● 南放水口付近 Cs-137[※]

※: 2016/9/5以降、護岸が崩落しアクセスが困難なため採水できず。 2016/9/21以降、南放水口より約330m南の地点(従来より約1km北)に変更。
 2017/1/27以降、南放水口より約280m南の地点に変更。 2018/3/23以降、南放水口より約320m南の地点に変更。

港湾外の海水の濃度推移 (H-3)


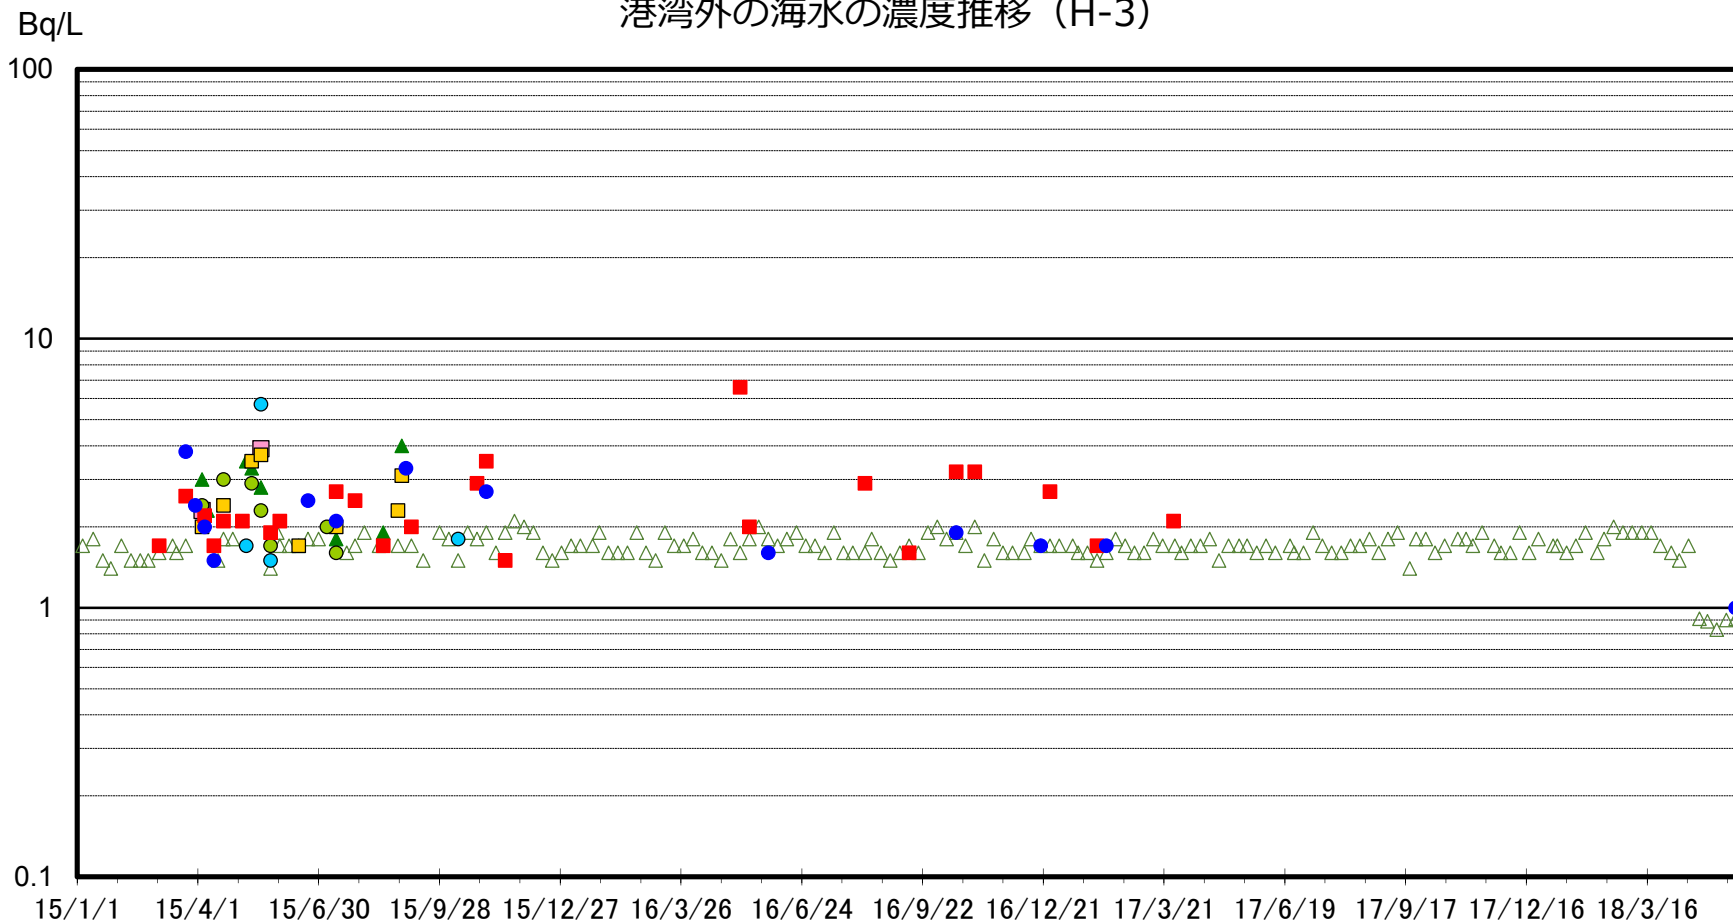


- ▲ 港湾口東側 H-3
- △ 港湾口東側 H-3 ND値
- ◻ 港湾口北東側 H-3
- ◻ 北防波堤北側 H-3
- 港湾口南東側 H-3
- 南防波堤南側 H-3
- 5,6号機放水口北側 H-3
- 南放水口付近 H-3

※: 2016/9/5以降、護岸が崩落しアクセスが困難なため採水できず。 2016/9/21以降、南放水口より約330m南の地点(従来より約1km北)に変更。
 2017/1/27以降、南放水口より約280m南の地点に変更。 2018/3/23以降、南放水口より約320m南の地点に変更。

注: 2018/4/23以降、検出限界値を見直し(2→1Bq/L)。


港湾外の海水の濃度推移 (3/3)

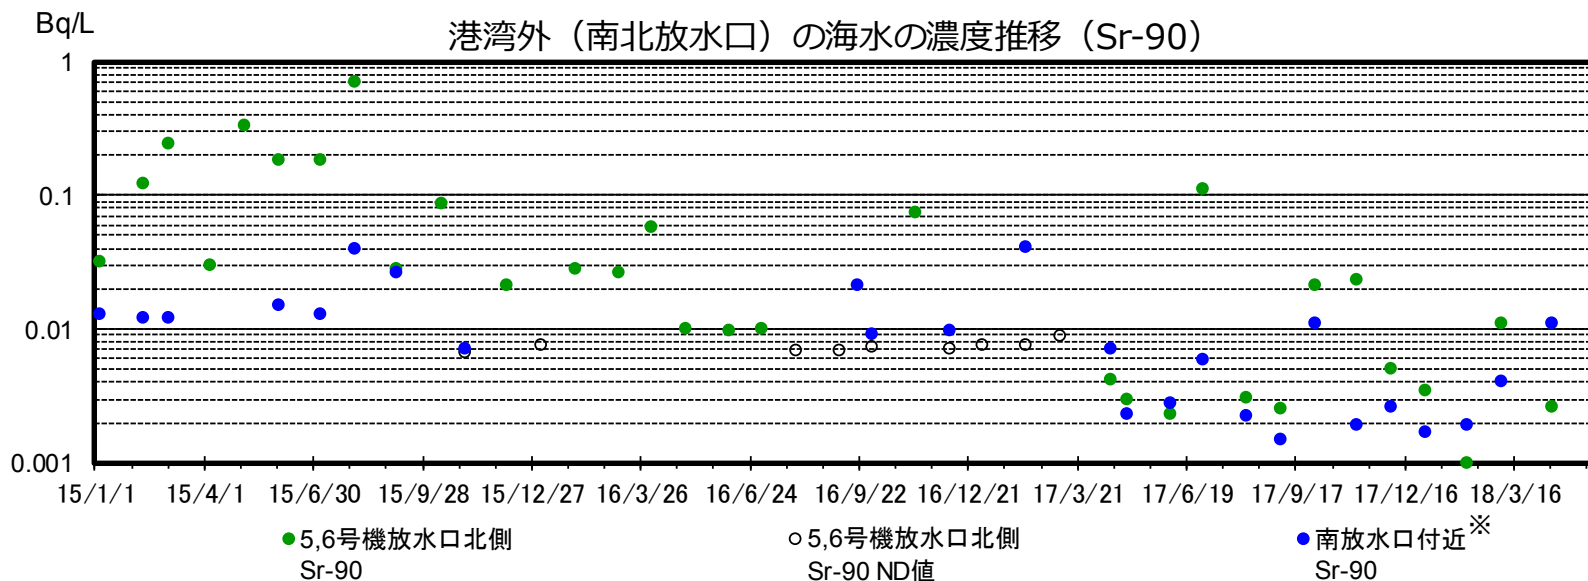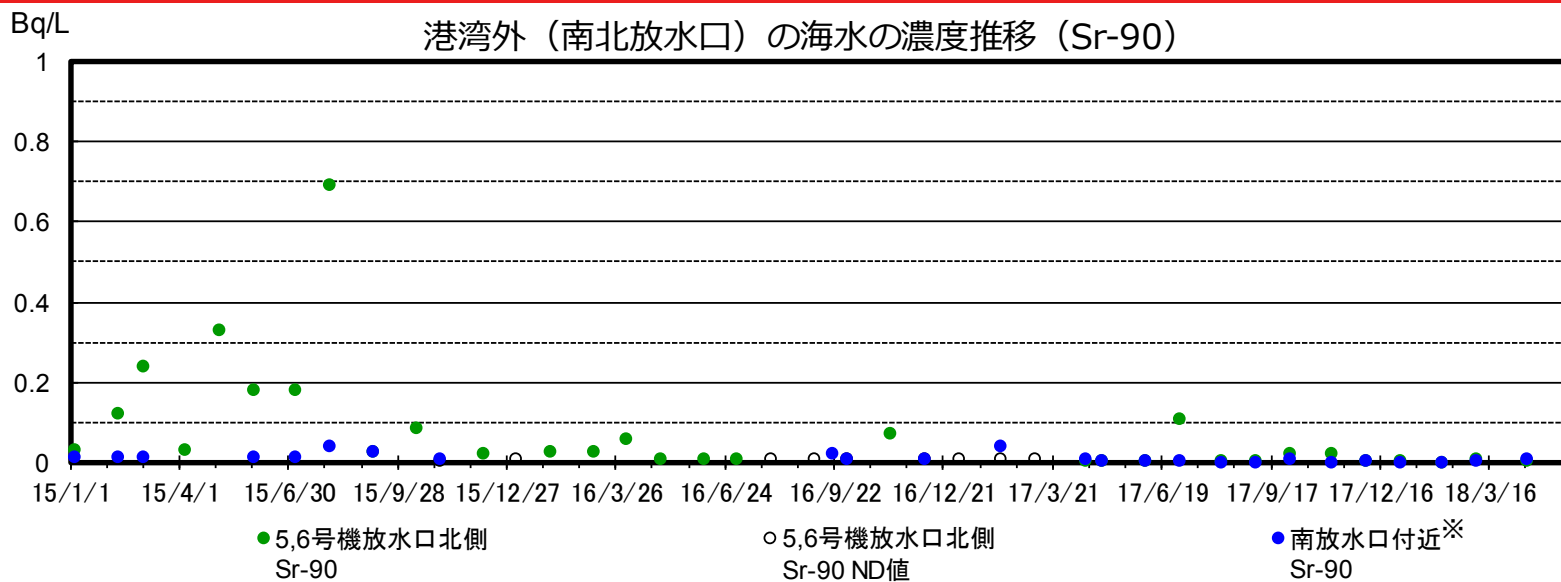

注：2017/4/17以降、検出限界値を見直し(0.01→0.001Bq/L)。
 検出限界値未満の場合は○で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

※：2016/9/5以降、護岸が崩落しアクセスが困難なため採水できず。2016/9/21以降、南放水口より約330m南の地点(従来より約1km北)に変更。2017/1/27以降、南放水口より約280m南の地点に変更。2018/3/23以降、南放水口より約320m南の地点に変更。

<参考> 港湾口海水モニタの測定結果

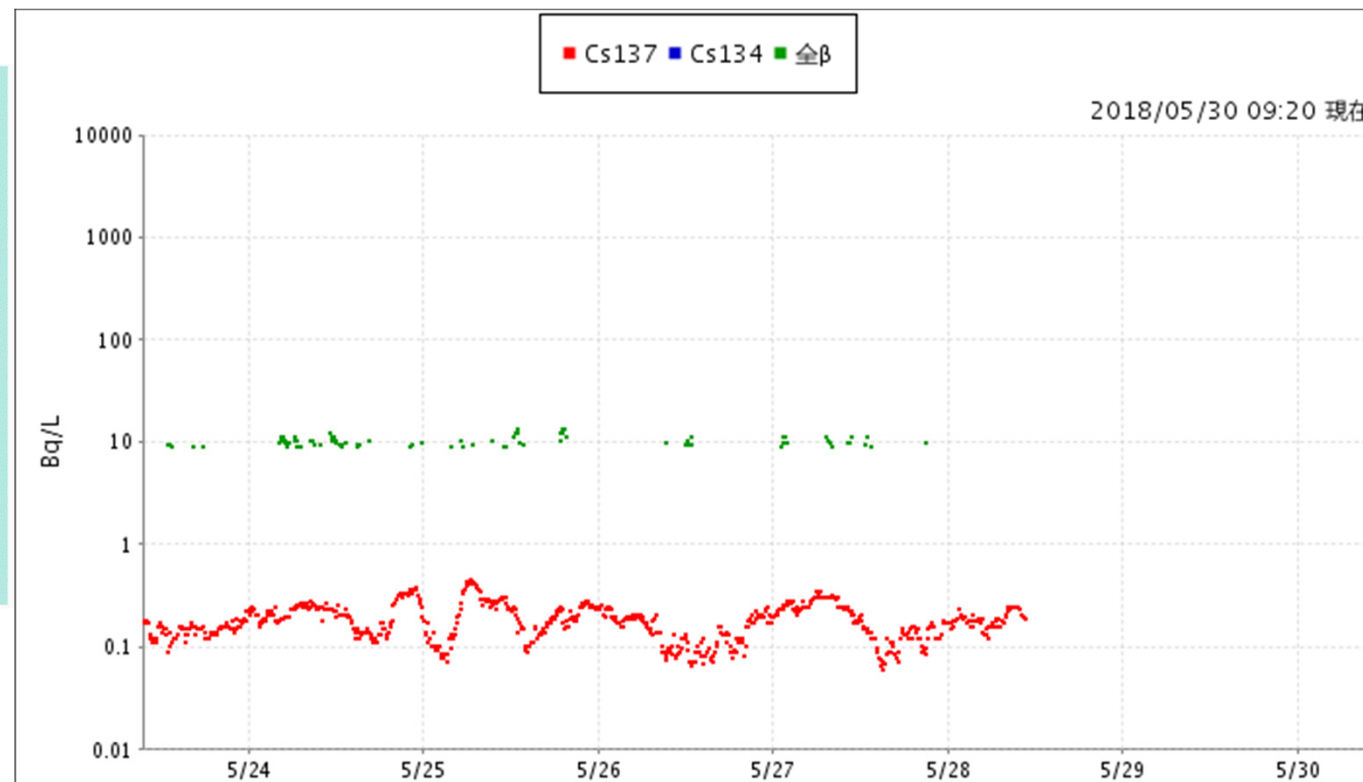

※検出限界値未満 (ND) の場合は、グラフにデータが表示されません。
(検出限界値)

- ・セシウム (Cs)134 : 0.02 Bq/L
- ・セシウム (Cs)137 : 0.05 Bq/L
- ・全β : 8.7 Bq/L

※海水放射線モニタは、荒天により海上が荒れた場合、巻き上がった海底砂の影響等により、データが変動する場合があります。

※参考 「福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則」に定める告示濃度限度は、以下の通り。

- ・セシウム (Cs)134 : 60 Bq/L
- ・セシウム (Cs)137 : 90 Bq/L

- 設備の不具合および清掃・点検保守作業等により、データが欠測する場合があります。
- 2018年5月28日10時48分より、紫外線殺菌装置の設備不具合によりデータが欠測しております。

排水路の濃度低減対策について


2018年5月31日

TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

1. 排水路位置図

事務局会議18/3/29情報追記

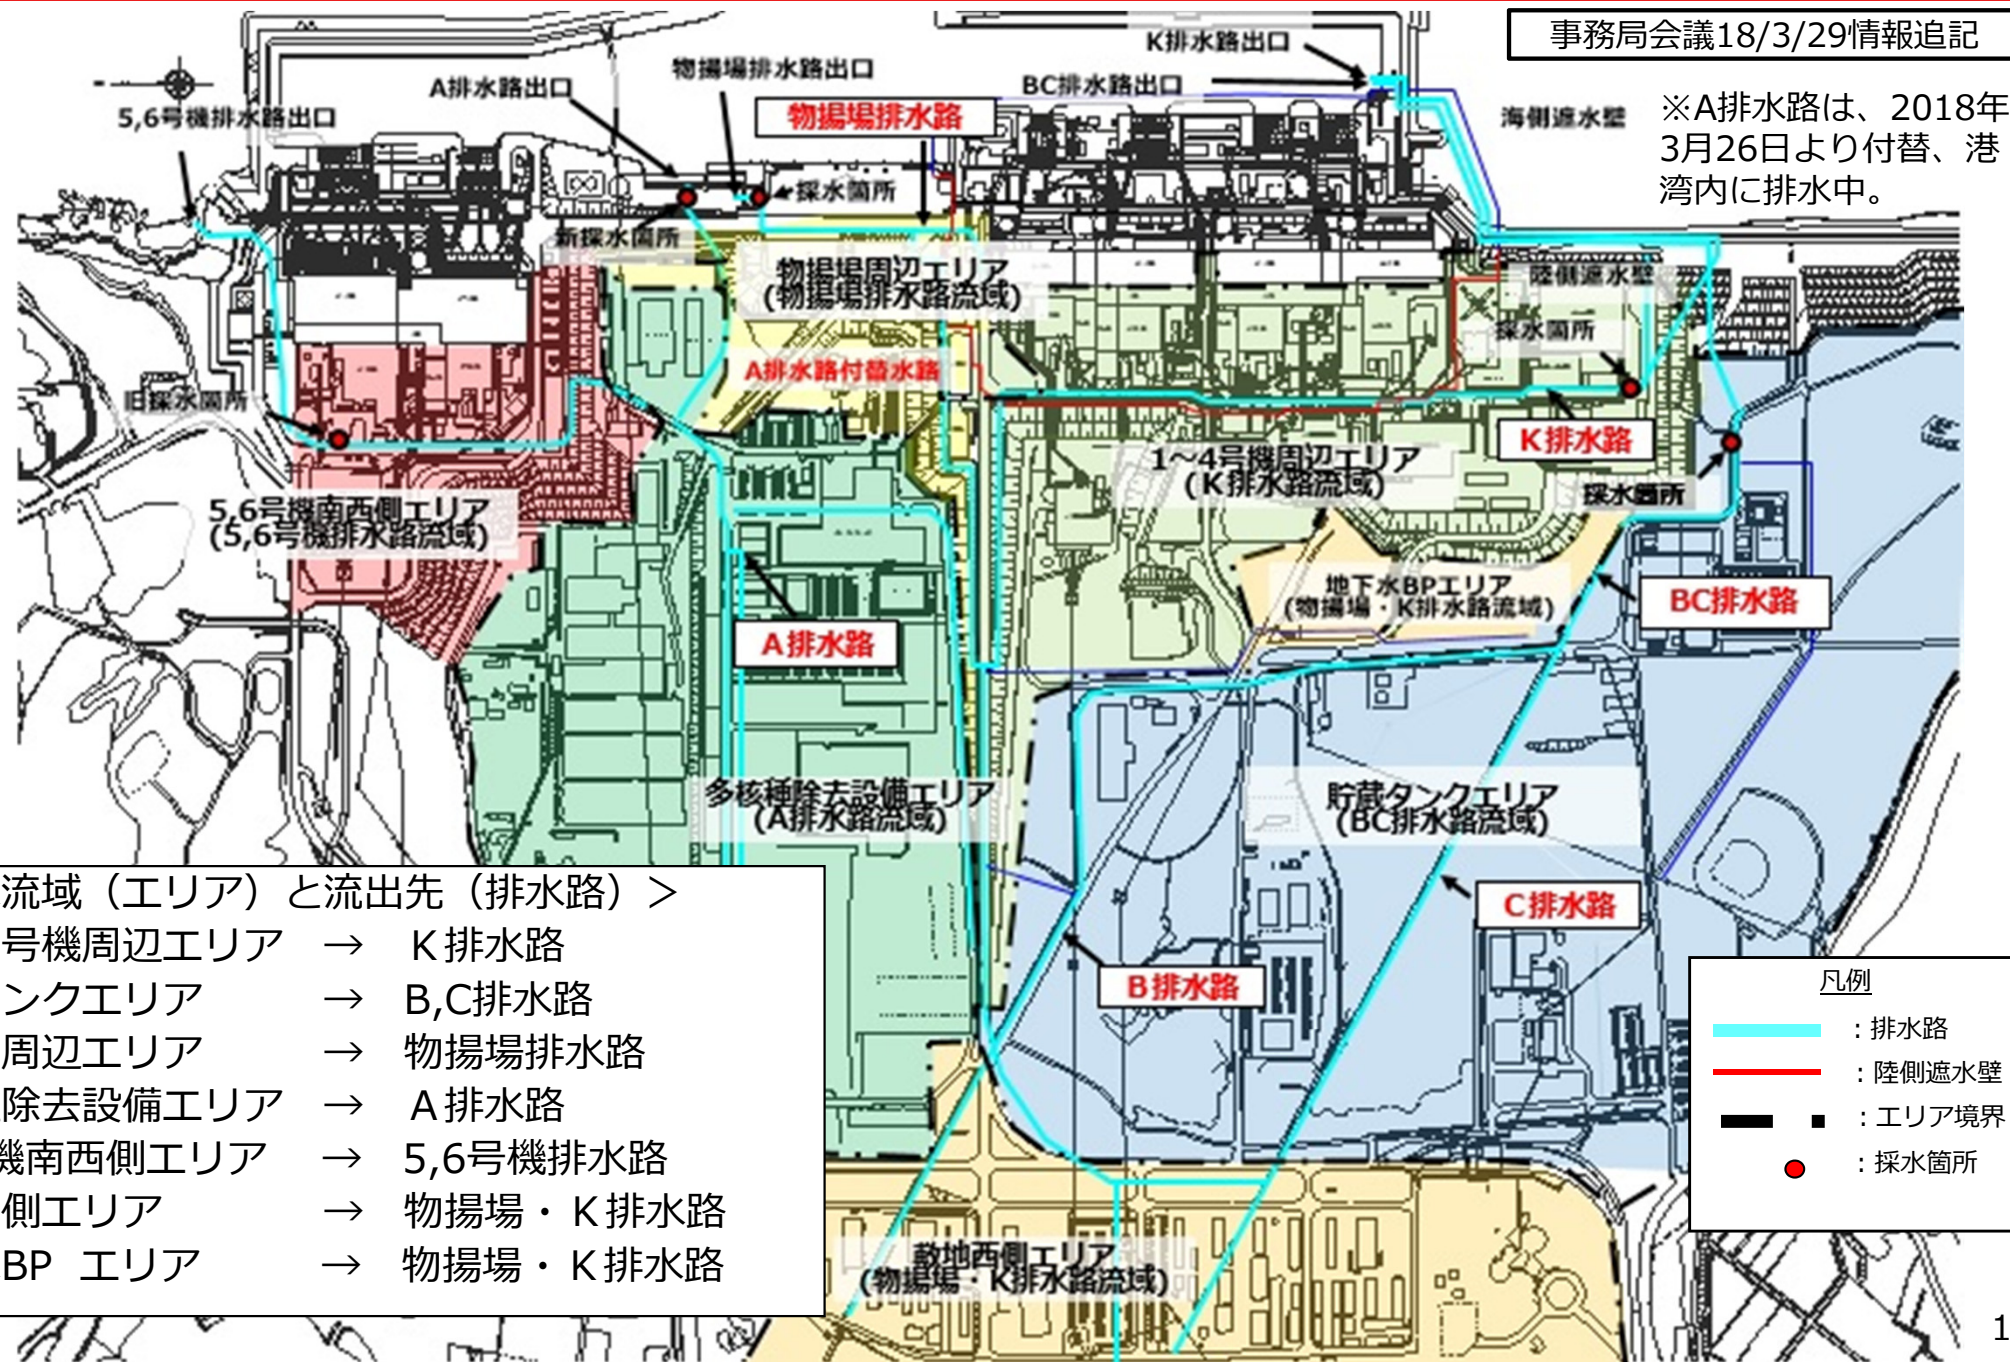


| ＜集水流域（エリア）と流出先（排水路）＞ | |
|----------------------|------------|
| 1～4号機周辺エリア | → K排水路 |
| 貯蔵タンクエリア | → B,C排水路 |
| 物揚場周辺エリア | → 物揚場排水路 |
| 多核種除去設備エリア | → A排水路 |
| 5,6号機南西側エリア | → 5,6号機排水路 |
| 敷地西側エリア | → 物揚場・K排水路 |
| 地下水BP エリア | → 物揚場・K排水路 |

| 凡例 | |
|----|---------|
| | : 排水路 |
| | : 陸側遮水壁 |
| | : エリア境界 |
| | : 採水箇所 |

2-1. K排水路濃度低減対策（流域の分類による対策） **TEPCO**

- K排水路の対策は3分類のエリア毎に性状に応じた重層的な対策を実施中

| 場所 | 調査結果 | | 対策 | |
|-------|----------------|---------------------------|-------------|----------------|
| | Cs性状 | 排水の汚染状況 | 目的 | 方法 |
| ①屋根面 | イオン状Cs (多) | ガレキ等から イオン状Csが溶出 | 汚染を取り除く | 敷砂等撤去 |
| | | | 雨水を近づけない | 汚染源の隔離（フェーシング） |
| | | | 排水中のCsを取り除く | 浄化材設置 |
| ②建屋周辺 | イオン状Cs (半分) | Csを吸着した土壌等から イオン状Csが溶出 | 雨水を近づけない | 路盤整備（フェーシング） |
| | | | 排水中のCsを取り除く | 浄化材設置 |
| | 粒子状Cs (半分) | Csを吸着した土粒子が 混入して流出 | 汚染を取り除く | 排水路清掃 |
| | | | 排水中のCsを取り除く | 浄化材設置 |
| ③法面 | 粒子状Cs (少) | フェーシングにより 汚染は低減 | 汚染を取り除く | 道路・排水路清掃 |
| | | | 雨水を近づけない | フェーシング |

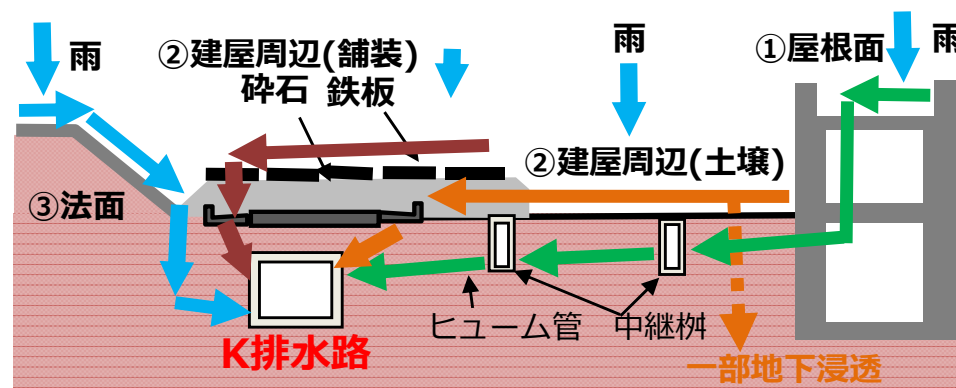


2-2. K排水路濃度低減対策実施状況 (①屋根面)

事務局会議18/3/1追記

【凡例】

- 汚染源除去・浄化対策済箇所
- 陸側遮水壁

R/B : 原子炉建屋
 T/B : タービン建屋
 Rw/B : 廃棄物処理建屋

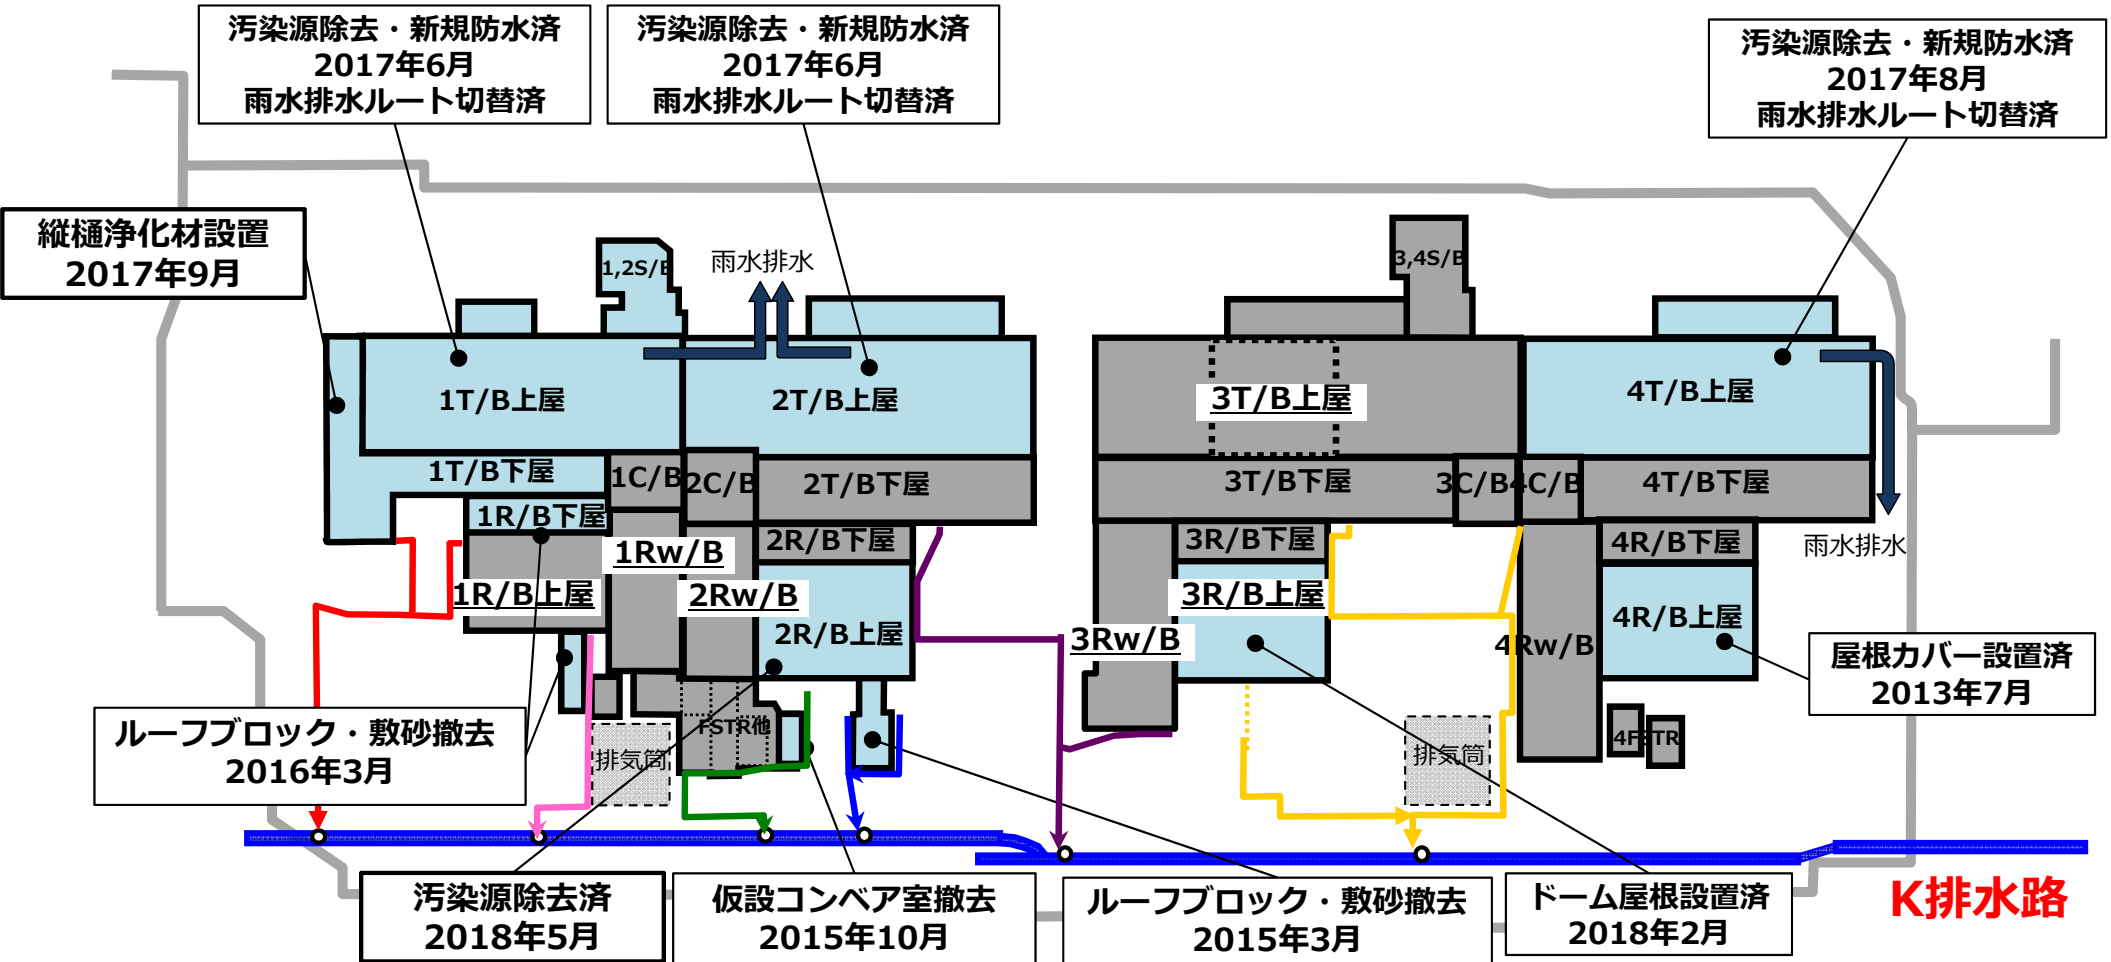


2-2-1. 1, 2, 4号機T/B建屋上屋の対策状況

- 屋上面の汚染低減対策後に屋根雨水の水質調査を実施し,対策の効果を確認した。
- 1,2,4号機T/B建屋上屋屋根面の雨水の水質は,本設防水により大幅に改善された。

| 建屋 | Cs-137雨水分析結果 (単位: Bq/L) | | | | 排水ルート切替日 |
|--------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| | 対策前 | 対策後 | | | |
| 1号機T/B | 980~2,700 (14/11/26) | 180 (17/10/13) | 320 (18/3/1) | 250 (18/4/25) | 17/6/30 (建屋周辺地面に浸透) |
| 2号機T/B | 420~10,000 (14/12/1) | 89 (17/10/13) | 370 (18/3/1) | 48 (18/4/25) | 17/6/19 (建屋周辺地面に浸透) |
| 4号機T/B | 1,600 (14/6/12) | 56 (17/6/19) | 290 (18/3/1) | 42 (18/4/25) | 17/8/3 (建屋周辺地面に浸透) |

【施工前】4号機T/B屋




【現況】4号機T/B屋上 (本設防水完了)



2-2-2. 2号機R/B屋根対策 (1/2)

- 2号機R/B建屋上のルーフブロック等の屋根保護層撤去を実施し，屋上の汚染物の撤去を実施する。
- 主な工事内容は以下の通り
2号機R/B建屋の屋根保護層撤去（2018年5月11日完了）
（ルーフブロックの撤去・敷砂の撤去）

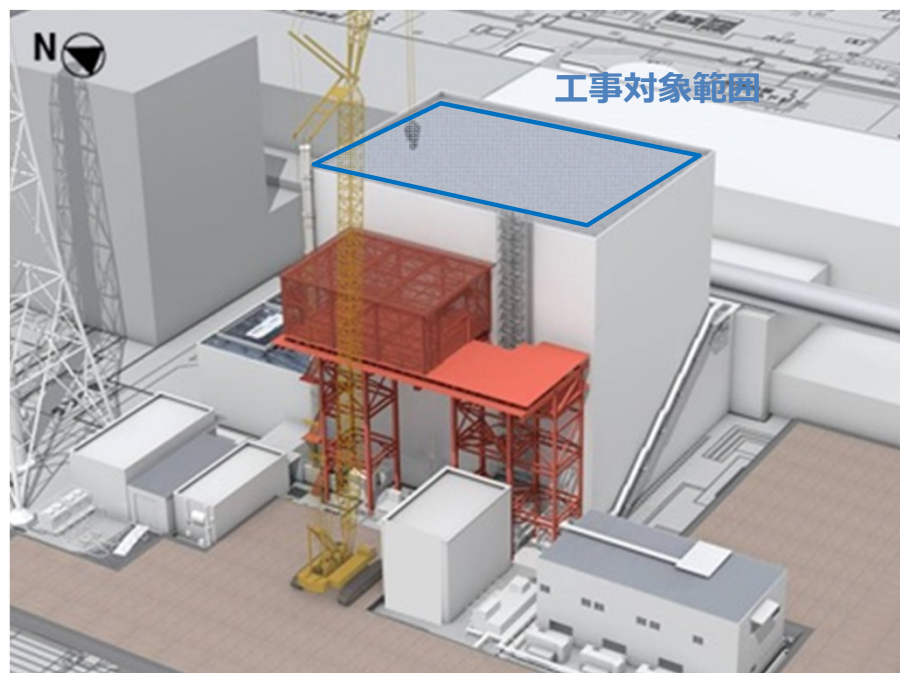

工事箇所

2-2-2. 2号機R/B屋根対策 (2/2) 作業状況


- 2号機R/B屋根対策の作業状況



①作業前状況



②遠隔重機によるルーフブロック・砂撤去状況

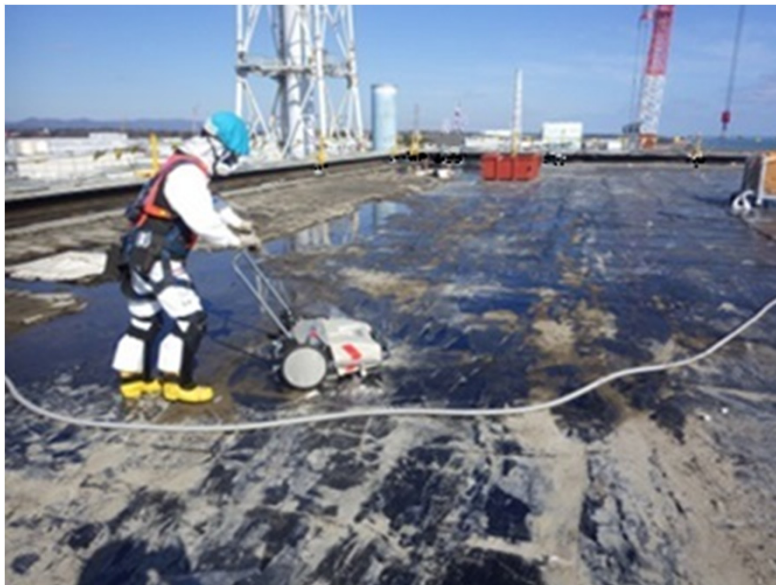

③屋上残砂清掃状況



④作業完了状況

2-2-3. 1～3号機T/B建屋下屋浄化材設置 (1/2)

事務局会議17/11/30より

- 高線量かつ重機アクセスが困難であり、汚染源除去の早期実施が難しいR/B, T/B下屋の雨水対策として、2017年に雨樋の調査を実施。
- 各号機にて、雨水の調査（セシウム濃度および流量）を実施するとともに、1号機に試験的に浄化装置設置を行い、効果を確認した。

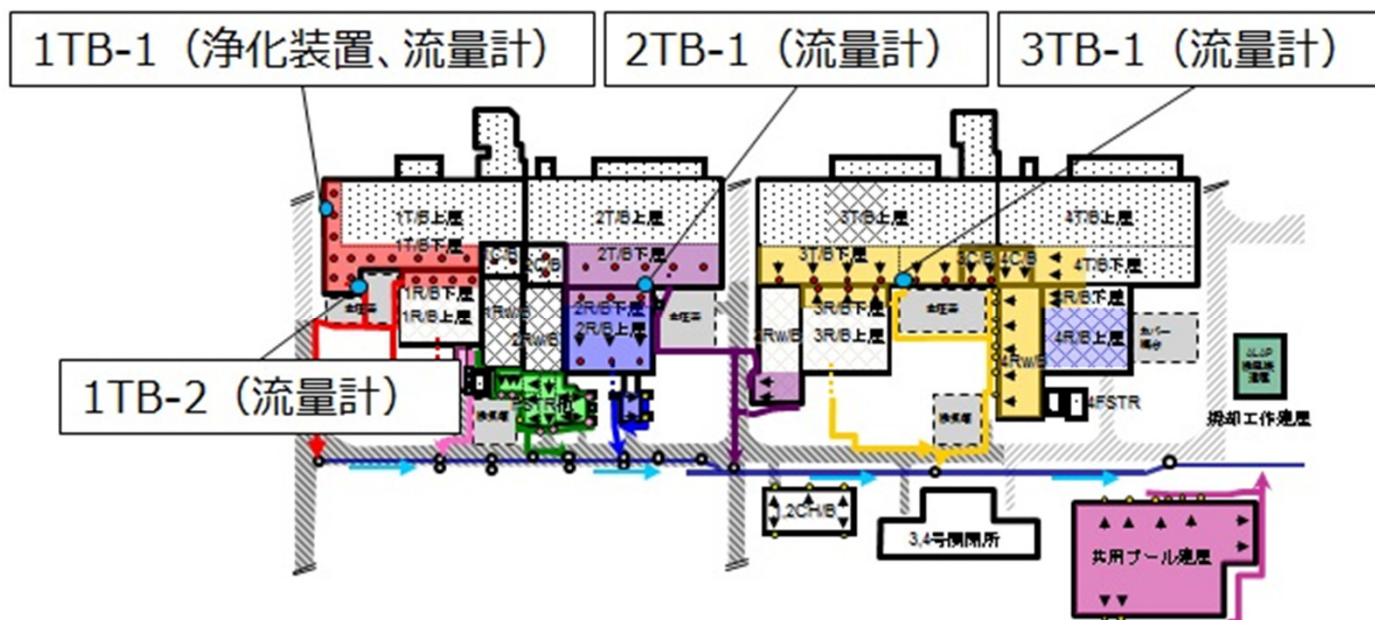


図1 雨樋調査位置図

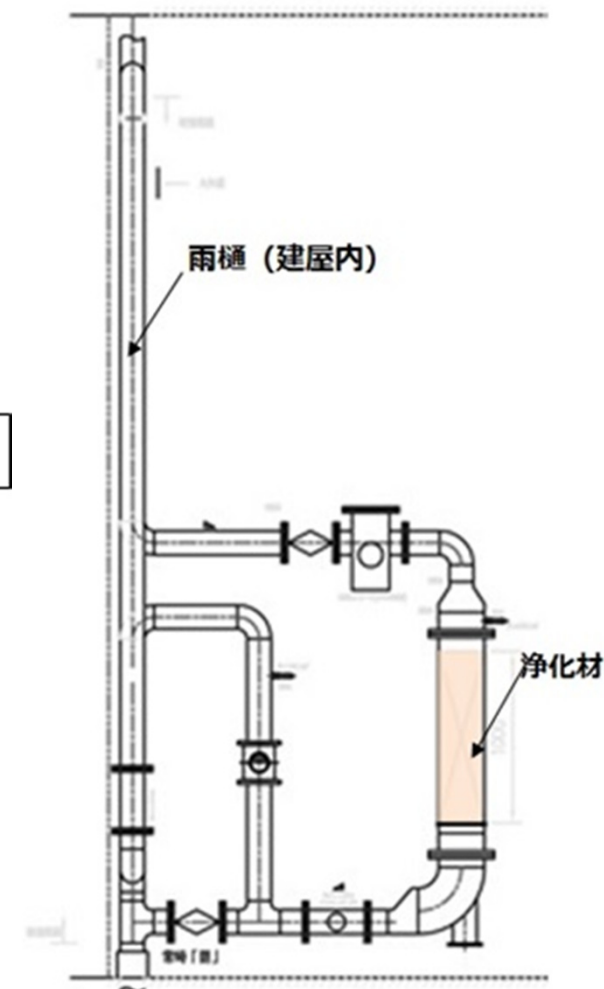


図2 雨水浄化装置 (イメージ図)

2-2-3. 1～3号機T/B建屋下屋浄化材設置（2/2）調査結果



事務局会議17/11/30より

- セシウム137濃度の高いタービン建屋下屋の雨樋に設置した浄化装置通過前後で採水，分析を行ったところ，浄化材通過後のセシウム137濃度は1/18～1/100に低下しており，想定していた1/10を上回る効果が確認された。
- 浄化材の表面線量率も通水量に比例して上昇しており，上部ほど線量率の上昇が大きいことから，浄化装置により雨樋排水が浄化されているものと考えられる。

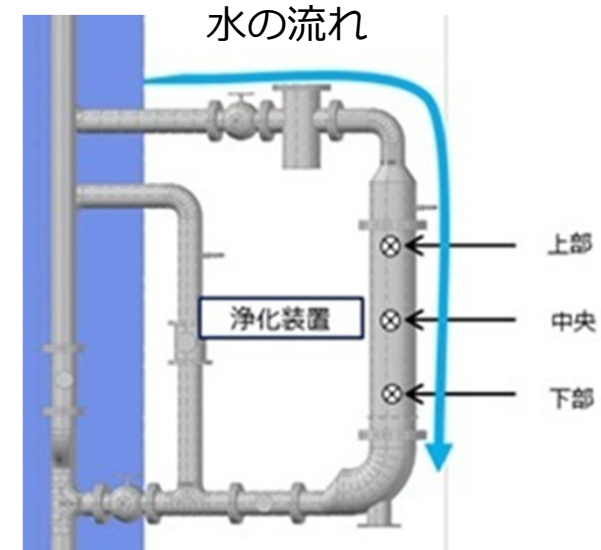


図1 浄化材線量測定位置

表 タービン建屋下屋の雨樋水質分析結果

| 調査点 | 採水日時 | 分析結果 (Bq/L) | | 浄化後 (Bq/L) | |
|-------|-----------------|-------------|--------|------------|--------|
| | | Cs-134 | Cs-137 | Cs-134 | Cs-137 |
| 1TB-1 | 2017/9/28 10:00 | 260 | 2,200 | 11 | 120 |
| | 2017/9/28 12:00 | 300 | 2,800 | ND | 28 |
| 1TB-2 | 2017/9/7 11:00 | 5,000 | 43,000 | - | - |
| | 2017/9/28 10:00 | 1,400 | 12,000 | - | - |
| | 2017/9/28 12:00 | 1,700 | 15,000 | - | - |
| 2TB-1 | 2017/9/28 10:00 | 370 | 2,700 | - | - |
| | 2017/9/28 12:00 | 520 | 3,900 | - | - |
| 3TB-1 | 2017/9/28 10:00 | 4,800 | 37,000 | - | - |
| | 2017/9/28 12:00 | 4,200 | 33,000 | - | - |

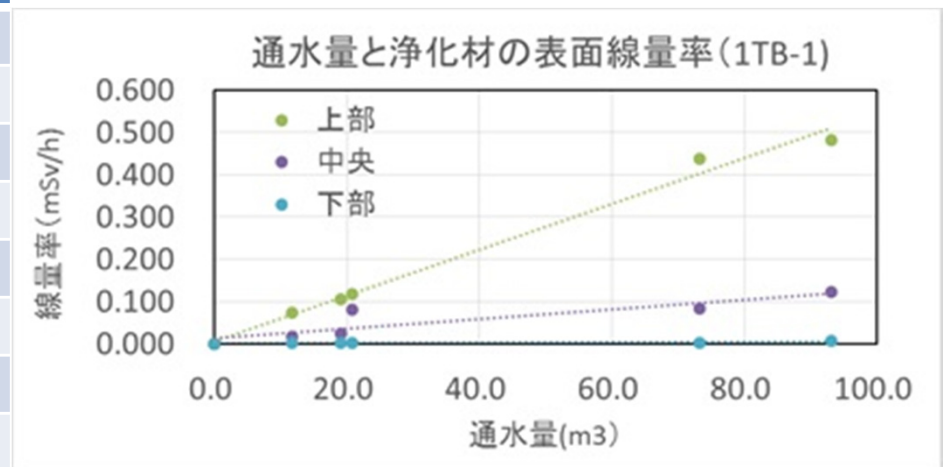


図2 通水量と浄化材の表面線量率


2-3. K排水路濃度低減対策実施状況 (②建屋周辺・③法面)

R/B : 原子炉建屋
 T/B : タービン建屋
 Rw/B : 廃棄物処理建屋

事務局会議18/4/26等追記

凡例

- : 汚染源除去・浄化対策済箇所
- : 暫定対策実施箇所
- : 枝管出口への浄化設置箇所
- : 雨水枡・側溝への浄化設置箇所

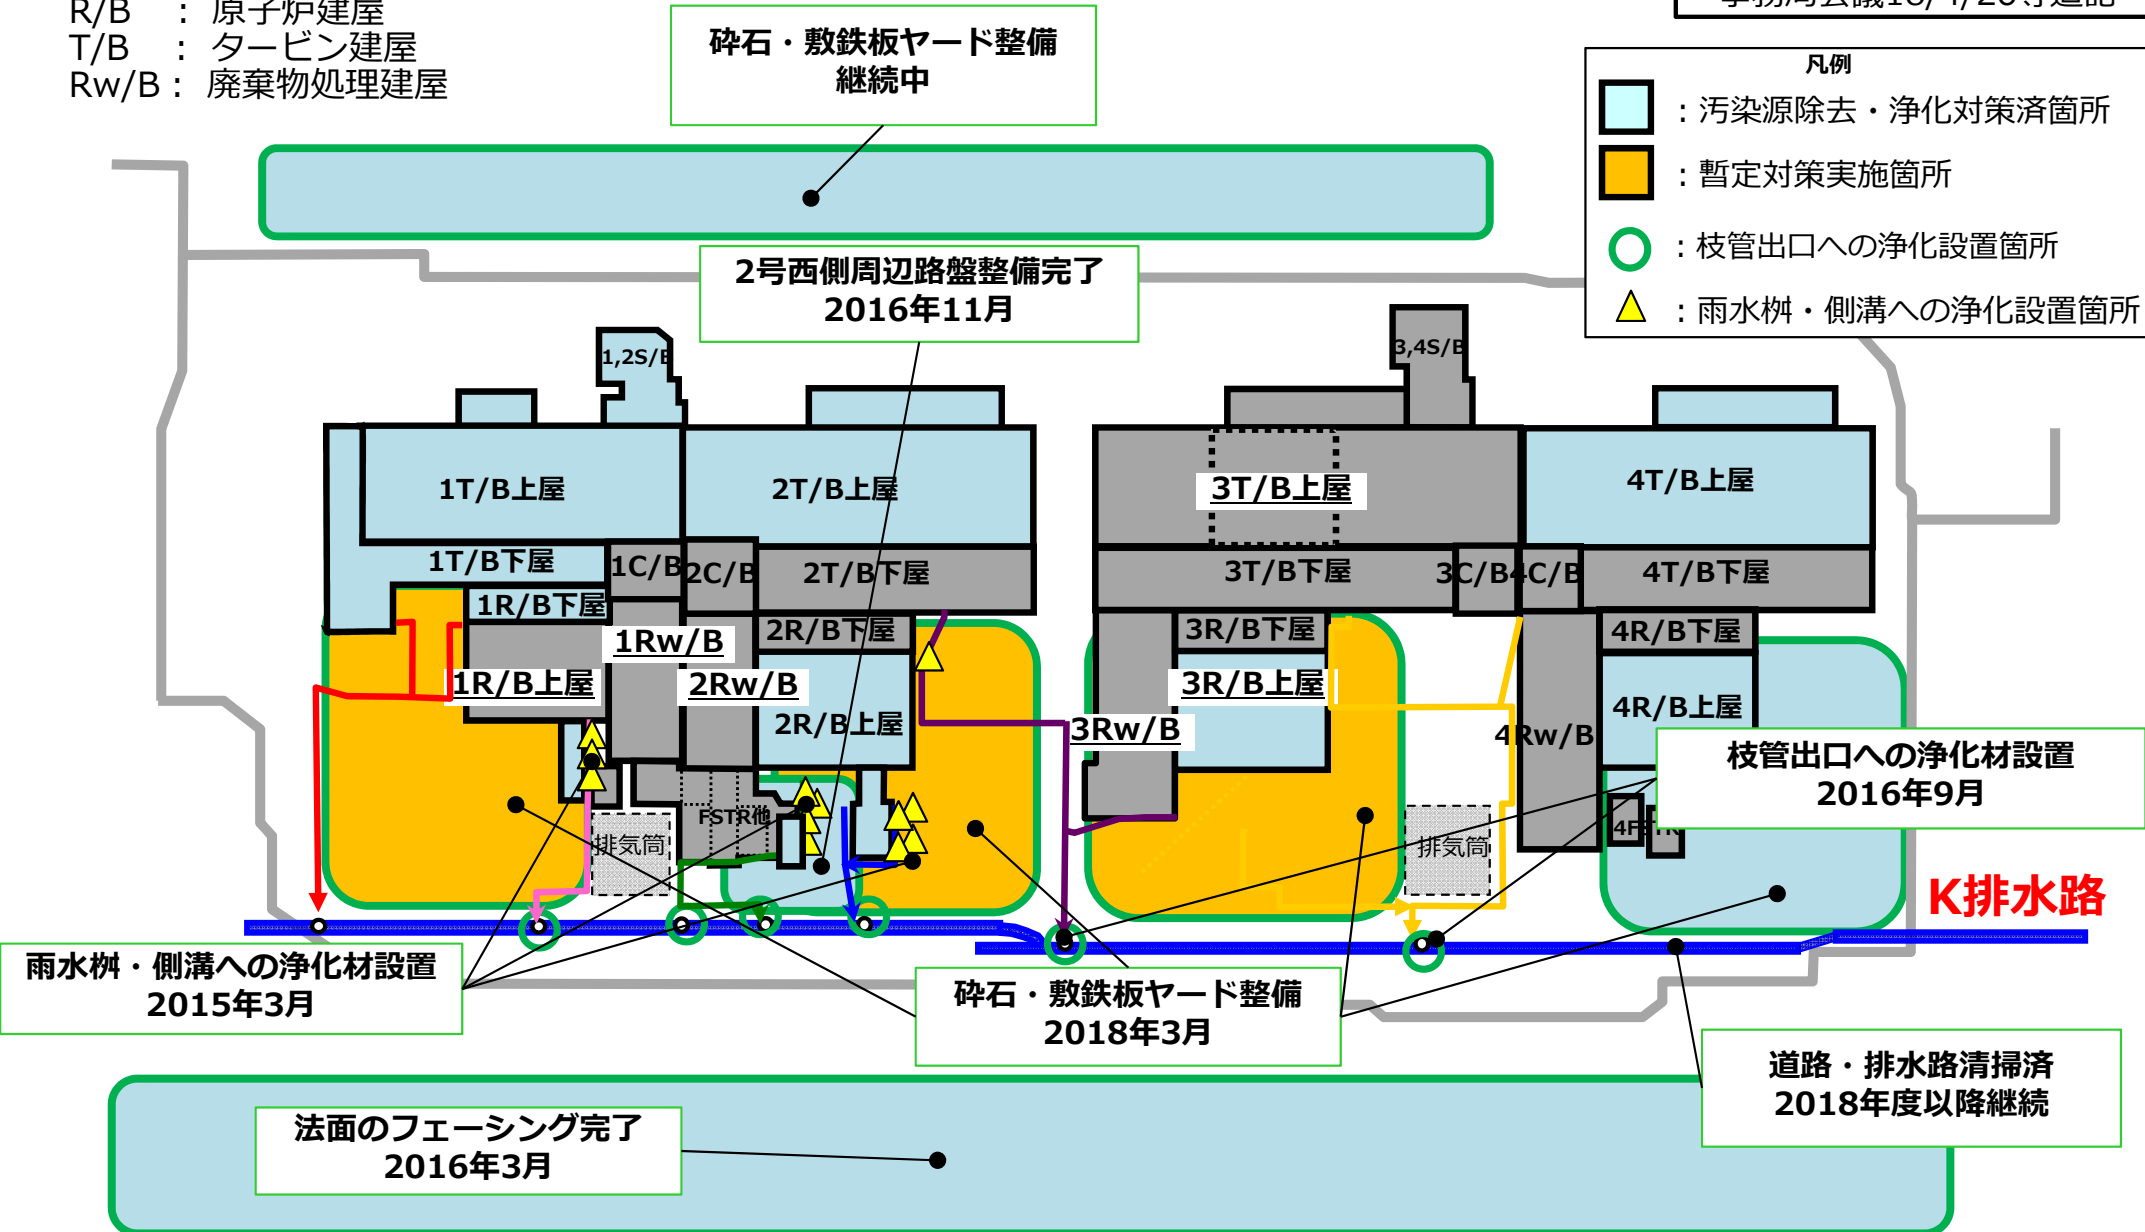

砕石・敷鉄板ヤード整備
 継続中

2号西側周辺路盤整備完了
 2016年11月

枝管出口への浄化材設置
 2016年9月

K排水路

雨水枡・側溝への浄化材設置
 2015年3月

砕石・敷鉄板ヤード整備
 2018年3月

道路・排水路清掃済
 2018年度以降継続

法面のフェーシング完了
 2016年3月

2-3-1. 建屋周辺・法面の整備状況

- 1～3号機建屋周辺のヤード整備及び西側や北側法面フェーシングを実施している。

【1号機建屋周辺ヤード整備】



【2号機建屋周辺ヤード整備】



【3号機建屋周辺ヤード整備】



【北側法面フェーシング】




撮影：2018年4月


2-3-2. 建屋周辺・法面の線量分布

■ 線量分布


【2016年4月】

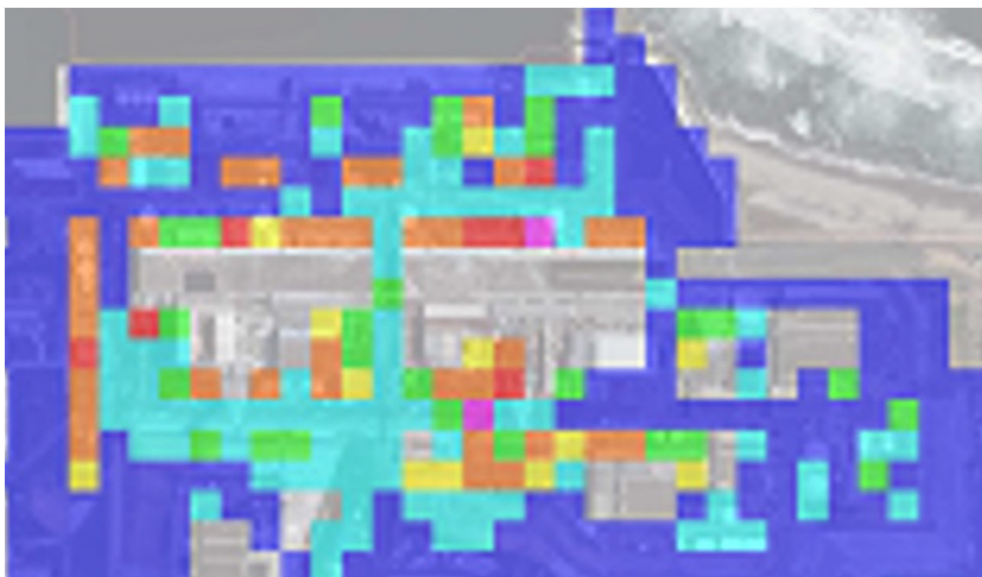

【2018年3月】

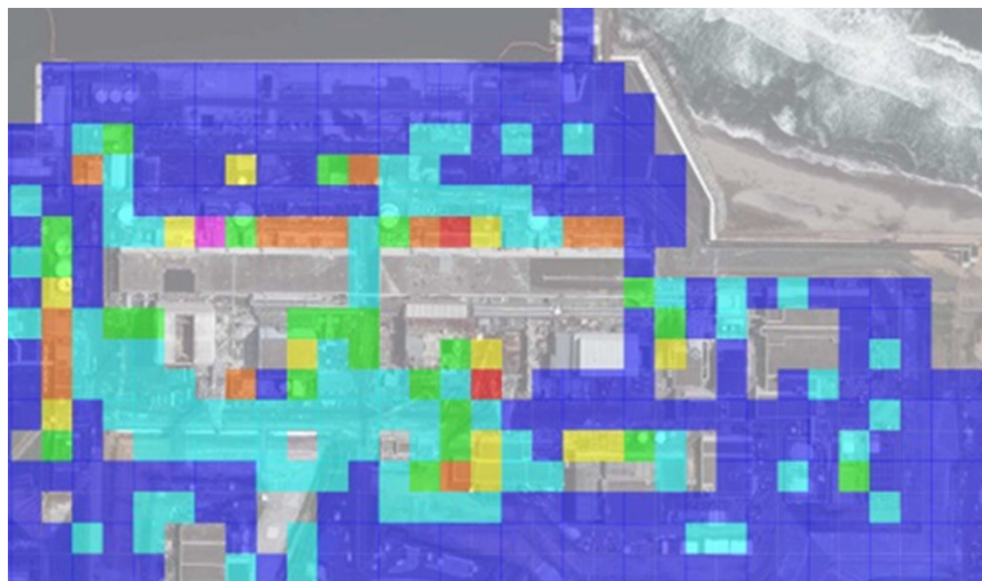

単位：[μSv/h]



- 建屋周辺の平均線量率は,下表に示す工事等の進捗により,2.5m盤及び8.5m盤ともに年々低下の傾向を示している。

■ 平均線量率

単位：[μSv/h]
< 8.5m盤 >

| | 地表面 (コリメト) | 線量低減に寄与した主な工事 |
|------------------|------------|--|
| 2014年度 (2015.2) | 234 | <ul style="list-style-type: none"> 1～4号機山側法面の除染、フェーシング 凍土壁工事や各工事のヤード整備に伴う瓦礫撤去等 3号機原子炉建屋オペフロ遮へい設置及び燃料取扱設備の設置 4号機タービン建屋東側の環境整備 |
| 2015年度 (2015.12) | 160 | |
| 2016年度 (2017.3) | 97 | |
| 2017年度 (2018.2) | 61 | |

< 2.5m盤 >

| | 地表面 (コリメト) | 線量低減の寄与した主な工事 |
|------------------|------------|---|
| 2014年度 (2015.2) | 58 | <ul style="list-style-type: none"> フェーシング工事 循環水ポンプ周辺の瓦礫撤去等 3号機原子炉建屋オペフロ遮へい設置 |
| 2015年度 (2015.12) | 16 | |
| 2016年度 (2017.2) | 6.9 | |
| 2017年度 (2018.2) | 4.5 | |

※ 線量測定：地表面から1cm程度をコリメートして測定。

3-1. 排水路の排水濃度（3ヶ月平均のCs濃度）

- A・BC・K・物揚場排水路全てで、各四半期平均Cs濃度は告示濃度（90Bq/L）未満を達成している。
- K排水路の2017年度の第3四半期までの濃度は、前年比の3～8割程度に低減。
- K排水路の2017年度の各期における最大値は90Bq/Lを上回る日があるが、最大値は2016年度の約半分に低減。

| | 期間 降水量 (mm) | K排水路Cs-137 | | | A排水路Cs-137 | | | 物揚場Cs-137 | | | BC排水路Cs-137 | | | |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| | | 平均値 (Bq/L) | 期間 最大値 (Bq/L) | 平均流量 (m ³ /日) | 平均値 (Bq/L) | 期間 最大値 (Bq/L) | 平均流量 (m ³ /日) | 平均値 (Bq/L) | 期間 最大値 (Bq/L) | 平均流量 (m ³ /日) | 平均値 (Bq/L) | 期間 最大値 (Bq/L) | 平均流量 (m ³ /日) | |
| 2015 年度 | 1Q | 294 | 32 | 270 | 1,300 | 10 | 36 | 320 | 13 | 140 | 130 | 1.6 | 20 | 960 |
| | 2Q | 771 | 84 | 910 | 2,000 | 7.0 | 38 | 1,400 | 14 | 77 | 270 | 1.3 | 18 | 4,000 |
| | 3Q | 233 | 24 | 210 | 1,400 | 5.3 | 19 | 500 | 5.8 | 45 | 280 | 1.0 | 5.8 | 3,000 |
| | 4Q | 131 | 22 | 140 | 1,200 | 4.2 | 12 | 460 | 3.2 | 30 | 340 | 1.0 | 6.1 | 2,600 |
| 2016 年度 | 1Q | 391 | 32 | 290 | 1,300 | 6.2 | 36 | 1,800 | 4.8 | 57 | 880 | 1.2 | 7.0 | 4,200 |
| | 2Q | 680 | 74 | 1,100 | 1,800 | 7.8 | 32 | 3,100 | 4.7 | 22 | 2,200 | 1.5 | 6.7 | 4,000 |
| | 3Q | 140 | 14 | 210 | 1,200 | 6.2 | 19 | 810 | 1.4 | 16 | 1,200 | 1.3 | 3.7 | 830 |
| | 4Q | 134 | 7 | 90 | 1,000 | 6.4 | 14 | 740 | 1.2 | 3.8 | 870 | 0.9 | 2.0 | 1,400 |
| 2017 年度 | 1Q | 214 | 12 | 130 | 1,900 | 8.4 | 20 | 1,900 | 2.1 | 33 | 1,300 | 1.5 | 13 | 1,900 |
| | 2Q | 401 | 22 | 490 | 2,000 | 6.7 | 14 | 1,400 | 3.4 | 100 | 1,400 | 1.2 | 4.1 | 2,000 |
| | 3Q | 447 | 11 | 82 | 3,100 | 3.3 | 26 | 2,800 | 2.3 | 25 | 2,300 | 0.9 | 2.2 | 3,100 |
| | 4Q | 215 | 11 | 170 | 1,600 | 2.6 | 16 | 1,600 | 2.0 | 32 | 850 | 1.0 | 10 | 3,300 |

- ※ 各期間中に排水路で採水分析したCs濃度(同日に複数データがあるものは最大値を採用)を整理した。
- ※ 平均値とは、各四半期間の原則1回/日のCs-137濃度を累計し、期間日数で除したものの。
- ※ 平均流量は、サンプリング時間における流量(m³/s)を24時間分に換算したものの。

3-2. K排水路の排水濃度・放出量

- K排水路は、降雨の多い第2四半期はCs濃度・流量ともに多いが、期間放出量は2016年度の約7割程度に低減。

| K排水路 Cs137 | 期間 降水量 (mm) | 降雨日 | | | | 晴天日 | | | | 四半期間 (降雨日+晴天日) | |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | 降雨日 平均値 (Bq/L) | 降雨日 平均流量 (m ³ /日) | 期間 降雨日数 (日) | 期間 放出量 (Bq/3月) | 晴天日 平均値 (Bq/L) | 晴天日 平均流量 (m ³ /日) | 期間 晴天日数 (日) | 期間 放出量 (Bq/3月) | 期間 放出量 (Bq/3月) | |
| 2015 年度 | 1Q | 294 | 51 | 1,700 | 33 | 4×10 ⁹ | 21 | 1,100 | 58 | 1×10 ⁹ | 6×10 ⁹ |
| | 2Q | 771 | 130 | 2,800 | 43 | 2×10 ¹⁰ | 42 | 1,200 | 49 | 3×10 ⁹ | 3×10 ¹⁰ |
| | 3Q | 233 | 48 | 2,200 | 20 | 4×10 ⁹ | 17 | 1,200 | 72 | 1×10 ⁹ | 5×10 ⁹ |
| | 4Q | 131 | 36 | 2,100 | 13 | 1×10 ⁹ | 19 | 1,000 | 78 | 2×10 ⁹ | 3×10 ⁹ |
| 2016 年度 | 1Q | 391 | 60 | 2,300 | 30 | 9×10 ⁹ | 18 | 780 | 61 | 9×10 ⁸ | 1×10 ¹⁰ |
| | 2Q | 680 | 130 | 2,800 | 44 | 2×10 ¹⁰ | 26 | 840 | 48 | 1×10 ⁹ | 2×10 ¹⁰ |
| | 3Q | 140 | 39 | 1,600 | 21 | 2×10 ⁹ | 6.6 | 1,100 | 71 | 5×10 ⁸ | 3×10 ⁹ |
| | 4Q | 134 | 17 | 1,900 | 15 | 3×10 ⁸ | 4.3 | 830 | 75 | 3×10 ⁸ | 6×10 ⁸ |
| 2017 年度 | 1Q | 214 | 14 | 4,000 | 23 | 3×10 ⁹ | 12 | 1,200 | 68 | 1×10 ⁹ | 4×10 ⁹ |
| | 2Q | 401 | 34 | 2,400 | 45 | 5×10 ⁹ | 9.4 | 1,600 | 47 | 7×10 ⁸ | 6×10 ⁹ |
| | 3Q | 447 | 24 | 7,200 | 21 | 8×10 ⁹ | 6.5 | 1,900 | 71 | 1×10 ⁹ | 9×10 ⁹ |
| | 4Q | 215 | 27 | 3,000 | 17 | 3×10 ⁹ | 7.9 | 1,300 | 73 | 8×10 ⁸ | 4×10 ⁹ |

- ※ 各期間中に排水路で採水分析したCs濃度(同日に複数データがあるものは最大値を採用)を整理した。
- ※ K排水路については各四半期間の晴天日(降雨量0mm/日)及び降雨日(降雨量0.5mm/日以上)の平均値も整理した。
- ※ 平均値とは、各四半期間の原則1回/日のCs-137濃度を累計し、期間日数で除したもの。
- ※ 平均流量は、サンプリング時間における流量(m³/s)を24時間分に換算したもの。
- ※ 期間放出量とは、各日の濃度×流量の値を該当区間分累計したもの(降雨日・晴天日についても同様、当該日の濃度と流量はWebにて公開)。
- ※ 期間放出量は、四捨五入により、降雨日と晴天日を加算した値と異なる項がある。

4. K排水路濃度低減対策（今後の計画）

事務局会議18/3/1追記

【凡例】

- 今後の対策箇所
- 汚染源除去・浄化対策済箇所
- 陸側遮水壁

R/B : 原子炉建屋
T/B : タービン建屋
Rw/B : 廃棄物処理建屋

ガレキ撤去・防水・破損箇所
屋根設置
(2020年度上期完了予定)

道路・排水路清掃, 浄化材交換
(2018年度以降も継続)


縦樋浄化材設置
(2018年9月予定)

ガレキ撤去作業中
(2023年度カバー
設置完了予定)

ガレキ撤去・防水
(2020年度上期完了予定)

ガレキ撤去・防水
実施時期検討中

K排水路

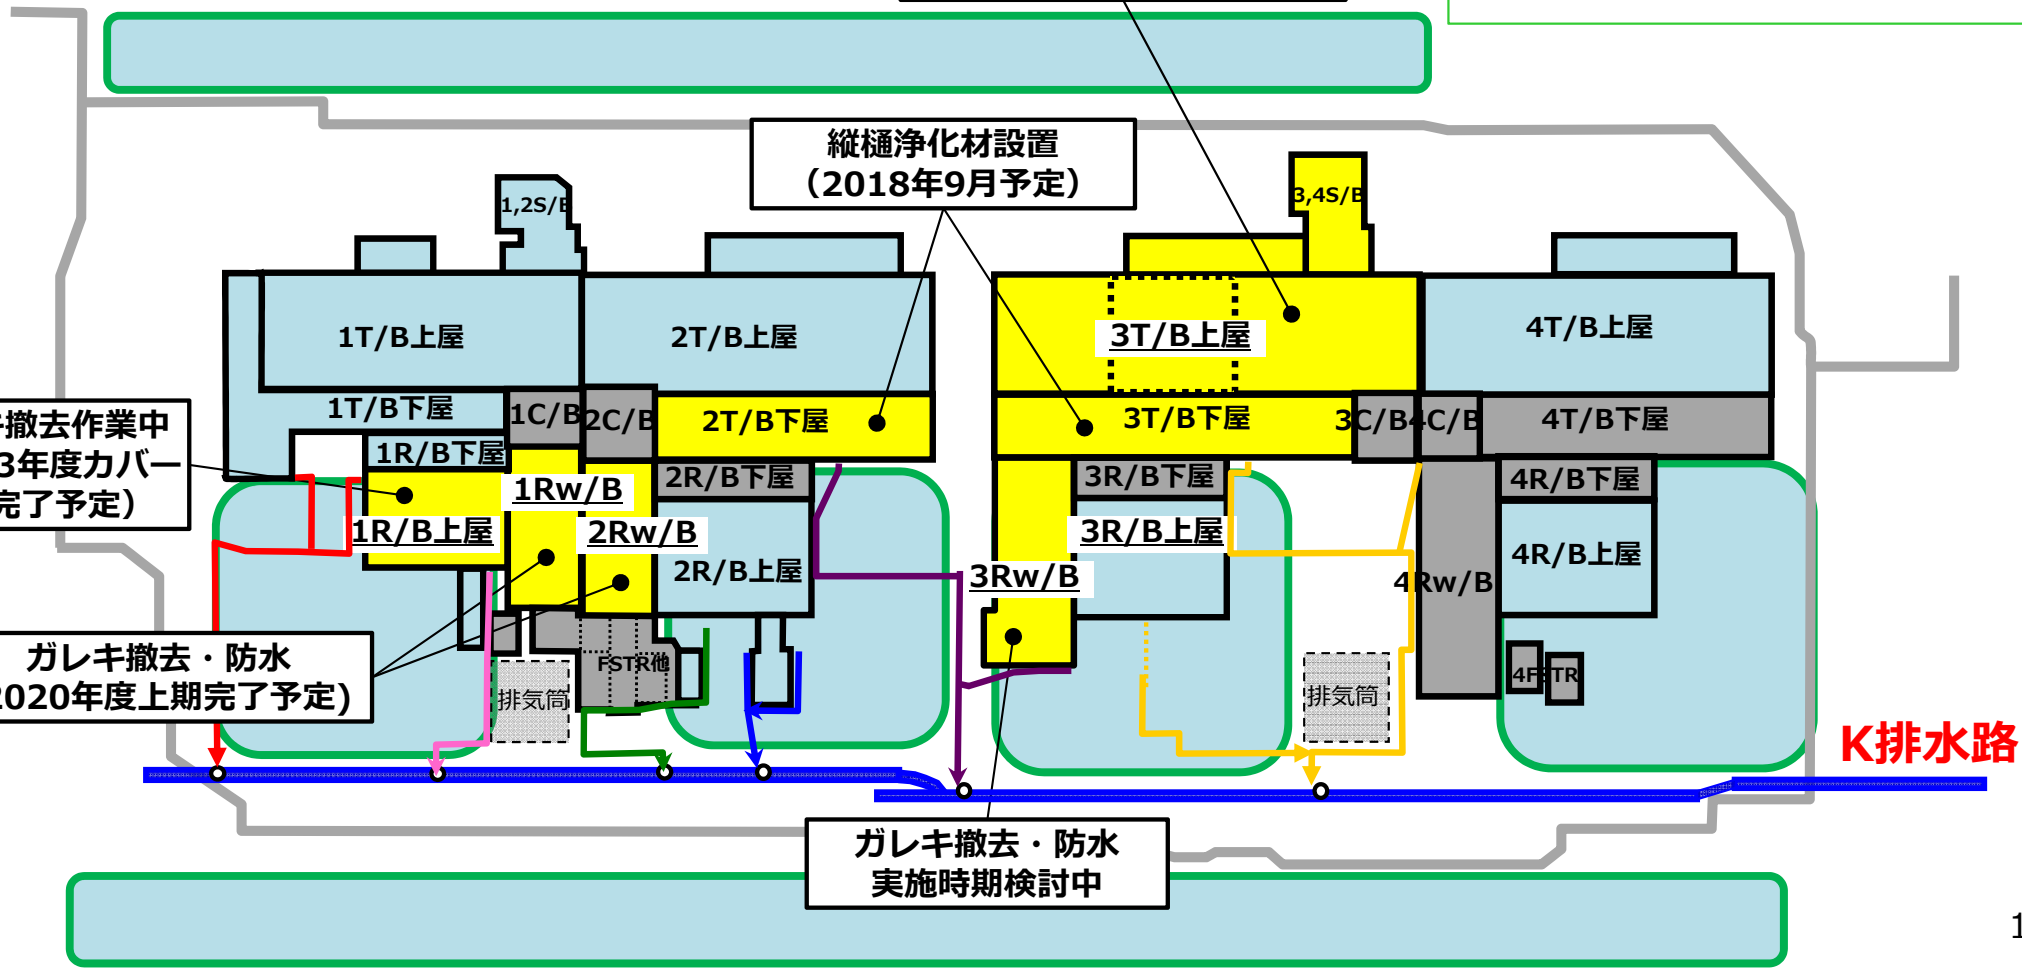


原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果(2018年4月)

【評価結果】

- 2018年4月における1～4号機原子炉建屋からの追加的放出量を評価した結果、 2.9×10^4 (Bq/時)未満であり、放出管理の目標値(1.0×10^7 Bq/時)を下回っていることを確認した。
- 本放出における敷地境界の空气中放射性物質濃度は、Cs-134: 1.6×10^{-12} (Bq/cm³)、Cs-137: 6.4×10^{-12} (Bq/cm³)であり、当該値が1年間継続した場合、敷地境界における被ばく線量は、年間0.00023mSv未満となる。

参考：核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示
 周辺監視区域外の空气中の濃度限度・・・Cs-134: 2×10^{-5} (Bq/cm³)、Cs-137: 3×10^{-5} (Bq/cm³)

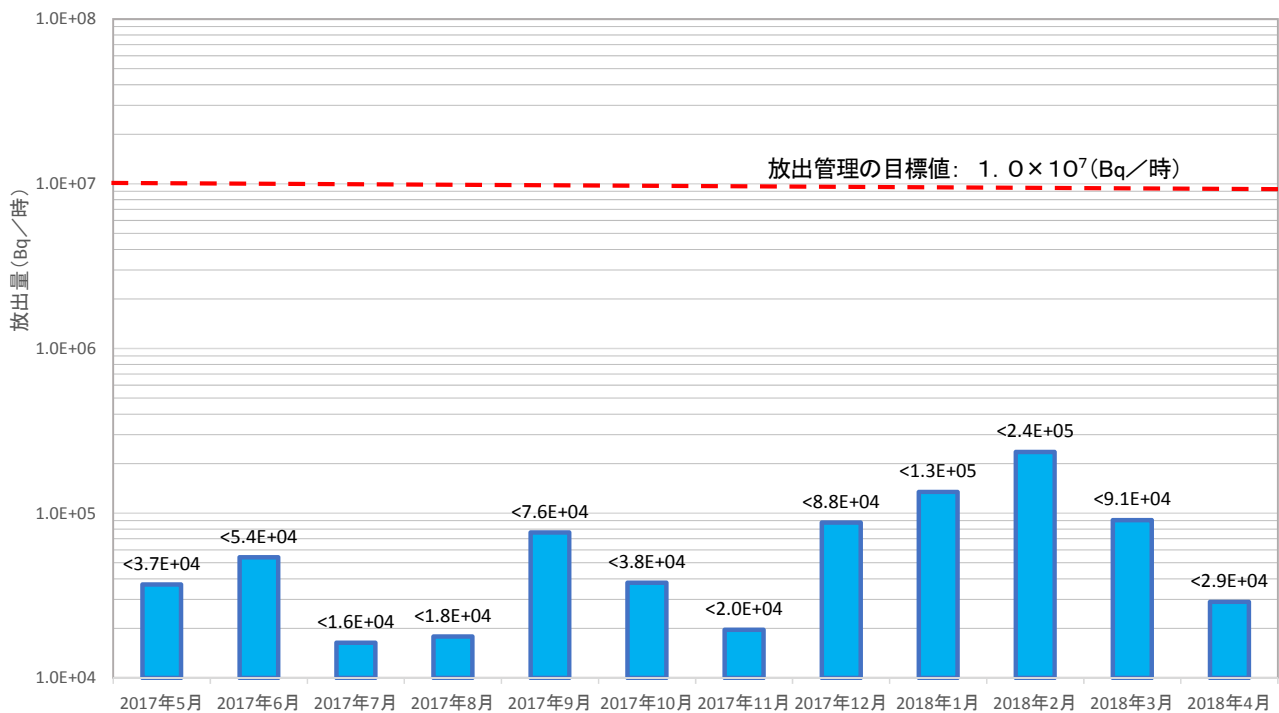


端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

【評価手法】

- 1～4号機原子炉建屋からの放出量(セシウム)を、原子炉建屋上部等の空气中放射性物質濃度(ダスト濃度)、連続ダストモニタ及び気象データ等の値を基に評価を実施。(詳細な評価手法については別紙参照)
- 希ガスについては、格納容器ガス管理設備における分析結果から放出量を評価しているが、放出されるガンマ線実効エネルギーがセシウムに比べて小さく、被ばく経路も放射性雲の通過による外部被ばくのみとなるため、これによる被ばく線量は、セシウムによる被ばく線量に比べて小さいと評価している。

【各号機における放出量の推移】

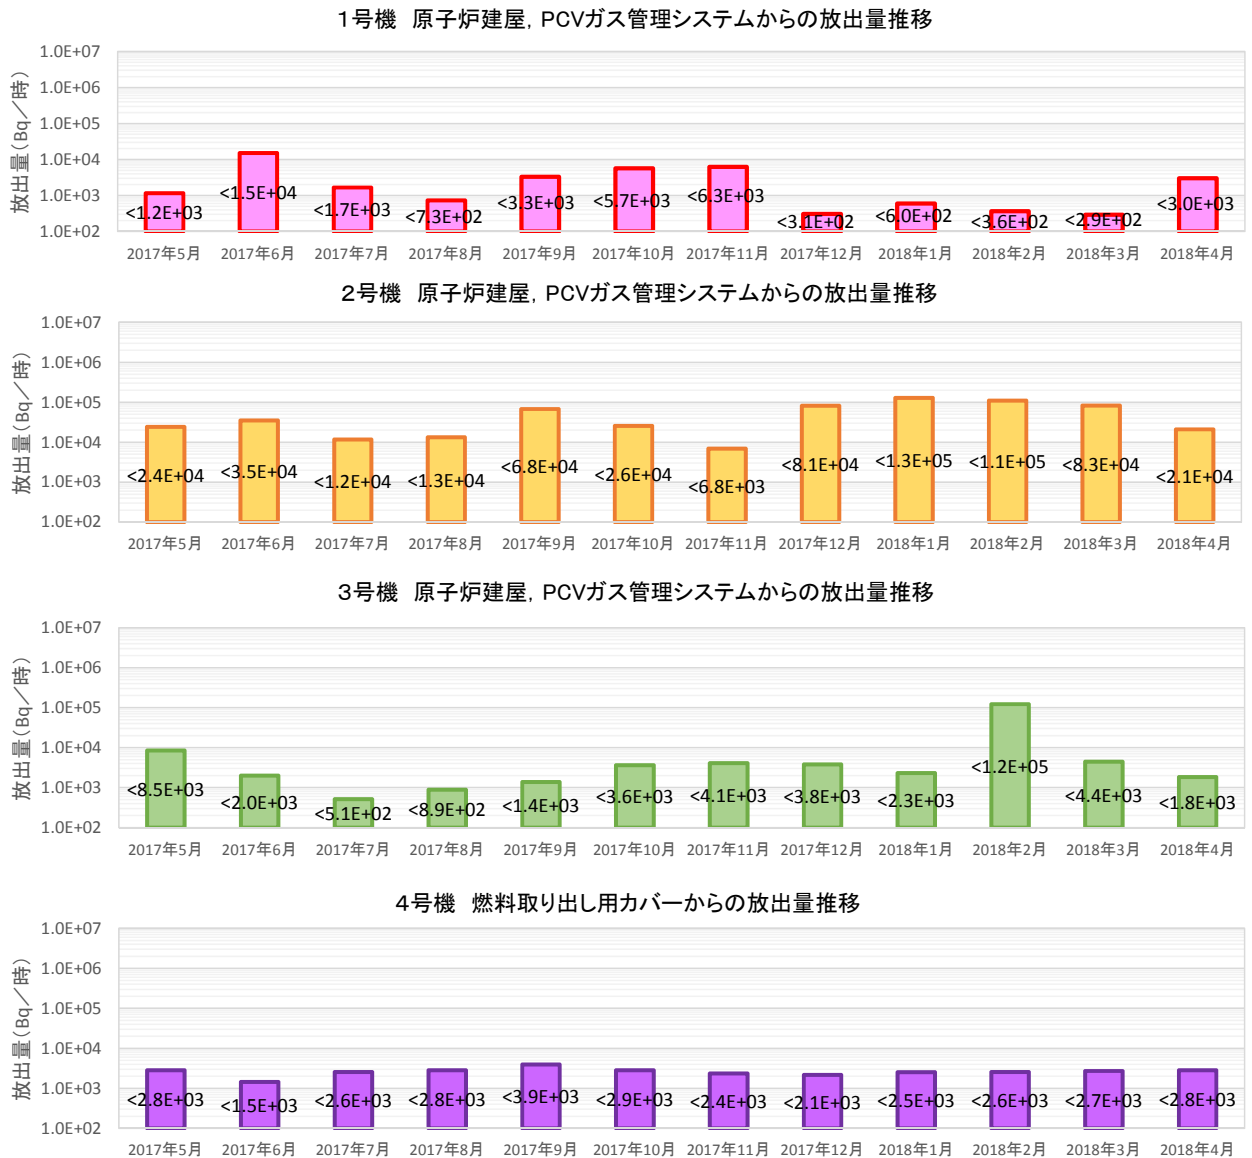

《評価》

1号機については、機器ハッチの月一回の空气中放射性物質濃度の測定値が上がったため、放出量が増加した。2号機については、ブローアウトパネル隙間の月一回の空气中放射性物質濃度の測定値が低下したため放出量が減少した。3号機については、機器ハッチの月一回の空气中放射性物質濃度の測定値が低下したため放出量が減少した。4号機については、3月とほぼ同程度の放出量であった。

1～4号機原子炉建屋からの
追加的放出量評価結果 2018年4月評価分
(詳細データ)



東京電力ホールディングス株式会社

1. 放出量評価について

■ 放出量評価値(4月評価分)

単位：Bq/時

| | 原子炉建屋上部 | | PCVガス管理システム | | | Cs-134,Cs-137合計値 | | |
|-----|----------|----------|-------------|----------|--------|------------------|----------|----------|
| | Cs-134 | Cs-137 | Cs-134 | Cs-137 | 希ガス | Cs-134 | Cs-137 | 合計 |
| 1号機 | 3.1E+2未満 | 2.7E+3未満 | 2.0E+1未満 | 2.4E+1未満 | 1.7E+7 | 3.3E+2未満 | 2.7E+3未満 | 3.0E+3未満 |
| 2号機 | 2.7E+3未満 | 1.8E+4未満 | 3.3E+1未満 | 2.8E+1未満 | 6.1E+8 | 2.8E+3未満 | 1.8E+4未満 | 2.1E+4未満 |
| 3号機 | 6.3E+2未満 | 1.2E+3未満 | 2.3E+1未満 | 1.9E+1未満 | 8.6E+8 | 6.6E+2未満 | 1.2E+3未満 | 1.8E+3未満 |
| 4号機 | 1.6E+3未満 | 1.2E+3未満 | - | - | - | 1.6E+3未満 | 1.2E+3未満 | 2.8E+3未満 |
| 合計 | - | | | | | 5.3E+3未満 | 2.3E+4未満 | 2.9E+4未満 |

■ 放出量評価値(3月評価分)

単位：Bq/時

| | 原子炉建屋上部 | | PCVガス管理システム | | | Cs-134,Cs-137合計値 | | |
|-----|----------|----------|-------------|----------|--------|------------------|----------|----------|
| | Cs-134 | Cs-137 | Cs-134 | Cs-137 | 希ガス | Cs-134 | Cs-137 | 合計 |
| 1号機 | 1.2E+2未満 | 1.3E+2未満 | 2.3E+1未満 | 2.0E+1未満 | 1.8E+7 | 1.4E+2未満 | 1.5E+2未満 | 2.9E+2未満 |
| 2号機 | 1.0E+4未満 | 7.3E+4未満 | 3.1E+1未満 | 2.4E+1未満 | 6.7E+8 | 1.0E+4未満 | 7.3E+4未満 | 8.3E+4未満 |
| 3号機 | 1.0E+3未満 | 3.4E+3 | 2.9E+1未満 | 2.2E+1未満 | 8.8E+8 | 1.0E+3未満 | 3.4E+3未満 | 4.4E+3未満 |
| 4号機 | 1.4E+3未満 | 1.3E+3未満 | - | - | - | 1.4E+3未満 | 1.3E+3未満 | 2.7E+3未満 |
| 合計 | - | | | | | 1.3E+4未満 | 7.8E+4未満 | 9.1E+4未満 |

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

2.1 1号機の放出量評価

1. 原子炉直上部

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm³)

| 採取日 | 核種 | ①原子炉 ウェル上部 北側 | 原子炉 ウェル上部 北西側 | 原子炉 ウェル上部 南側 |
|-----|--------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4/2 | Cs-134 | ND(1.5E-7) | ND(1.1E-7) | ND(1.2E-7) |
| | Cs-137 | ND(9.9E-8) | ND(1.0E-7) | ND(1.0E-7) |

| ②ガス採取期間 | | 月間平均 | 相対比①/② | |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| ガス モニタ値 | 2.7E-6 | 3.0E-6 | Cs-134 | 5.6E-2 |
| | | | Cs-137 | 3.7E-2 |

(2) 月間漏洩率評価 : 1.6E+2 m³/h

(2018.4.1 現在の崩壊熱より蒸気発生量(4.5E-2m³/s)を評価)

2. 建屋隙間

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm³)

| 採取日 | 核種 | ①機器ハッチ |
|-----|--------|------------|
| 4/2 | Cs-134 | ND(1.5E-7) |
| | Cs-137 | 1.4E-6 |


| ②ガス採取期間 | | 月間平均 | 相対比①/② | |
|------------|--------|---------|--------|--------|
| ガス モニタ値 | 2.1E-6 | 2.7E-06 | Cs-134 | 7.1E-2 |
| | | | Cs-137 | 6.6E-1 |

(2) 月間漏洩率評価 : 1.5E+3 m³/h

4. 放出量評価

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|----------------|
| 原子炉直上部+建屋隙間(Cs-134) | = 3.0E-6 × 5.6E-2 × 1.6E+2 × 1E+6 | + 2.7E-6 × 7.1E-2 × 1.5E+3 × 1E+6 | = 3.1E+2Bq/時未満 |
| 原子炉直上部+建屋隙間(Cs-137) | = 3.0E-6 × 3.7E-2 × 1.6E+2 × 1E+6 | + 2.7E-6 × 6.6E-1 × 1.5E+3 × 1E+6 | = 2.7E+3Bq/時未満 |
| PCVガス管理システム(Cs-134) | = 1.8E+1 × 5.5E-8 × 2.0E+1 × 1E+6 | | = 2.0E+1Bq/時未満 |
| PCVガス管理システム(Cs-137) | = 1.8E+1 × 6.6E-8 × 2.0E+1 × 1E+6 | | = 2.4E+1Bq/時未満 |
| PCVガス管理システム(Kr) | = 8.4E-1 × 2.0E+1 × 1E+6 | | = 1.7E+7Bq/時 |
| PCVガス管理システム(Kr被ばく線量) | = 1.7E+7 × 24 × 365 × 2.5E-19 × 0.0022/0.5 × 1E+3 | | = 1.6E-7mSv/年 |

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

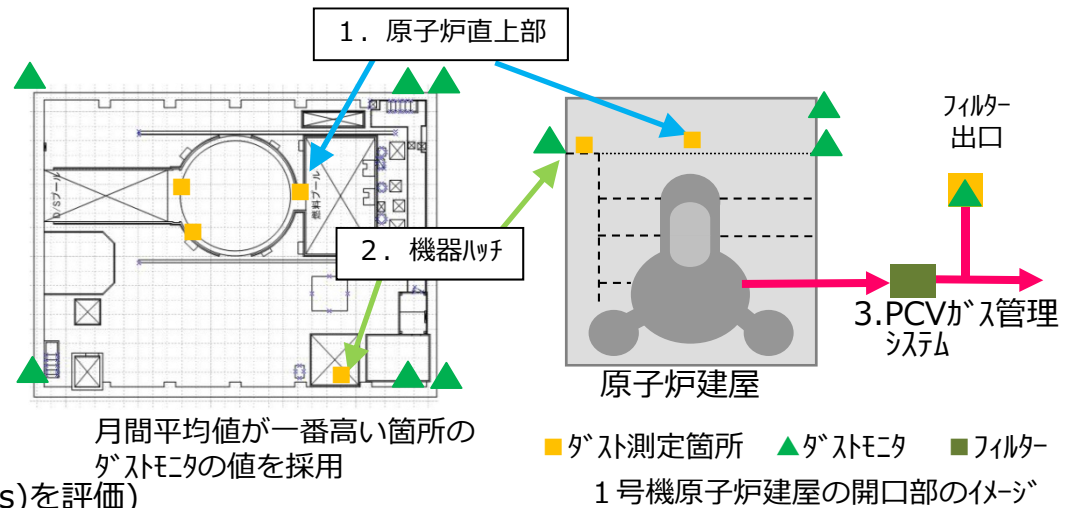

3. PCVガス管理システム

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm³)

| 採取日 | 核種 | ①PCVガス管理システム出口 |
|-----|--------|----------------|
| 4/2 | Cs-134 | ND(1.0E-6) |
| | Cs-137 | ND(1.2E-6) |

| 核種 | PCVガス管理システム出口 月間平均値(Bq/cm ³) |
|-------|---|
| Kr-85 | 8.4E-1 |

| ②ガス採取期間 (cps) | | 月間平均 (cps) | 相対比①/② | |
|---------------|--------|------------|--------|--------|
| ガス モニタ値 | 1.8E+1 | 1.8E+1 | Cs-134 | 5.5E-8 |
| | | | Cs-137 | 6.6E-8 |

(2) 月間平均流量結果 : 2.0E+01 m³/h


2.2 2号機の放出量評価

1. 排気設備

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm³)

| 採取日 | 核種 | ①排気設備出口 | |
|--------|---------|------------|--------------------------------|
| 4/12 | Cs-134 | ND(1.4E-7) | |
| | Cs-137 | ND(1.4E-7) | |
| | ②ガス採取期間 | 月間平均 | 相対比①/② |
| ガスモニタ値 | 1.9E-7 | 1.6E-7 | Cs-134 7.3E-1 Cs-137 7.3E-1 |

(2) 月間排気設備流量 : 1.0E+4 m³/h

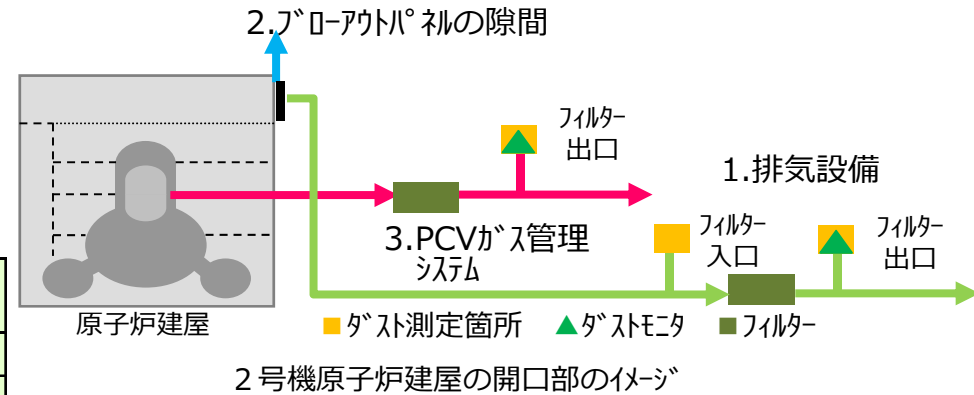

2. プローアウトパールの隙間

(1) ガス測定結果 (単位Bq/cm³)

| 採取日 | 核種 | 排気設備入口 |
|------|--------|--------|
| 4/12 | Cs-134 | 8.9E-8 |
| | Cs-137 | 1.0E-6 |

(2) 月間漏洩率評価 : 1.7E+4 m³/h

3. PCVガス管理システム

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm³)

| 採取日 | 核種 | ①PCVガス管理システム出口 | 核種 | PCVガス管理システム出口 月間平均値(Bq/cm ³) |
|--------|---------|----------------|--------------------------------|---|
| 4/12 | Cs-134 | ND(1.1E-6) | Kr-85 | 4.2E+1 |
| | Cs-137 | ND(9.3E-7) | | |
| | ②ガス採取期間 | 月間平均 | 相対比①/② | |
| ガスモニタ値 | 9.4E-7 | 1.9E-6 | Cs-134 1.2E+0 Cs-137 9.9E-1 | |

(2) 月間平均流量結果 1.5E+01 m³/h

4. 放出量評価

$$\begin{aligned}
 & \text{排気設備出口+プローアウトパールの隙間(Cs-134)} = 1.6E-7 \times 7.3E-1 \times 1.0E+4 \times 1E+6 + 8.9E-8 \times 1.7E+4 \times 1E+6 = 2.7E+3\text{Bq/時未満} \\
 & \text{排気設備出口+プローアウトパールの隙間(Cs-137)} = 1.6E-7 \times 7.3E-1 \times 1.0E+4 \times 1E+6 + 1.0E-6 \times 1.7E+4 \times 1E+6 = 1.8E+4\text{Bq/時未満} \\
 & \text{PCVガス管理システム(Cs-134)} = 1.9E-6 \times 1.2E+0 \times 1.5E+1 \times 1E+6 = 3.3E+1\text{Bq/時未満} \\
 & \text{PCVガス管理システム(Cs-137)} = 1.9E-6 \times 9.9E-1 \times 1.5E+1 \times 1E+6 = 2.8E+1\text{Bq/時未満} \\
 & \text{PCVガス管理システム(Kr)} = 4.2E+1 \times 1.5E+1 \times 1E+6 = 6.1E+8\text{Bq/時} \\
 & \text{PCVガス管理システム(Kr被ばく線量)} = 6.1E+8 \times 24 \times 365 \times 2.4E-19 \times 0.0022/0.5 \times 1E+3 = 5.7E-6\text{mSv/年}
 \end{aligned}$$

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

2.3 3号機の放出量評価

1. 原子炉直上部

(1) ダスト測定結果とダストモニタ値 (単位Bq/cm³)

| 採取日 | 核種 | ①南 |
|-----|--------|------------|
| 4/5 | Cs-134 | ND(9.1E-8) |
| | Cs-137 | ND(9.9E-8) |

| | ②ダスト採取期間 | 月間平均 | 相対比①/② | |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| ダストモニタ値 | 3.4E-6 | 2.7E-6 | Cs-134 | 2.7E-2 |
| | | | Cs-137 | 2.9E-2 |

(2) 月間漏洩率評価 : 2.0E+2 m³/h
 (2018.4.1現在の崩壊熱より蒸気発生量(5.5E-2m³/s)を評価)

2. 機器ハッチ

(1) ダスト測定結果とダストモニタ値 (単位Bq/cm³)


| 採取日 | 核種 | ①機器ハッチ |
|-----|--------|------------|
| 4/5 | Cs-134 | ND(1.3E-7) |
| | Cs-137 | 2.4E-7 |

| | ②ダスト採取期間 | 月間平均 | 相対比①/② | |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| ダストモニタ値 | 2.0E-6 | 2.4E-6 | Cs-134 | 6.6E-2 |
| | | | Cs-137 | 1.2E-1 |

(2) 月間漏洩率評価 : 3.9E+3 m³/h

4. 放出量評価

$$\begin{aligned}
 \text{原子炉直上部+機器ハッチ(Cs-134)} &= 2.7E-6 \times 2.7E-2 \times 2.0E+2 \times 1E+6 + 2.4E-6 \times 6.6E-2 \times 3.9E+3 \times 1E+6 = 6.3E+2\text{Bq/時未満} \\
 \text{原子炉直上部+機器ハッチ(Cs-137)} &= 2.7E-6 \times 2.9E-2 \times 2.0E+2 \times 1E+6 + 2.4E-6 \times 1.2E-1 \times 3.9E+3 \times 1E+6 = 1.2E+3\text{Bq/時未満} \\
 \text{PCVガス管理システム(Cs-134)} &= 2.2E-5 \times 5.7E-2 \times 1.8E+1 \times 1E+6 = 2.3E+1\text{Bq/時未満} \\
 \text{PCVガス管理システム(Cs-137)} &= 2.2E-5 \times 4.8E-2 \times 1.8E+1 \times 1E+6 = 1.9E+1\text{Bq/時未満} \\
 \text{PCVガス管理システム(Kr)} &= 4.7E+1 \times 1.8E+1 \times 1E+6 = 8.6E+8\text{Bq/時} \\
 \text{PCVガス管理システム(Kr被ばく線量)} &= 8.6E+8 \times 24 \times 365 \times 3.0E-19 \times 0.0022/0.5 \times 1E+3 = 9.9E-6\text{mSv/年}
 \end{aligned}$$

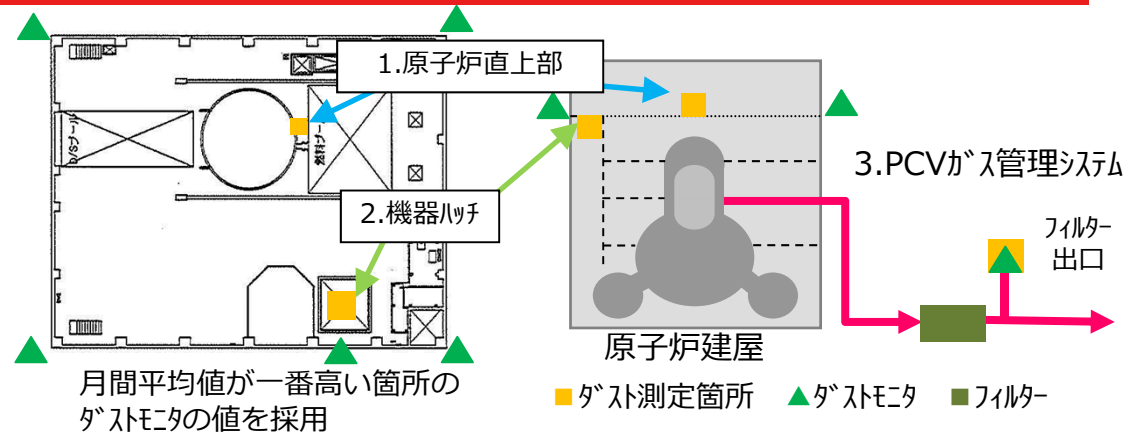

3号機原子炉建屋の開口部のイメージ

3. PCVガス管理システム

(1) ダスト測定結果とダストモニタ値 (単位Bq/cm³)

| 採取日 | 核種 | ①PCVガス管理システム出口 |
|-----|--------|----------------|
| 4/5 | Cs-134 | ND(1.3E-6) |
| | Cs-137 | ND(1.1E-6) |

| 核種 | PCVガス管理システム出口 月間平均値(Bq/cm ³) |
|-------|---|
| Kr-85 | 4.7E+1 |

| | ②ダスト採取期間 | 月間平均 | 相対比①/② | |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| ダストモニタ値 | 2.3E-5 | 2.2E-5 | Cs-134 | 5.7E-2 |
| | | | Cs-137 | 4.8E-2 |

(2) 月間平均流量結果 : 1.8E+1 m³/h

2.4 4号機の放出量評価

1. 燃料取出し用ガレ-隙間

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm³)

| 採取日 | 核種 | ①SFP近傍 | チェンジング プレイス近傍 | カバー上部 |
|-----|--------|------------|------------------|------------|
| 4/4 | Cs-134 | ND(1.2E-7) | ND(1.3E-7) | ND(1.0E-7) |
| | Cs-137 | ND(1.0E-7) | ND(9.9E-8) | ND(9.9E-8) |

| | ②ガス採取期間 | 月間平均 | 相対比①/② | |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| ガスモニタ値 | 5.4E-7 | 5.9E-7 | Cs-134 | 2.2E-1 |
| | | | Cs-137 | 1.8E-1 |

ガス測定結果及び相対比より、放出量が最大となる箇所を採用

(2) 月間漏洩率評価 : 6.2E+3 m³/h

2. 燃料取出し用ガレ-排気設備

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm³)

| 採取日 | 核種 | ①排気設備出口 |
|-----|--------|------------|
| 4/4 | Cs-134 | ND(1.4E-8) |
| | Cs-137 | ND(9.9E-9) |

| | ②ガス採取期間 | 月間平均 | 相対比①/② | |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| ガスモニタ値 | 1.2E-7 | 1.3E-7 | Cs-134 | 1.2E-1 |
| | | | Cs-137 | 8.3E-2 |

(2) 月間排気設備流量 : 5.0E+4 m³/h

3. 放出量評価


燃料取出し用ガレ-隙間+燃料取出し用ガレ-排気設備(Cs-134)

$$= 5.9E-7 \times 2.2E-1 \times 6.2E+3 \times 1E+6 + 1.3E-7 \times 1.2E-1 \times 5.0E+4 \times 1E+6 = 1.6E+3Bq/時未満$$

燃料取出し用ガレ-隙間+燃料取出し用ガレ-排気設備(Cs-137)

$$= 5.9E-7 \times 1.8E-1 \times 6.2E+3 \times 1E+6 + 1.3E-7 \times 8.3E-2 \times 5.0E+4 \times 1E+6 = 1.2E+3Bq/時未満$$

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

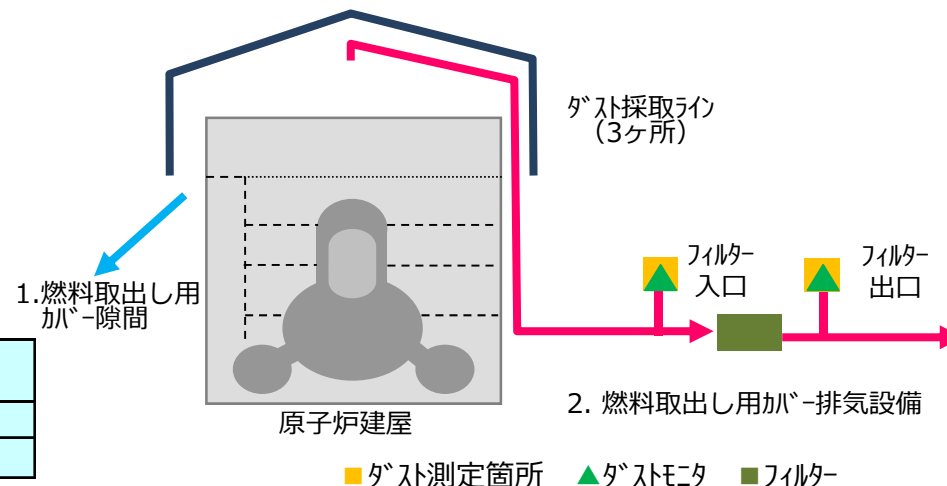


4号機原子炉建屋の開口部のイメージ

- 月1回の空气中放射性物質濃度測定値と連続ダストモニタのデータから連続性を考慮した空气中放射性物質濃度を評価

STEP1 月間の連続ダストモニタのトレンドを確認

※連続ダストモニタは、
全βのため被ばく評価に使用できない

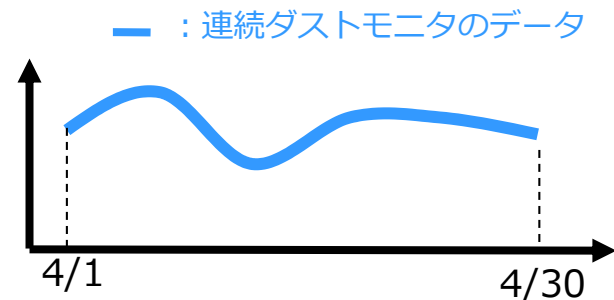


STEP2 月1回の空气中放射性物質濃度測定値と連続ダストモニタの値を比較

- 例 4月8日に月1回の空气中放射性物質濃度測定 . . . ①
→核種毎 (Cs134.137) にデータが得られる
- 同時刻の連続ダストモニタの値を確認 . . . ②
- 上記2つのデータの比を評価 . . . ③


● : 空气中放射性物質濃度測定結果
● : 4月8日の連続ダストモニタデータ

③相対比=①空气中放射性物質濃度 / ②ダストモニタの値



STEP3 連続性を考慮した空气中放射性物質濃度を評価

- 連続ダストモニタのデータに③相対比を乗じて、
連続性を考慮した空气中放射性物質濃度を評価

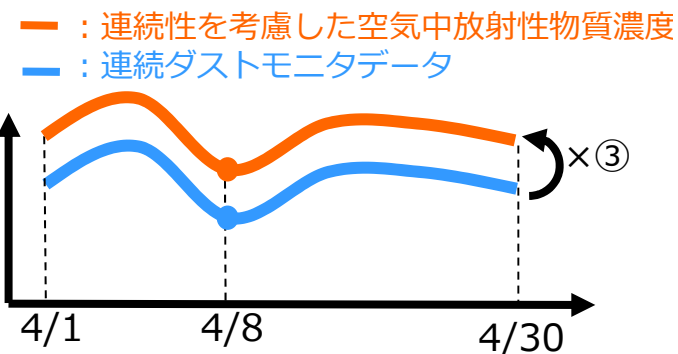


■ 評価方法

空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

■ 計算例

4月28日 北北西 2.1m/s

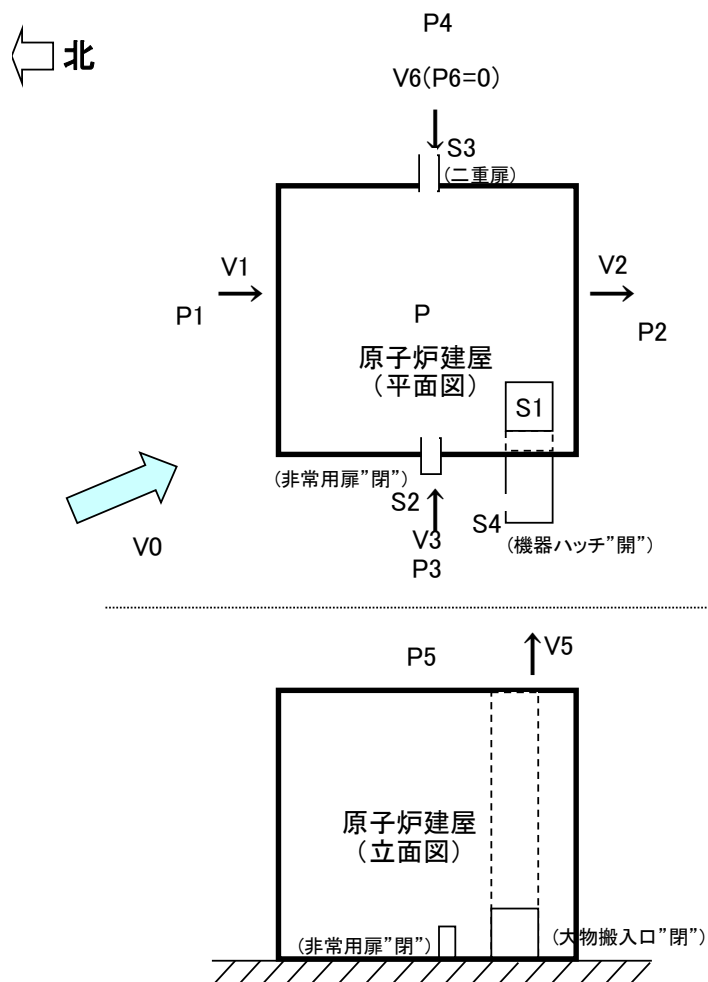

- V0: 外気風速(m/s)
- V1: 建屋流出入風速(m/s)
- V2: 建屋流出入風速(m/s)
- V3: 建屋流出入風速(m/s)
- V4: 建屋流出入風速(m/s)
- V5: 建屋流出入風速(m/s)
- V6: 建屋流出入風速(m/s)
- P1: 上流側圧力(北風)(Pa)
- P2: 下流側圧力(北風)(Pa)
- P3: 上流側圧力(西風)(Pa)
- P4: 下流側圧力(西風)(Pa)
- P5: 上面部圧力(Pa)
- P6: T/B内圧力(0Pa)
- P: 建屋内圧力(Pa)
- S1: 機器ハッチ隙間面積(m²)
- S2: R/B非常用扉開口面積(m²)
- S3: R/B二重扉開口面積(m²)
- S4: R/B大物搬入口横扉(m²)
- ρ : 空気密度(kg/m³)
- C1: 風圧係数(北風上側)
- C2: 風圧係数(北風下側)
- C3: 風圧係数(西風上側)
- C4: 風圧係数(西風下側)
- C5: 風圧係数(上面部)
- ζ : 形状抵抗係数

参考2 1号機建屋の漏洩率評価

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

$$\begin{aligned} \text{上流側(北風)} : P1 &= C1 \times \rho \times V0^2 / (2g) \quad \dots (1) \\ \text{下流側(北風)} : P2 &= C2 \times \rho \times V0^2 / (2g) \quad \dots (2) \\ \text{上流側(西風)} : P3 &= C3 \times \rho \times V0^2 / (2g) \quad \dots (3) \\ \text{下流側(西風)} : P4 &= C4 \times \rho \times V0^2 / (2g) \quad \dots (4) \\ \text{上面部} : P5 &= C5 \times \rho \times V0^2 / (2g) \quad \dots (5) \end{aligned}$$

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

$$\begin{aligned} P1 - P &= \zeta \times \rho \times V1^2 / (2g) \quad \dots (6) \\ P - P2 &= \zeta \times \rho \times V2^2 / (2g) \quad \dots (7) \\ P3 - P &= \zeta \times \rho \times V3^2 / (2g) \quad \dots (8) \\ P - P4 &= \zeta \times \rho \times V4^2 / (2g) \quad \dots (9) \\ P - P5 &= \zeta \times \rho \times V5^2 / (2g) \quad \dots (10) \\ P6 - P &= \zeta \times \rho \times V6^2 / (2g) \quad \dots (11) \end{aligned}$$

空気流出量のマスバランス式は

$$(V1 \times S4 + V3 \times S2 + V6 \times S3) \times 3600 = (V2 \times 0 + V4 \times 0 + V5 \times S1) \times 3600$$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$$Y = (V1 \times S4 + V3 \times S2 + V6 \times S3) \times 3600 - (V2 \times 0 + V4 \times 0 + V5 \times S1) \times 3600$$

V1, V2, V3, V4, V5, V6は(6), (7), (8), (9), (10), (11)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるようにPの値を調整する

| V0 (m/s) | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | ζ | ρ (kg/m ³) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|------|---------------------------|
| 2.05 | 0.80 | -0.50 | 0.10 | -0.50 | -0.40 | 2.00 | 1.20 |
| S1 (m ²) | S2 (m ²) | S3 (m ²) | S4 (m ²) | | | | |
| 25.48 | 0.00 | 0.29 | 0.10 | | | | |

| P1 (Pa) | P2 (Pa) | P3 (Pa) | P4 (Pa) | P5 (Pa) | P6 (Pa) | P (Pa) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0.205837 | -0.12865 | 0.02573 | -0.12865 | -0.10292 | 0 | -0.10288 |

| V1 (m/s) | V2 (m/s) | V3 (m/s) | V4 (m/s) | V5 (m/s) | V6 (m/s) | Y (m ³ /h) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 1.59 | 0.46 | 1.02 | 0.46 | 0.02 | 0.92 | 0.00 |
| IN | OUT | IN | OUT | OUT | IN | OK |

※IN : 流入
OUT: 流出

漏洩率

1,560 m³/h

週ごとの漏洩量評価（一例）

| | 4月22日 | | | 4月23日 | | | 4月24日 | | | 4月25日 | | | 4月26日 | | | 4月27日 | | | 4月28日 | | |
|--------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) |
| 西風 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 2.2 | 434 | 0.9 | 1.3 | 411 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 西北西風 | 1.6 | 0.5 | 1,031 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 801 | 0.9 | 2.0 | 587 | 3.0 | 0.5 | 1,995 |
| 北西風 | 2.6 | 0.3 | 1,823 | 1.5 | 1.0 | 1,049 | 1.3 | 1.3 | 912 | 2.3 | 1.2 | 1,614 | 1.6 | 3.2 | 1,163 | 1.0 | 0.7 | 715 | 1.7 | 2.7 | 1,197 |
| 北北西風 | 3.0 | 5.3 | 2,250 | 2.8 | 8.5 | 2,132 | 1.6 | 9.2 | 1,222 | 3.0 | 14.2 | 2,250 | 2.5 | 3.5 | 1,924 | 0.8 | 0.5 | 609 | 2.1 | 3.3 | 1,560 |
| 北風 | 3.3 | 3.5 | 2,493 | 3.6 | 10.5 | 2,746 | 1.7 | 3.8 | 1,330 | 3.1 | 6.2 | 2,353 | 1.9 | 1.8 | 1,481 | 1.1 | 0.3 | 799 | 2.1 | 1.8 | 1,605 |
| 北北東風 | 2.0 | 1.0 | 1,497 | 3.1 | 4.0 | 2,334 | 1.2 | 0.7 | 894 | 2.0 | 1.7 | 1,507 | 1.4 | 0.3 | 1,027 | 0.7 | 0.3 | 495 | 3.4 | 1.2 | 2,609 |
| 北東風 | 0.7 | 0.3 | 465 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1,052 | 1.7 | 0.7 | 1,233 | 1.5 | 1.3 | 1,072 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.6 | 1.8 | 2,606 |
| 東北東風 | 1.3 | 0.7 | 839 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.4 | 2.7 | 913 | 1.5 | 0.2 | 987 | 0.7 | 0.2 | 460 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.7 | 0.3 | 1,776 |
| 東風 | 1.3 | 0.7 | 623 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 576 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.1 | 0.7 | 529 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 799 |
| 東南東風 | 1.1 | 0.8 | 526 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 1.8 | 598 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.3 | 916 | 1.5 | 0.3 | 681 | 1.9 | 1.3 | 899 |
| 南東風 | 2.3 | 3.5 | 1,070 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 | 0.7 | 787 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.4 | 2.2 | 1,131 | 1.5 | 1.2 | 725 | 2.4 | 1.2 | 1,148 |
| 南南東風 | 3.2 | 5.7 | 1,487 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 2.0 | 1,175 | 3.9 | 5.2 | 1,828 | 3.7 | 1.8 | 1,717 |
| 南風 | 3.3 | 1.2 | 1,564 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.4 | 0.5 | 674 | 3.4 | 5.3 | 1,609 | 3.8 | 3.8 | 1,765 |
| 南南西風 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 611 | 2.6 | 2.7 | 1,222 | 3.0 | 2.7 | 1,386 |
| 南西風 | 0.8 | 0.2 | 376 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 443 | 2.3 | 1.0 | 1,089 | 1.3 | 1.0 | 627 |
| 西南西風 | 0.8 | 0.2 | 376 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 611 | 1.0 | 0.5 | 486 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 漏洩日量 (m3) | 39,034 | | | 57,340 | | | 24,160 | | | 51,766 | | | 24,415 | | | 26,626 | | | 37,658 | | |


16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

漏洩量合計

| 評価期間 | 4/1 ~ 4/7 | 4/8 ~ 4/14 | 4/15 ~ 4/21 | 4/22 ~ 4/28 | 4/29 ~ 4/30 | 漏洩量合計(m3) | 評価対象期間(h) | 漏洩率(m3/h) |
|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 週間漏洩量 (m3) | 243,268 | 252,614 | 208,095 | 260,998 | 90,640 | 1,055,615 | 720 | 1,466 |

端数処理をしているため記載の数値による計算が一致しない場合がある。

- 評価方法
空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。
- 計算例
4月28日 北北西 2.1m/s

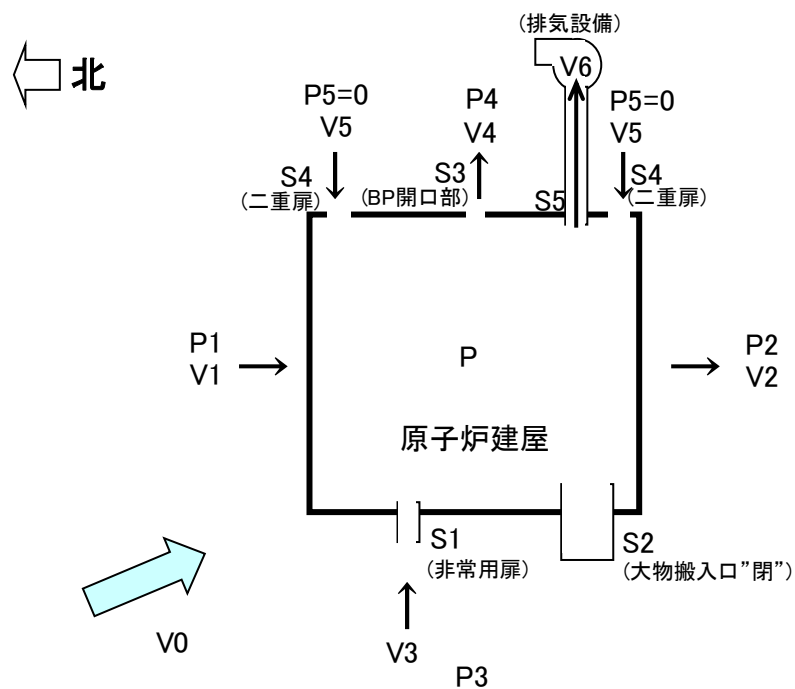

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: 建屋流出入風速 (m/s)
- V2: 建屋流出入風速 (m/s)
- V3: 建屋流出入風速 (m/s)
- V4: 建屋流出入風速 (m/s)
- V5: 建屋流出入風速 (m/s)
- V6: 排気風速 (m/s)
- P1: 上流側圧力 (北風) (Pa)
- P2: 下流側圧力 (北風) (Pa)
- P3: 上流側圧力 (西風) (Pa)
- P4: 下流側圧力 (西風) (Pa)
- P5: R/B内圧力 (0Pa)
- P: 建屋内圧力 (Pa)
- S1: 非常用扉開口面積 (m²)
- S2: 大物搬入口開口面積 (m²)
- S3: BP隙間面積 (m²)
- S4: R/B二重扉(南北)開口面積 (m²)
- S5: 排気ダクト面積 (m²)
- ρ : 空気密度 (kg/m³)
- C1: 風圧係数(北風上側)
- C2: 風圧係数(北風下側)
- C3: 風圧係数(西風上側)
- C4: 風圧係数(西風下側)
- ζ : 形状抵抗係数

参考3 2号機ブロアアウトパ° 初隙間の漏洩率評価

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

$$\text{上流側(北風)} : P1 = C1 \times \rho \times V0^2 / (2g) \quad \dots (1)$$

$$\text{下流側(北風)} : P2 = C2 \times \rho \times V0^2 / (2g) \quad \dots (2)$$

$$\text{上流側(西風)} : P3 = C3 \times \rho \times V0^2 / (2g) \quad \dots (3)$$

$$\text{下流側(西風)} : P4 = C4 \times \rho \times V0^2 / (2g) \quad \dots (4)$$

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

$$P1 - P = \zeta \times \rho \times V1^2 / (2g) \quad \dots (5)$$

$$P - P2 = \zeta \times \rho \times V2^2 / (2g) \quad \dots (6)$$

$$P3 - P = \zeta \times \rho \times V3^2 / (2g) \quad \dots (7)$$

$$P - P4 = \zeta \times \rho \times V4^2 / (2g) \quad \dots (8)$$

$$P5 - P = \zeta \times \rho \times V5^2 / (2g) \quad \dots (9)$$

空気流入量のマスバランス式は

$$(V1 \times 0 + V3 \times (S1 + S2) + V5 \times S4) \times 3600 = (V2 \times 0 + V4 \times S3 + V6 \times S5) \times 3600$$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$$Y = (V1 \times 0 + V3 \times (S1 + S2) + V5 \times S4) \times 3600 - (V2 \times 0 + V4 \times S3 + V6 \times S5) \times 3600$$

V1, V2, V3, V4, V5は(5), (6), (7), (8), (9)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるようにPの値を調整する

| V0 (m/s) | C1 | C2 | C3 | C4 | ζ | ρ (kg/m ³) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|---------------------------|
| 2.05 | 0.80 | -0.50 | 0.10 | -0.50 | 1.00 | 1.20 |
| S1 (m ²) | S2 (m ²) | S3 (m ²) | S4 (m ²) | S5 (m ²) | | |
| 2.075 | 0.000 | 3.500 | 4.150 | 0.500 | | |

| P1 (Pa) | P2 (Pa) | P3 (Pa) | P4 (Pa) | P5 (Pa) | P (Pa) |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0.205837 | -0.12865 | 0.02573 | -0.12865 | 0 | -0.04117 |

| V1 (m/s) | V2 (m/s) | V3 (m/s) | V4 (m/s) | V5 (m/s) | V6 (m/s) | Y (m ³ /h) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 2.01 | 1.20 | 1.05 | 1.20 | 0.82 | 2.78 | 0.00 |
| IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT(排気) | OK |

※IN : 流入

OUT: 流出

漏洩率

15,061 m³/h

週ごとの漏洩量評価（一例）

| | 4月22日 | | | 4月23日 | | | 4月24日 | | | 4月25日 | | | 4月26日 | | | 4月27日 | | | 4月28日 | | |
|--------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) |
| 西風 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 2.2 | 6,229 | 0.9 | 1.3 | 5,822 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 西北西風 | 1.6 | 0.5 | 12,746 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 9,622 | 0.9 | 2.0 | 6,648 | 3.0 | 0.5 | 25,715 |
| 北西風 | 2.6 | 0.3 | 20,537 | 1.5 | 1.0 | 11,242 | 1.3 | 1.3 | 9,580 | 2.3 | 1.2 | 18,034 | 1.6 | 3.2 | 12,620 | 1.0 | 0.7 | 7,174 | 1.7 | 2.7 | 13,039 |
| 北北西風 | 3.0 | 5.3 | 22,348 | 2.8 | 8.5 | 21,109 | 1.6 | 9.2 | 11,468 | 3.0 | 14.2 | 22,350 | 2.5 | 3.5 | 18,913 | 0.8 | 0.5 | 4,839 | 2.1 | 3.3 | 15,061 |
| 北風 | 3.3 | 3.5 | 21,499 | 3.6 | 10.5 | 24,024 | 1.7 | 3.8 | 9,812 | 3.1 | 6.2 | 20,095 | 1.9 | 1.8 | 11,332 | 1.1 | 0.3 | 4,372 | 2.1 | 1.8 | 12,588 |
| 北北東風 | 2.0 | 1.0 | 9,981 | 3.1 | 4.0 | 15,797 | 1.2 | 0.7 | 5,755 | 2.0 | 1.7 | 10,052 | 1.4 | 0.3 | 6,695 | 0.7 | 0.3 | 2,870 | 3.4 | 1.2 | 17,706 |
| 北東風 | 0.7 | 0.3 | 3,222 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 1.2 | 7,770 | 1.7 | 0.7 | 9,575 | 1.5 | 1.3 | 7,922 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.6 | 1.8 | 25,405 |
| 東北東風 | 1.3 | 0.7 | 9,227 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.4 | 2.7 | 10,436 | 1.5 | 0.2 | 11,641 | 0.7 | 0.2 | 3,678 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.7 | 0.3 | 24,384 |
| 東風 | 1.3 | 0.7 | 9,683 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 8,619 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.1 | 0.7 | 7,551 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 13,649 |
| 東南東風 | 1.1 | 0.8 | 7,551 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 1.8 | 9,203 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.3 | 16,436 | 1.5 | 0.3 | 11,106 | 1.9 | 1.3 | 16,037 |
| 南東風 | 2.3 | 3.5 | 14,158 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 | 0.7 | 9,155 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.4 | 2.2 | 15,244 | 1.5 | 1.2 | 8,149 | 2.4 | 1.2 | 15,534 |
| 南南東風 | 3.2 | 5.7 | 16,314 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 2.0 | 12,805 | 3.9 | 5.2 | 20,139 | 3.7 | 1.8 | 18,896 |
| 南風 | 3.3 | 1.2 | 21,898 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.4 | 0.5 | 7,379 | 3.4 | 5.3 | 22,632 | 3.8 | 3.8 | 25,154 |
| 南南西風 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 8,983 | 2.6 | 2.7 | 19,487 | 3.0 | 2.7 | 22,298 |
| 南西風 | 0.8 | 0.2 | 5,394 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 6,669 | 2.3 | 1.0 | 18,543 | 1.3 | 1.0 | 10,087 |
| 西南西風 | 0.8 | 0.2 | 5,798 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 10,358 | 1.0 | 0.5 | 7,946 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 漏洩日量 (m3) | 407,021 | | | 506,110 | | | 230,707 | | | 486,653 | | | 263,036 | | | 343,118 | | | 438,666 | | |

16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

漏洩量合計

| 評価期間 | 4/1 ~ 4/7 | 4/8 ~ 4/14 | 4/15 ~ 4/21 | 4/22 ~ 4/28 | 4/29 ~ 4/30 | 漏洩量合計(m3) | 評価対象期間(h) | 漏洩率(m3/h) |
|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 週間漏洩量 (m3) | 2,430,004 | 3,181,869 | 2,427,155 | 2,675,310 | 1,251,669 | 11,966,008 | 720 | 16,619 |

端数処理をしているため記載の数値による計算が一致しない場合がある。


参考4 3号機原子炉建屋機器ハッチの漏洩率評価

■ 評価方法

空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

■ 計算例

4月28日 北北西 2.1m/s

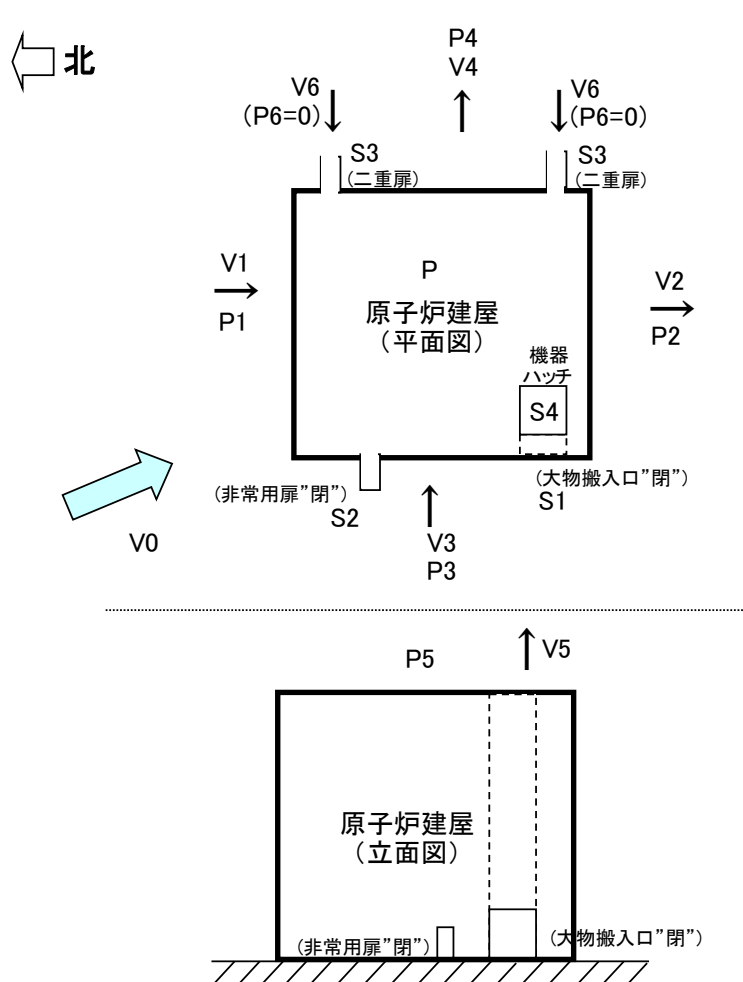

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: 建屋流出入風速 (m/s)
- V2: 建屋流出入風速 (m/s)
- V3: 建屋流出入風速 (m/s)
- V4: 建屋流出入風速 (m/s)
- V5: 建屋流出入風速 (m/s)
- V6: 建屋流出入風速 (m/s)
- P1: 上流側圧力 (北) (Pa)
- P2: 下流側圧力 (南) (Pa)
- P3: 上流側圧力 (西) (Pa)
- P4: 下流側圧力 (東) (Pa)
- P5: 上面部圧力 (Pa)
- P6: T/B内圧力 (0Pa)
- P: 建屋内圧力 (Pa)
- S1: R/B大物搬入口面積 (m²)
- S2: R/B非常用扉開口面積 (m²)
- S3: R/B二重扉開口面積 (m²)
- S4: 機器ハッチ隙間面積 (m²)
- ρ : 空気密度 (kg/m³)
- C1: 風圧係数 (北)
- C2: 風圧係数 (南)
- C3: 風圧係数 (西)
- C4: 風圧係数 (東)
- C5: 風圧係数 (上面部)
- ζ : 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

- 上流側(北) : $P1=C1 \times \rho \times V0^2/(2g)$... (1)
- 下流側(南) : $P2=C2 \times \rho \times V0^2/(2g)$... (2)
- 上流側(西) : $P3=C3 \times \rho \times V0^2/(2g)$... (3)
- 下流側(東) : $P4=C4 \times \rho \times V0^2/(2g)$... (4)
- 上面部 : $P5=C5 \times \rho \times V0^2/(2g)$... (5)

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

- $P1-P=\zeta \times \rho \times V1^2/(2g)$... (6)
- $P-P2=\zeta \times \rho \times V2^2/(2g)$... (7)
- $P3-P=\zeta \times \rho \times V3^2/(2g)$... (8)
- $P-P4=\zeta \times \rho \times V4^2/(2g)$... (9)
- $P-P5=\zeta \times \rho \times V5^2/(2g)$... (10)
- $P6-P=\zeta \times \rho \times V6^2/(2g)$... (11)

空気流出入量のマスバランス式は

$$(V1 \times 0 + V3 \times (S1 + S2) + V6 \times S3) \times 3600 = (V2 \times 0 + V4 \times 0 + V5 \times S4) \times 3600$$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$$Y = (V1 \times 0 + V3 \times (S1 + S2) + V6 \times S3) \times 3600 - (V2 \times 0 + V4 \times 0 + V5 \times S4) \times 3600$$

V1～V6は(6)～(11)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるように

Pの値を調整する

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|------|---------------------------|
| V0 (m/s) | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | ζ | ρ (kg/m ³) |
| 2.05 | 0.80 | -0.50 | 0.10 | -0.50 | -0.40 | 2.00 | 1.20 |
| S1 (m ²) | S2 (m ²) | S3 (m ²) | S4 (m ²) | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 6.05 | 1.01 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| P1 (Pa) | P2 (Pa) | P3 (Pa) | P4 (Pa) | P5 (Pa) | P6 (Pa) | P (Pa) |
| 0.205837 | -0.12865 | 0.02573 | -0.12865 | -0.10292 | 0 | -0.0028 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| V1 (m/s) | V2 (m/s) | V3 (m/s) | V4 (m/s) | V5 (m/s) | V6 (m/s) | Y (m ³ /h) |
| 1.31 | 1.01 | 0.48 | 1.01 | 0.90 | 0.15 | 0.00 |
| IN | OUT | IN | OUT | OUT | IN | OK |

※IN : 流入

OUT: 流出

漏洩率

3,288 m³/h

週ごとの漏洩量評価（一例）

| | 4月22日 | | | 4月23日 | | | 4月24日 | | | 4月25日 | | | 4月26日 | | | 4月27日 | | | 4月28日 | | |
|--------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) |
| 西風 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 2.2 | 1,480 | 0.9 | 1.3 | 1,403 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 西北西風 | 1.6 | 0.5 | 2,513 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1,954 | 0.9 | 2.0 | 1,430 | 3.0 | 0.5 | 4,865 |
| 北西風 | 2.6 | 0.3 | 4,090 | 1.5 | 1.0 | 2,352 | 1.3 | 1.3 | 2,045 | 2.3 | 1.2 | 3,620 | 1.6 | 3.2 | 2,608 | 1.0 | 0.7 | 1,604 | 1.7 | 2.7 | 2,686 |
| 北北西風 | 3.0 | 5.3 | 4,741 | 2.8 | 8.5 | 4,494 | 1.6 | 9.2 | 2,575 | 3.0 | 14.2 | 4,742 | 2.5 | 3.5 | 4,055 | 0.8 | 0.5 | 1,283 | 2.1 | 3.3 | 3,288 |
| 北風 | 3.3 | 3.5 | 5,254 | 3.6 | 10.5 | 5,787 | 1.7 | 3.8 | 2,803 | 3.1 | 6.2 | 4,959 | 1.9 | 1.8 | 3,120 | 1.1 | 0.3 | 1,684 | 2.1 | 1.8 | 3,383 |
| 北北東風 | 2.0 | 1.0 | 3,154 | 3.1 | 4.0 | 4,918 | 1.2 | 0.7 | 1,885 | 2.0 | 1.7 | 3,176 | 1.4 | 0.3 | 2,165 | 0.7 | 0.3 | 1,042 | 3.4 | 1.2 | 5,499 |
| 北東風 | 0.7 | 0.3 | 1,042 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 1.2 | 2,360 | 1.7 | 0.7 | 2,767 | 1.5 | 1.3 | 2,406 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.6 | 1.8 | 5,847 |
| 東北東風 | 1.3 | 0.7 | 2,045 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.4 | 2.7 | 2,225 | 1.5 | 0.2 | 2,406 | 0.7 | 0.2 | 1,123 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.7 | 0.3 | 4,330 |
| 東風 | 1.3 | 0.7 | 2,125 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1,965 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1,804 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 2,727 |
| 東南東風 | 1.1 | 0.8 | 1,796 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 1.8 | 2,041 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.3 | 3,127 | 1.5 | 0.3 | 2,326 | 1.9 | 1.3 | 3,067 |
| 南東風 | 2.3 | 3.5 | 3,651 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 | 0.7 | 2,686 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.4 | 2.2 | 3,862 | 1.5 | 1.2 | 2,474 | 2.4 | 1.2 | 3,918 |
| 南南東風 | 3.2 | 5.7 | 5,076 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 2.0 | 4,010 | 3.9 | 5.2 | 6,239 | 3.7 | 1.8 | 5,861 |
| 南風 | 3.3 | 1.2 | 5,338 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.4 | 0.5 | 2,299 | 3.4 | 5.3 | 5,493 | 3.8 | 3.8 | 6,025 |
| 南南西風 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 2,085 | 2.6 | 2.7 | 4,170 | 3.0 | 2.7 | 4,731 |
| 南西風 | 0.8 | 0.2 | 1,283 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1,512 | 2.3 | 1.0 | 3,716 | 1.3 | 1.0 | 2,138 |
| 西南西風 | 0.8 | 0.2 | 1,283 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 2,085 | 1.0 | 0.5 | 1,657 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 漏洩日量 (m3) | 102,271 | | | 120,983 | | | 55,172 | | | 109,515 | | | 63,058 | | | 88,211 | | | 103,046 | | |

16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

漏洩量合計

| 評価期間 | 4/1 ~ 4/7 | 4/8 ~ 4/14 | 4/15 ~ 4/21 | 4/22 ~ 4/28 | 4/29 ~ 4/30 | 漏洩量合計(m3) | 評価対象期間(h) | 漏洩率(m3/h) |
|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 週間漏洩量 (m3) | 605,448 | 702,507 | 577,007 | 642,256 | 308,578 | 2,835,797 | 720 | 3,939 |

端数処理をしているため記載の数値による計算が一致しない場合がある。


参考5 4号機燃料取出し用カバーの漏洩率評価

■ 評価方法

空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

■ 計算例

4月28日 北北西 2.1m/s

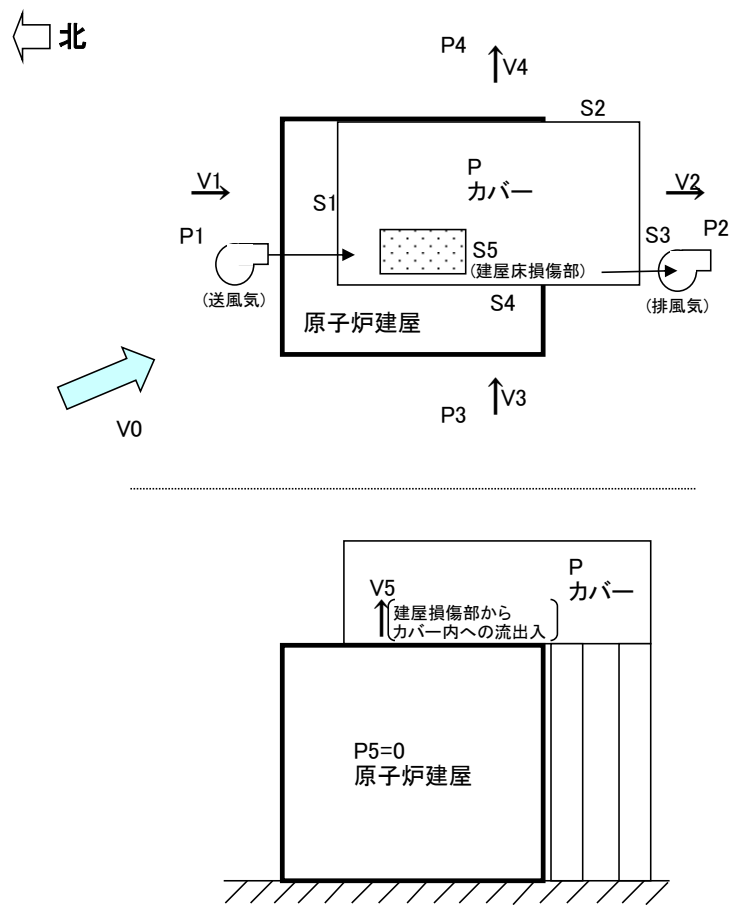

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: カバー内流入風速 (m/s)
- V2: カバー内流出風速 (m/s)
- V3: カバー内流出風速 (m/s)
- V4: カバー内流出風速 (m/s)
- V5: カバー内流出風速 (m/s)
- P: カバー内圧力 (Pa)
- P1: 上流側圧力(北風) (Pa)
- P2: 下流側圧力(北風) (Pa)
- P3: 上流側圧力(西風) (Pa)
- P4: 下流側圧力(西風) (Pa)
- P5: R/B内圧力 (0Pa)
- S1: カバー隙間面積 (m²)
- S2: カバー隙間面積 (m³)
- S3: カバー隙間面積 (m⁴)
- S4: カバー隙間面積 (m⁵)
- S5: 建屋床損傷部隙間面積 (m²)
- ρ: 空気密度 (kg/m³)
- C1: 風圧係数(北風上側)
- C2: 風圧係数(北風下側)
- C3: 風圧係数(西風上側)
- C4: 風圧係数(西風下側)
- ζ: 形状抵抗係数

参考5 4号機燃料取出し用カバーの漏洩率評価

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

$$\text{上流側(北風)}: P1 = C1 \times \rho \times V0^2 / (2g) \quad \dots (1)$$

$$\text{下流側(北風)}: P2 = C2 \times \rho \times V0^2 / (2g) \quad \dots (2)$$

$$\text{上流側(西風)}: P3 = C3 \times \rho \times V0^2 / (2g) \quad \dots (3)$$

$$\text{下流側(西風)}: P4 = C4 \times \rho \times V0^2 / (2g) \quad \dots (4)$$

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

$$P1 - P = \zeta \times \rho \times V1^2 / (2g) \quad \dots (5)$$

$$P - P2 = \zeta \times \rho \times V2^2 / (2g) \quad \dots (6)$$

$$P3 - P = \zeta \times \rho \times V3^2 / (2g) \quad \dots (7)$$

$$P - P4 = \zeta \times \rho \times V4^2 / (2g) \quad \dots (8)$$

$$P5 - P = \zeta \times \rho \times V5^2 / (2g) \quad \dots (9)$$

空気流出入量のマスバランス式は

$$(V1 \times S1 + V3 \times S4 + V5 \times S5) \times 3600 = (V2 \times S3 + V4 \times S2) \times 3600$$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$$Y = (V1 \times S1 + V3 \times S4 + V5 \times S5) \times 3600 - (V2 \times S3 + V4 \times S2) \times 3600$$

V1, V2, V3, V4, V5は(5), (6), (7), (8), (9)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるように

Pの値を調整する

| V0 (m/s) | C1 | C2 | C3 | C4 | ζ | ρ (kg/m ³) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|---------------------------|
| 2.05 | 0.80 | -0.50 | 0.10 | -0.50 | 2.00 | 1.20 |
| S1 (m ²) | S2 (m ²) | S3 (m ²) | S4 (m ²) | S5 (m ²) | | |
| 0.44 | 0.81 | 0.46 | 0.81 | 4.00 | | |

| P1 (Pa) | P2 (Pa) | P3 (Pa) | P4 (Pa) | P5 (Pa) | P (Pa) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0.205837 | -0.12865 | 0.02573 | -0.12865 | 0 | -0.00088 |

| V1 (m/s) | V2 (m/s) | V3 (m/s) | V4 (m/s) | V5 (m/s) | Y (m ³ /h) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 1.30 | 1.02 | 0.47 | 1.02 | 0.08 | 0.00 |
| IN | OUT | IN | OUT | IN | OK |

※IN : 流入

OUT: 流出

漏洩率

4,641 m³/h

参考5 4号機燃料取出し用カバーの漏洩率評価



週ごとの漏洩量評価（一例）

| | 4月22日 | | | 4月23日 | | | 4月24日 | | | 4月25日 | | | 4月26日 | | | 4月27日 | | | 4月28日 | | |
|--------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) | 風速 (m/s) | 時間 (hr) | 漏洩率 (m3/h) |
| 西風 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 2.2 | 2,509 | 0.9 | 1.3 | 2,378 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 西北西風 | 1.6 | 0.5 | 3,559 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 2,767 | 0.9 | 2.0 | 2,025 | 3.0 | 0.5 | 6,890 |
| 北西風 | 2.6 | 0.3 | 5,791 | 1.5 | 1.0 | 3,331 | 1.3 | 1.3 | 2,896 | 2.3 | 1.2 | 5,126 | 1.6 | 3.2 | 3,694 | 1.0 | 0.7 | 2,271 | 1.7 | 2.7 | 3,804 |
| 北北西風 | 3.0 | 5.3 | 6,692 | 2.8 | 8.5 | 6,343 | 1.6 | 9.2 | 3,634 | 3.0 | 14.2 | 6,693 | 2.5 | 3.5 | 5,724 | 0.8 | 0.5 | 1,811 | 2.1 | 3.3 | 4,641 |
| 北風 | 3.3 | 3.5 | 10,300 | 3.6 | 10.5 | 11,343 | 1.7 | 3.8 | 5,495 | 3.1 | 6.2 | 9,721 | 1.9 | 1.8 | 6,116 | 1.1 | 0.3 | 3,301 | 2.1 | 1.8 | 6,631 |
| 北北東風 | 2.0 | 1.0 | 4,452 | 3.1 | 4.0 | 6,942 | 1.2 | 0.7 | 2,660 | 2.0 | 1.7 | 4,482 | 1.4 | 0.3 | 3,056 | 0.7 | 0.3 | 1,471 | 3.4 | 1.2 | 7,762 |
| 北東風 | 0.7 | 0.3 | 1,476 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 1.2 | 3,342 | 1.7 | 0.7 | 3,918 | 1.5 | 1.3 | 3,407 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.6 | 1.8 | 8,279 |
| 東北東風 | 1.3 | 0.7 | 2,896 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.4 | 2.7 | 3,152 | 1.5 | 0.2 | 3,407 | 0.7 | 0.2 | 1,590 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.7 | 0.3 | 6,133 |
| 東風 | 1.3 | 0.7 | 3,601 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 3,329 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.1 | 0.7 | 3,058 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 4,620 |
| 東南東風 | 1.1 | 0.8 | 2,514 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 1.8 | 2,857 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.3 | 4,377 | 1.5 | 0.3 | 3,255 | 1.9 | 1.3 | 4,293 |
| 南東風 | 2.3 | 3.5 | 5,109 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 | 0.7 | 3,759 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.4 | 2.2 | 5,404 | 1.5 | 1.2 | 3,463 | 2.4 | 1.2 | 5,483 |
| 南南東風 | 3.2 | 5.7 | 7,084 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 2.0 | 5,596 | 3.9 | 5.2 | 8,708 | 3.7 | 1.8 | 8,180 |
| 南風 | 3.3 | 1.2 | 10,417 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.4 | 0.5 | 4,486 | 3.4 | 5.3 | 10,719 | 3.8 | 3.8 | 11,756 |
| 南南西風 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 2,910 | 2.6 | 2.7 | 5,820 | 3.0 | 2.7 | 6,603 |
| 南西風 | 0.8 | 0.2 | 1,796 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 2,116 | 2.3 | 1.0 | 5,200 | 1.3 | 1.0 | 2,993 |
| 西南西風 | 0.8 | 0.2 | 1,796 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 2,918 | 1.0 | 0.5 | 2,319 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 漏洩日量 (m3) | 157,596 | | | 204,120 | | | 84,500 | | | 171,391 | | | 93,786 | | | 140,392 | | | 161,048 | | |


16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

漏洩量合計

| 評価期間 | 4/1 ~ 4/7 | 4/8 ~ 4/14 | 4/15 ~ 4/21 | 4/22 ~ 4/28 | 4/29 ~ 4/30 | 漏洩量合計(m3) | 評価対象期間(h) | 漏洩率(m3/h) |
|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 週間漏洩量 (m3) | 948,615 | 1,096,343 | 897,847 | 1,012,833 | 528,925 | 4,484,563 | 720 | 6,229 |

端数処理をしているため記載の数値による計算が一致しない場合がある。

- 低いレベルで安定。

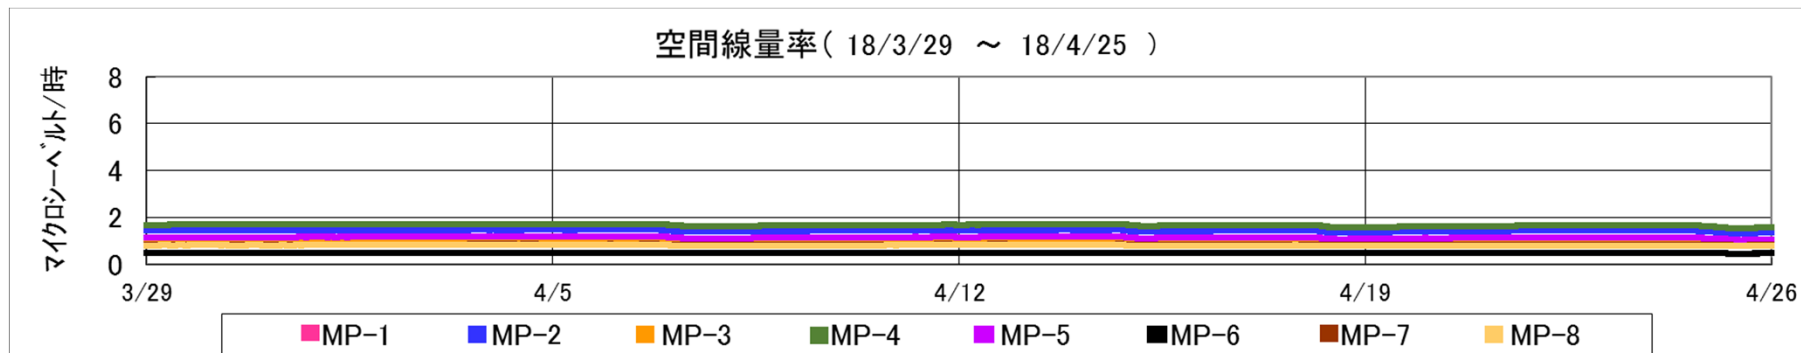

- 大きな上昇はなく、低濃度で安定。

