

労働環境改善スケジュール

分野	語り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		11月						12月						1月			2月	3月	4月	5月	6月以降	備考
			24	8	15	22	29	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
防護装備	1	防護装備の適正化検討  (実績) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 (予定) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る	現場作業	DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進																		(継続実施)			
	2	ヒューマンエラー発生防止  (実績) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等 (予定) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等	現場作業	協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等																		(継続実施)	四半期毎に実施している不適合やヒューマンエラーの分析結果を踏まえ、安全衛生推進協議会にて四半期に一回程度、協力企業に対しヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等を啓発		
人身安全	3	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握  (実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・福島第一原子力発電所における熱中症予防対策の実施状況の報告 (予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等）	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価 福島第一原子力発電所における熱中症予防対策の実施状況の報告(11/28)																		(継続実施)			
	4	長期健康管理の実施  (実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2024年度対象者（社員）への「白内障検査」（本社）実施 (予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き	現場作業	健康相談受付 【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き 社員・白内障検査(本社)																		(継続実施)			
健康管理	5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化  (実績) ・1F救急医療室の勤務医師調整 (予定) ・1F救急医療室の勤務医師調整	検討・設計	1F救急医療室の勤務医師調整																		(継続実施)			
	6	感染症対策の実施  (実績) ・インフルエンザ予防接種の実施 (予定) ・インフルエンザ予防接種の実施	現場作業	インフルエンザ予防接種の実施																					
要員管理、労働環境改善	7	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握  (実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 (予定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計	作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計																		(継続実施)			
	8	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み  (実績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握 (予定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																		(継続実施)			
			現場作業	作業員へのアンケート(第15回)																		公表(1月下旬) ▽			








活 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		11月	12月				1月			2月	3月	4月	5月	6月以降	備 考
		24	8	15	22	29	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	

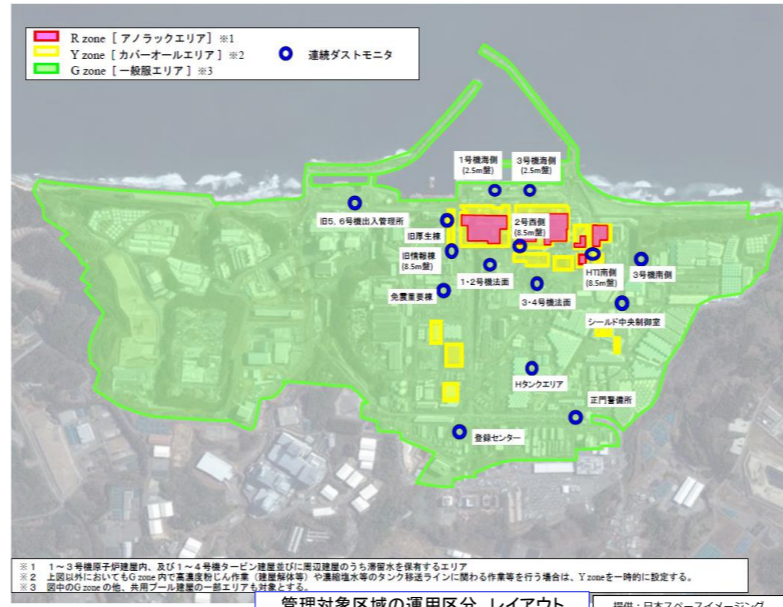
廃炉中長期実行プラン2024

年度	2023(実績)	2024	2025	2026	2029	2035
その他		管理対象区域内の企業棟整備 (計画的に順次整備する)				

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

<凡例>

-  : 作業の期間
-  : 変更が見込まれる期間
-  : 工程間の関連
-  : 追加した工程
-  : 変更/具体化した工程
-  : 実施を取り止めた工程
-  : リスクマップに関連する工程



※1 1〜3号機原子炉建屋内、及び1〜4号機タービン建屋並びに周辺建屋のうち汚濁水を保持するエリア  
 ※2 上面以外においてもG zone 内で作業を行う場合（除塵器稼働時）や高圧配管等のタンク移送ラインに隣接する作業等を行う場合は、Y zoneを一時的に設定する。  
 ※3 図中のG zoneの部、共用プール建屋の一部エリアも対象とする。
