


福島第一原子力発電所 完成型汚染水貯蔵タンク 搬入・据付作業について



< 参考資料 >
平成26年4月16日
東京電力株式会社

作業概要



- 福島第一原子力発電所への完成型タンク搬入・据付の流れ
新規製作の完成型タンクを工場より福島第一原子力発電所まで台船にて海上輸送。
福島第一原子力発電所港湾内にて水切り後、タンク設置エリアへ運搬。
タンク設置エリアにて荷下ろし・据付。

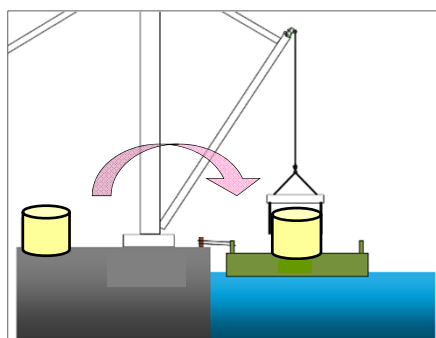



工場出荷

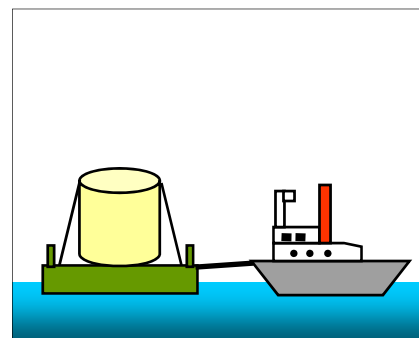

海上輸送（4～6基/回）

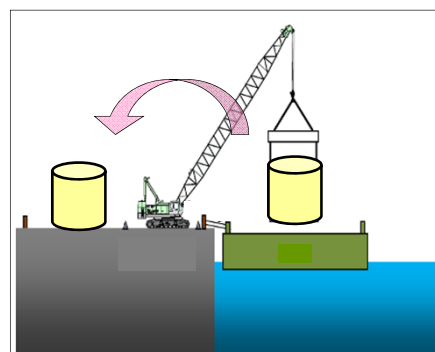

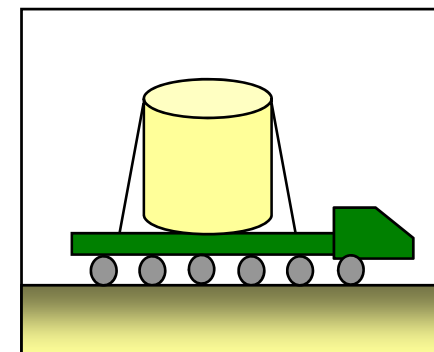

1 F 物揚場水切り



1 F 構内運搬（1基/日）

参考：作業工程

G7エリア用タンク6 据付え付け作業工程（案）～天候等により変更の場合有り～

	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23
受け入れ 構内輸送								
据付設置								

参考：G7エリア用タンク写真

