
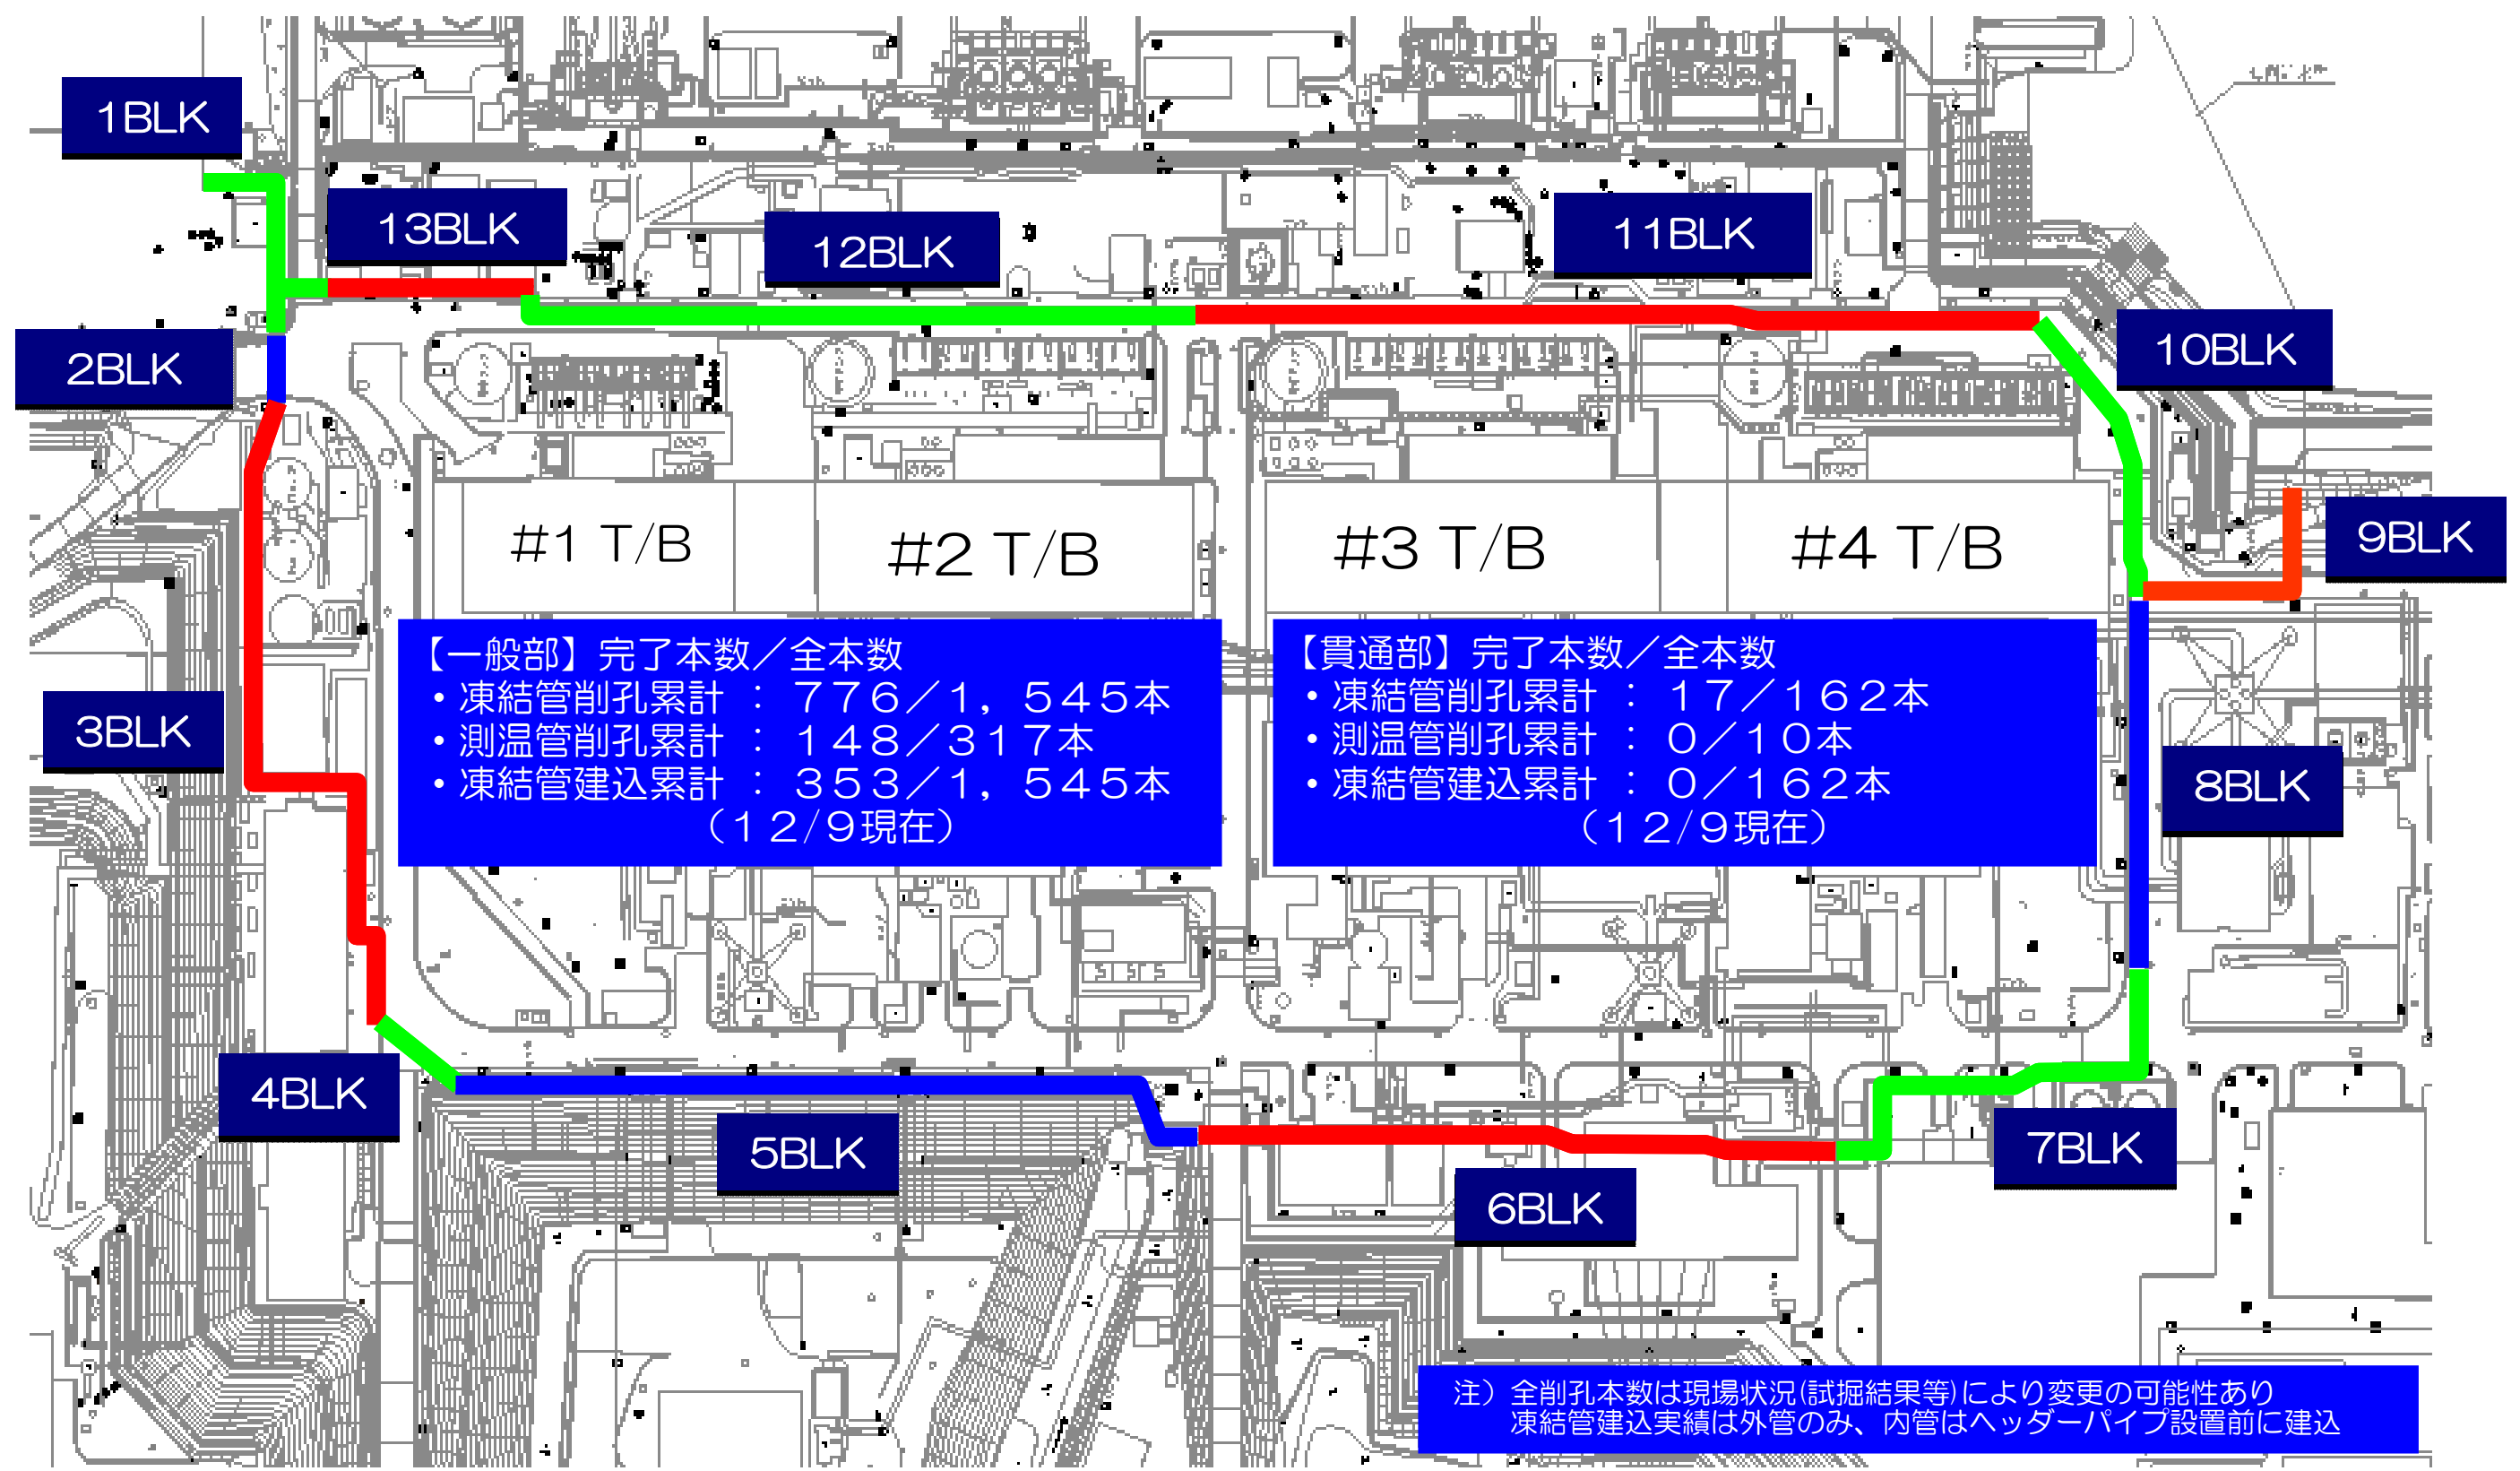


凍土遮水壁 凍結管・測温管削孔ならびに凍結管建込実績



【一般部】完了本数／全本数
 ・凍結管削孔累計：776／1,545本
 ・測温管削孔累計：148／317本
 ・凍結管建込累計：353／1,545本
 (12/9現在)

【貫通部】完了本数／全本数
 ・凍結管削孔累計：17／162本
 ・測温管削孔累計：0／10本
 ・凍結管建込累計：0／162本
 (12/9現在)

注) 全削孔本数は現場状況(試掘結果等)により変更の可能性あり
 凍結管建込実績は外管のみ、内管はヘッダーパイプ設置前に建込

1 一般部:埋設物のない箇所
 2 貫通部:埋設物と干渉する箇所
