

柏崎刈羽原子力発電所
各号機の設備健全性に係る
点検・評価の実施状況について


平成22年12月28日



東京電力

プラント全体の健全性確認の流れ

- 新潟県中越沖地震に伴う健全性評価

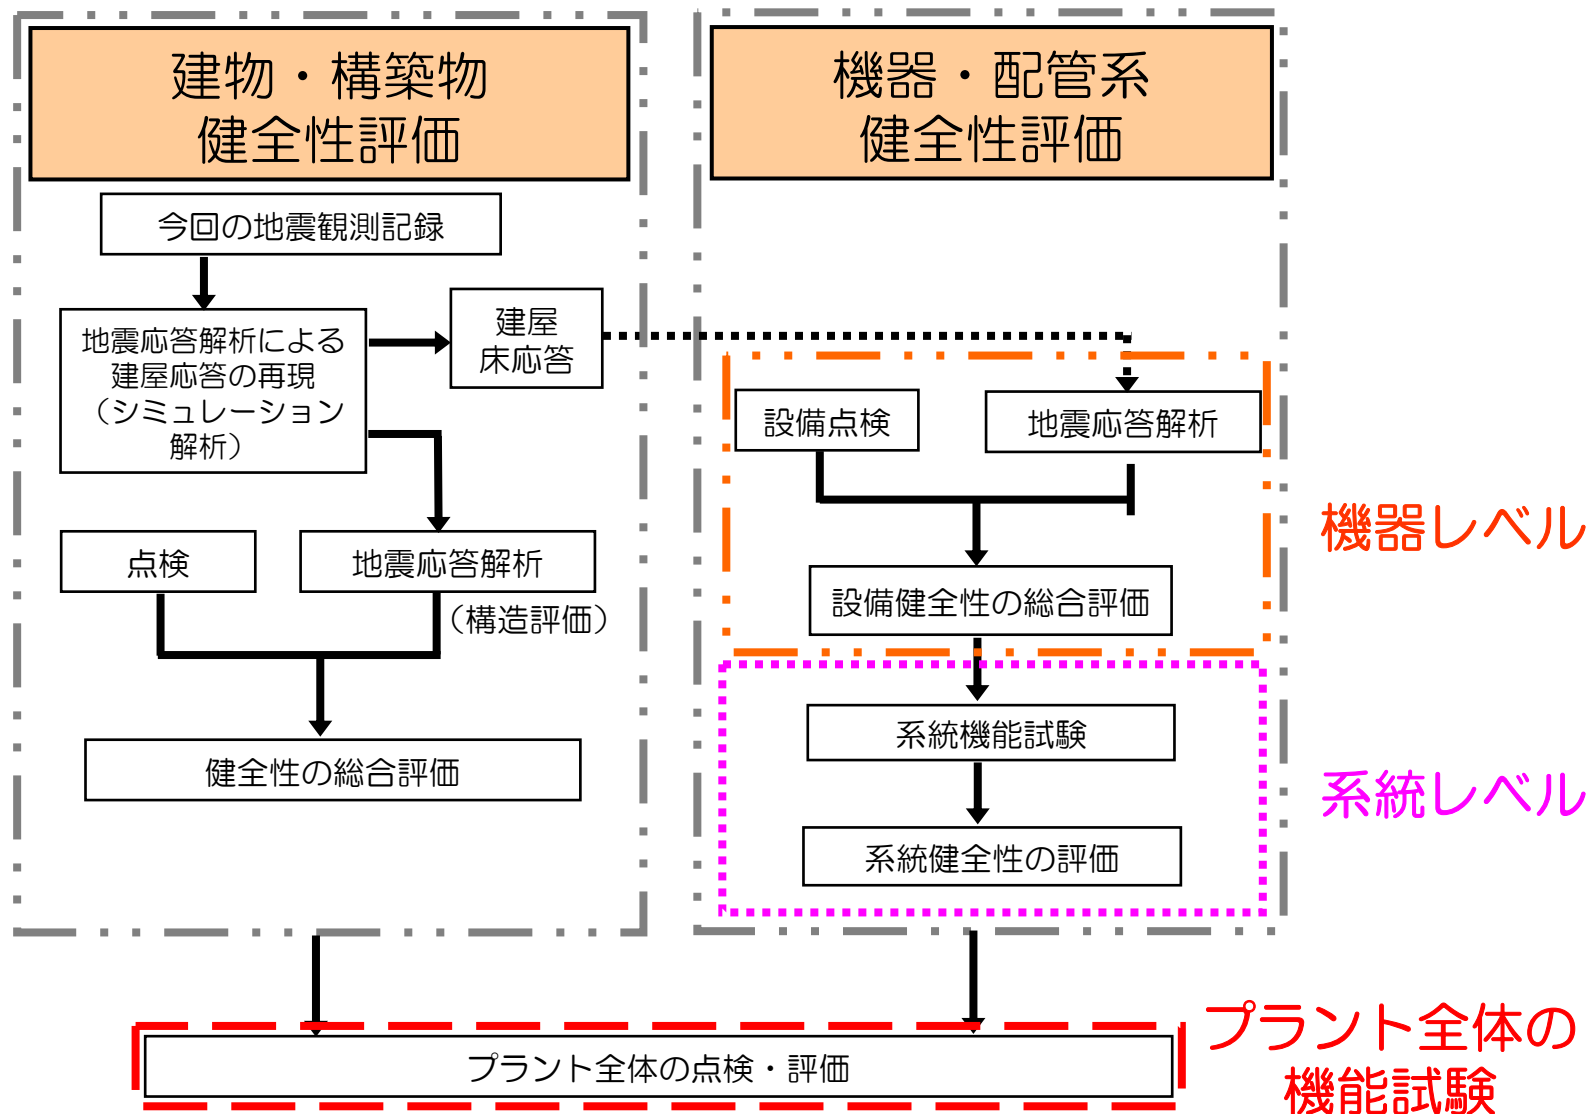

各号機の健全性確認進捗状況

H22.12.24 現在

			【設備点検】点検完了機器数/点検対象機器数 [点検対象機器数は概数]					最終報告書提出 (提出日: 青字) により完了とする	
			【系統機能試験】系統機能試験完了数/系統機能試験数 (進捗率%)						
			1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機
蒸気発生前	機器レベル (設備点検)	目視点検	2,001/2,001 (完了) H22.2.19	670/1,590 (42%)	1,580/1,580 (100%)	1,410/1,680 (84%)	1,963/1,963 (完了) H22.6.9	1,538/1,538 (完了) H21.6.23	1,362/1,362 (完了) H21.2.12
		作動機能確認	1,461/1,461 (完了) H22.2.19	430/1,170 (37%)	1,100/1,160 (95%)	480/1,300 (37%)	1,498/1,498 (完了) H22.6.9	1,144/1,144 (完了) H21.6.23	1,001/1,001 (完了) H21.2.12
		漏えい試験	1,014/1,014 (完了) H22.2.19	200/730 (27%)	530/700 (76%)	220/650 (34%)	841/841 (完了) H22.6.9	719/719 (完了) H21.6.23	616/616 (完了) H21.2.12
	系統レベル (系統機能試験)	31/31 (完了) H22.2.19	—	10/26	—	29/29 (完了) H22.6.9	26/26 (完了) H21.6.23	23/23 (完了) H21.2.12	
蒸気発生後	設備点検	90/90 (完了) H22.7.7	—	—	—	実施中	105/105 (完了) H21.10.1	106/106 (完了) H21.6.23	
	系統機能試験	4/4 (完了) H22.7.7	—	—	—	実施中	4/4 (完了) H21.10.1	4/4 (完了) H21.6.23	
プラントの状況 ※ 営業運転再開日			運転中 H22.8.4※	停止中	停止中	停止中	プラント全体の機能試験・評価実施中	定検中 H22.1.19※	運転中 H21.12.28※
備考			第16サイクル 運転中					第9回定検 H22.10.31~ H23.1.14	第10サイクル 運転中

: 最終報告書提出前
 : 最終報告書提出後
 : 地震後に営業運転を再開した号機
