

# 福島第二原子力発電所に係留中のバージ船2隻の解体作業の工程見直しについて

- 係留中のバージ船 2 隻について、定期的な船体確認を行ってきましたが、この度、解体スケジュールが決まったことから、お知らせいたします。
- 解体については、淡水を回収した後、陸上で解体（船上機材撤去含む）を行います。
- 回収した淡水については、防火用水・伐採木の予防散水用として活用するため、油分除去の処理を実施した上で、発電所構内の貯留池へ移送します。
- 現場作業は2023年12月1日に着手し、解体は2024年3月下旬に完了する予定です。  
(2023年11月29日公表済み)

- ◆ 係留中のバージ船 2 隻の解体については、2024年3月下旬に完了予定でありましたが、バージ船を陸揚げするための起重機船が、海象条件等が合わず入港できない状況が継続しておりました。
- ◆ 今後の作業にあっても、海象条件に影響される可能性がある事、また、起重機船の点検時期が迫っており、別の起重機船の手配が必要となったことから、解体作業の工程を見直すことといたしました。
- ◆ バージ船解体については、現時点で7月頃の完了を予定しておりますが、海象条件に左右されることから、完了後改めてお知らせいたします。
- ◆ なお、船内の淡水については油分除去を行い、2023年12月27日、発電所構内の貯留池に移送を完了しております。
- ◆ 作業にあたっては引き続き安全を最優先に進めてまいります。

# 解体スケジュール

	2023年度				2024年度			
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
現場作業着手	▼ 1日							
淡水回収作業	■							
船上機材撤去		■						
バージ船解体			■ (見直し)			■		
解体完了								7月下旬予定 ▲




バージ船①



バージ船②

福島第二原子力発電所に係留中のバージ船2隻  
(現在、2隻とも岸壁沿いに配置し水抜き完了し係留中)

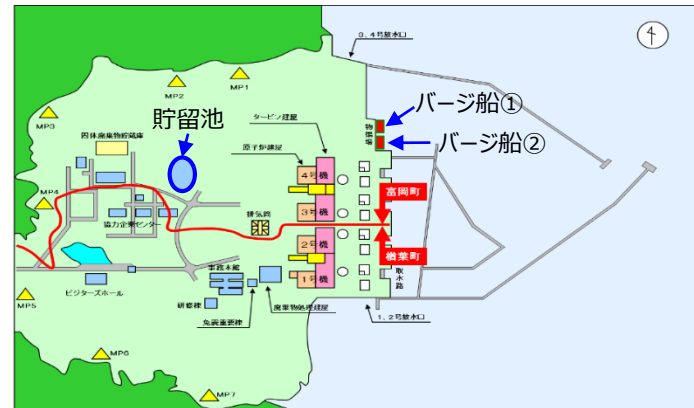

福島第二原子力発電所 現場概略図
