

系統レベルの点検・評価 に関する概要 (5号機)

平成22年1月21日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所



東京電力

系統機能試験一覧（5号機：全28試験）

<ul style="list-style-type: none">・<u>原子炉停止余裕試験</u>¹・<u>主蒸気隔離弁機能試験</u>・<u>非常用ディーゼル発電機, 高压炉心スプレイ系</u>・<u>ディーゼル発電機, 高压炉心スプレイ系,</u>・<u>低压炉心スプレイ系, 低压注水系, 原子炉</u>・<u>補機冷却系機能試験</u>・<u>自動減圧系機能試験</u>・<u>タービンバイパス弁機能試験</u>・<u>給水ポンプ機能試験</u>・<u>制御棒駆動系機能試験</u>¹・<u>ほう酸水注入系機能試験</u>・<u>原子炉保護系インターロック機能試験</u>・<u>計装用圧縮空気系機能試験</u>・<u>制御棒駆動機構機能試験</u>¹・<u>選択制御棒挿入機能試験</u>¹・<u>原子炉建屋天井クレーン機能試験</u>・<u>非常用ガス処理系機能試験</u>・<u>中央制御室非常用循環系機能試験</u>	<ul style="list-style-type: none">・<u>液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック</u>・<u>機能試験（その1）</u>・<u>液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック</u>・<u>機能試験（その2）</u>・<u>液体廃棄物処理系機能試験</u>・<u>固体廃棄物処理系焼却炉機能試験</u>・<u>原子炉格納容器漏えい率試験</u>¹・<u>原子炉格納容器隔離弁機能試験</u>・<u>可燃性ガス濃度制御系機能試験</u>・<u>原子炉格納容器スプレイ系機能試験</u>・<u>原子炉建屋気密性能試験</u>²・<u>非常用ディーゼル発電機定格容量確認試験</u>・<u>直流電源系機能試験</u>・<u>補助ボイラー試運転試験（その1）</u>・<u>補助ボイラー試運転試験（その2）</u>
---	---


枠付き は、今回、試験概要についてお知らせするもの。下線はすでにお知らせ済みのもの。

1：燃料を装荷した状態で実施する試験。

2：燃料を装荷する前の確認として、原子炉建屋気密性能検査（停止後）および非常用ガス処理系機能検査により確認済み。
原子炉格納容器漏えい率試験後に、あらためて原子炉建屋気密性能試験を実施する。

系統機能試験の概要 (21) . (原子炉停止余裕試験)

原子炉

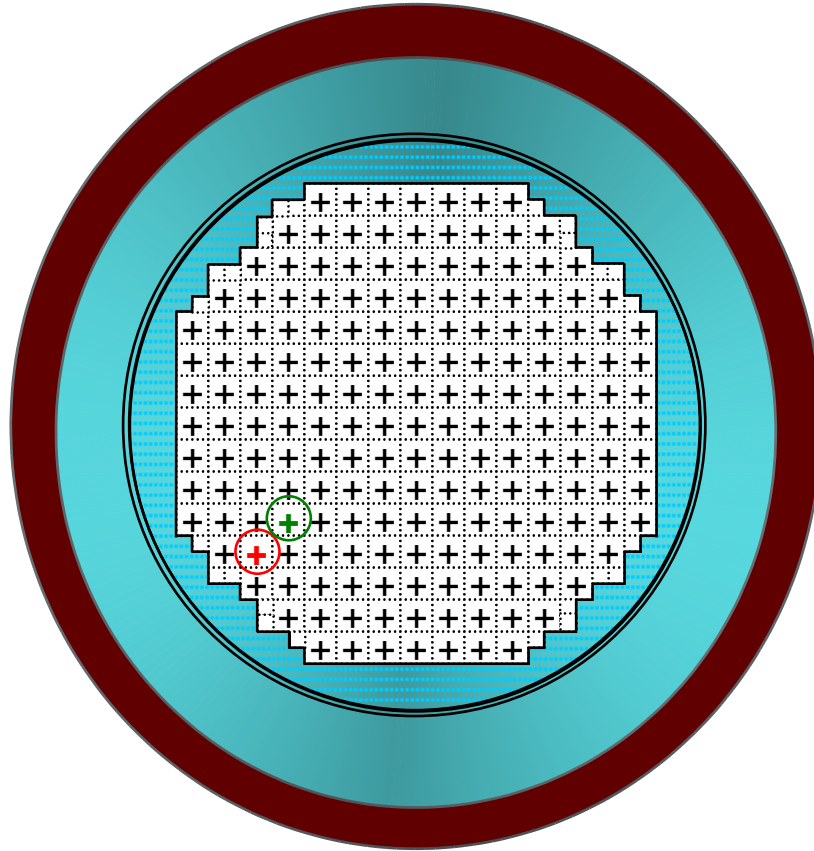

< 本系統の役割【止める】 >

原子炉停止余裕とは、最大反応度価値を持つ制御棒¹が、原子炉から完全に引抜かれた状態でも原子炉を未臨界状態とすることが出来る余裕のことをいう。

< 試験の目的 >

最大反応度価値を持つ制御棒を原子炉から完全に引抜き、さらに反応度補正²した状態であっても原子炉が未臨界であることを確認する。

- 1 最大反応度価値を持つ制御棒：原子炉から制御棒 1 本を完全に引抜いたとき、最も核分裂が起こる制御棒
- 2 反応度補正：最も核分裂反応の起きやすい状態を模擬するため最大反応度価値を持つ制御棒以外の制御棒を引き抜くこと

燃料

+ 制御棒

+ 最大反応度価値制御棒
(例示)

+ 反応度補正をするために
引抜く制御棒
(例示)
