

労働環境改善スケジュール

分野名	項目	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定			6月		7月				8月			9月			10月			11月			12月			1月以降	備考	
			23	30	7	14	21	28	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
防護装備	1	防護装備の適正化検討 (実績) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 (予定) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る	現場作業																							DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進	(継続実施)		
	2	ヒューマンエラー発生防止 (実績) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等 (予定) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等	現場作業																							協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等	(継続実施)	四半期毎に実施している不適合やヒューマンエラーの分析結果を踏まえ、安全衛生推進協議会にて四半期に一回程度、協力企業に対しヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等を啓発	
人身安全	3	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握 (実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月） (予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月）	現場作業																							情報共有、安全施策の検討・評価	(継続実施)	熱中症予防対策の実施(4～10月)	
	4	長期健康管理の実施 (実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2024年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備 (予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2024年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備	現場作業																							健康相談受付	(継続実施)	【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き、2024年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備	(継続実施)
労働環境改善	5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化 (実績) ・1F救急医療室の勤務医師調整 (予定) ・1F救急医療室の勤務医師調整	検討・設計																							1F救急医療室の勤務医師調整	(継続実施)		
	6	感染症対策の実施 (実績) (予定)	現場作業																										
要員管理、労働環境改善	7	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握 (実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 (予定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計																							作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	(継続実施)		
	8	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み (実績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 (予定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応	検討・設計																							労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック	(継続実施)		
			現場作業																										

分野 別	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		6月		7月				8月			9月	10月	11月	12月	1月以降	備考
		23	30	7	14	21	28	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	


廃炉中長期実行プラン2024

年度	2023(実績)	2024	2025	2026	2029	2035
その他		管理対象区域内の企業棟整備 (計画的に順次整備する)				

注: 今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

<凡例>

- : 作業の期間
- : 変更が見込まれる期間
- : 工程間の関連
- : 追加した工程
- : 変更/具体化した工程
- : 実施を取り止めた工程
- : リスクマップに関連する工程

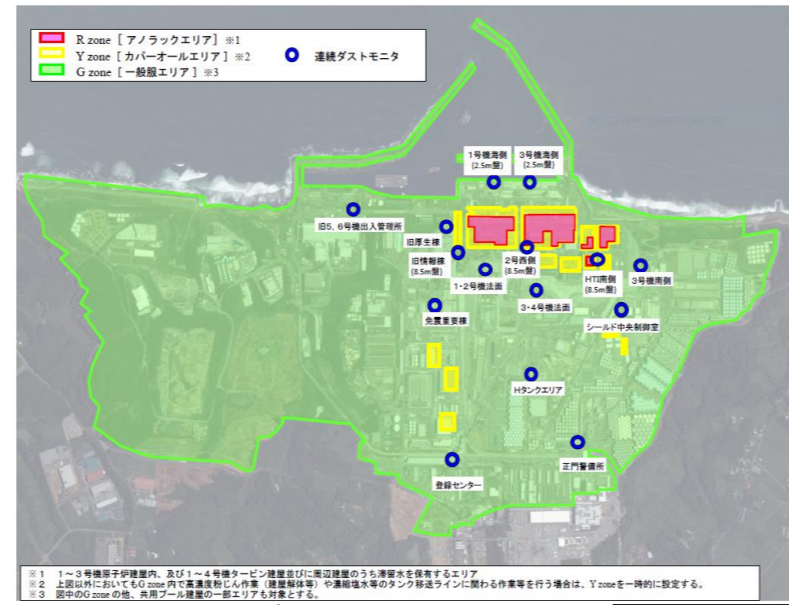

※1 1～3号機原子炉棟屋内、及び1～4号機タービン棟屋並びに蒸気発生器の隣接するエリア
 ※2 上記以外においてもG zone内で高濃度粉じん作業(理髪機等)や濃縮排水等のタンク移送ラインに隣接する作業等を行う場合は、Y zoneを一時的に設定する。
 ※3 図中のG zoneの他、共用ホール連棟の一部エリアも対象とする。

管理対象区域の運用区分 レイアウト 提供: 日本スペースイメージング

労働環境改善
