

# 1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

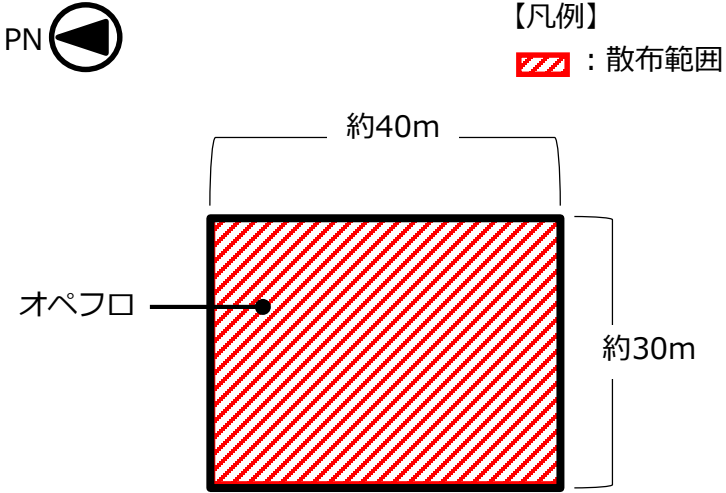
2024年9月26日



東京電力ホールディングス株式会社

# 1.定期散布（1号機）

## 定期散布

目的	オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。
頻度	1回/月
標準散布量	1.5L/m <sup>2</sup> 以上
濃度	1/10
散布範囲	 <p>【凡例】 ▨ : 散布範囲</p>
散布面積	1,234m <sup>2</sup>

## 2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

### 作業時散布

目的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m <sup>2</sup> 以上	濃度	1/10
散布対象作業	ガレキ撤去		

### 定期散布の実績及び予定

計画（9月）	実績（9月）	計画（10月）
完了予定日：9月5・6日	完了日：9月5・6日	完了予定日：10月3・4日

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2024年9月25日時点

### 3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

8月	日	18 (日)	19 (月)	20 (火)	21 (水)	22 (木)	23 (金)	24 (土)
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-
	散布予定	-	-	-	-	-	-	-
	散布実施	-	-	-	-	-	-	-
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	7.82E-05 (最大)	7.21E-05 (最大)	1.18E-04 (最大)	6.33E-05 (最大)	7.84E-05 (最大)	6.90E-05 (最大)	9.04E-05 (最大)
		ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)
	日	25 (日)	26 (月)	27 (火)	28 (水)	29 (木)	30 (金)	31 (土)
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-
	散布予定	-	-	-	-	-	-	-
	散布実施	-	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	6.50E-04 (最大)	8.75E-05 (最大)	9.37E-05 (最大)	9.82E-05 (最大)	7.70E-05 (最大)	5.71E-05 (最大)	6.62E-05 (最大)	
	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	
9月	日	1 (日)	2 (月)	3 (火)	4 (水)	5 (木)	6 (金)	7 (土)
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-
	散布予定	-	-	-	-	○	○	-
	散布実施	-	-	-	-	○	○	-
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	9.30E-05 (最大)	1.21E-04 (最大)	5.83E-05 (最大)	1.12E-04 (最大)	8.15E-05 (最大)	9.04E-05 (最大)	1.21E-04 (最大)
		ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)
	日	8 (日)	9 (月)	10 (火)	11 (水)	12 (木)	13 (金)	14 (土)
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-
	散布予定	-	-	-	-	-	-	-
	散布実施	-	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	9.65E-05 (最大)	7.68E-05 (最大)	9.64E-05 (最大)	1.16E-04 (最大)	1.06E-04 (最大)	8.44E-05 (最大)	7.91E-05 (最大)	
	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	
日	15 (日)	16 (月)	17 (火)	18 (水)	19 (木)	20 (金)	21 (土)	
散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	
散布予定	-	-	-	-	-	-	-	
散布実施	-	-	-	-	-	-	-	
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	9.09E-05 (最大)	8.45E-05 (最大)	1.00E-04 (最大)	1.00E-04 (最大)	1.00E-04 (最大)	8.44E-05 (最大)	7.11E-05 (最大)	
	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	
日	22 (日)	23 (月)	24 (火)	25 (水)	26 (木)	27 (金)	28 (土)	
散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	
散布予定	-	-	-	-	-	-	-	
散布実施	-	-	-	-	-	-	-	
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	7.90E-05 (最大)	6.96E-05 (最大)	6.84E-05 (最大)	- (最大)	- (最大)	- (最大)	- (最大)	
	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	- (最小)	- (最小)	- (最小)	- (最小)	

※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出
