


燃料装荷後の健全性確認の進捗について

- 4月15日から実施していた燃料装荷については、4月26日までに完了
- 4月27日までに燃料の配置確認や、制御棒を1組（2本）抜いても未臨界状態であることの確認を実施
- その他の健全性確認実施に向け、原子炉の蓋を閉じる作業等、原子炉復旧作業を実施中

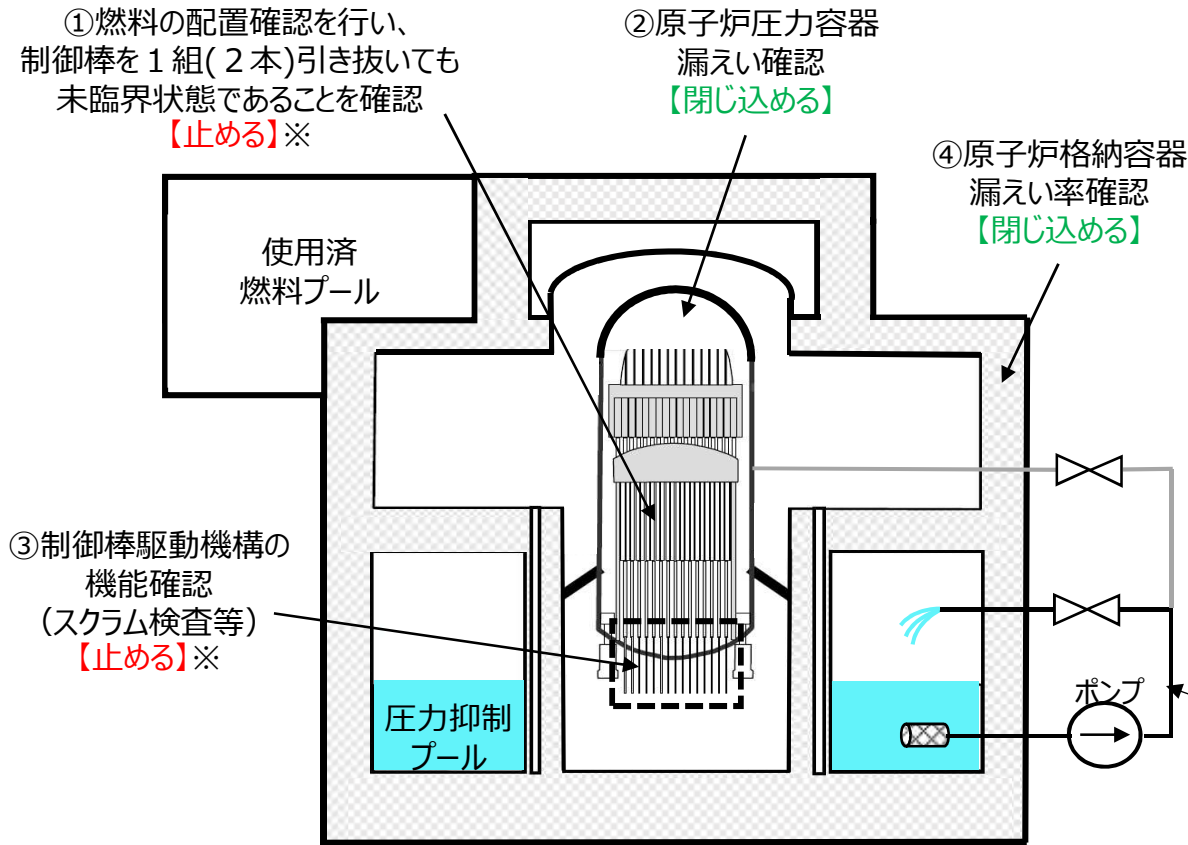

【進捗状況】	
①燃料の配置確認、未臨界状態の確認	済 (~4/27)
②原子炉圧力容器漏えい確認	準備中
③制御棒駆動機構の機能確認	
④原子炉格納容器漏えい率確認	
⑤非常用炉心冷却系機能などの確認	

① → ② → ③ → ④ → ⑤ の順で確認

※使用前事業者検査を含む
