


福島第一原子力発電所 H1・H2エリアの フランジ型タンクの解体開始について

2015年5月20日
東京電力株式会社

1. 解体対象エリア・工程

- H1、H2エリアの40基のフランジ型タンクの解体作業を開始
- H2エリアタンク(28基)は5月27日から、H1エリアタンク(12基)は6月上旬から作業開始。
- 現在の計画では、H2エリアタンクは来年1月頃、H1エリアタンクは9月頃までかかる見込み。

解体対象エリア

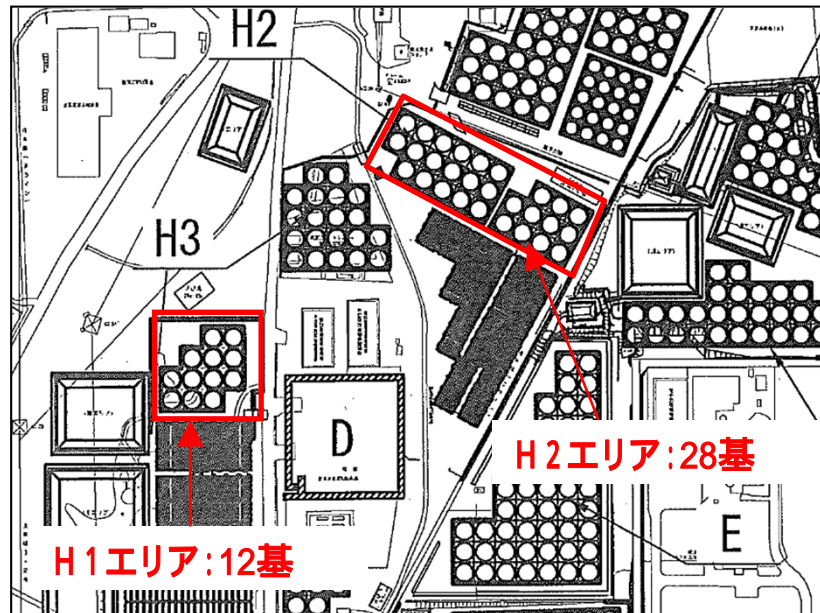


解体工程

	2015年					2016年						
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
H1エリア フランジタンク 12基		■										
H2エリア フランジタンク 28基	5/27	■										

終了時期は現段階での計画。天候等の影響により前後する。

2. 解体ステップ

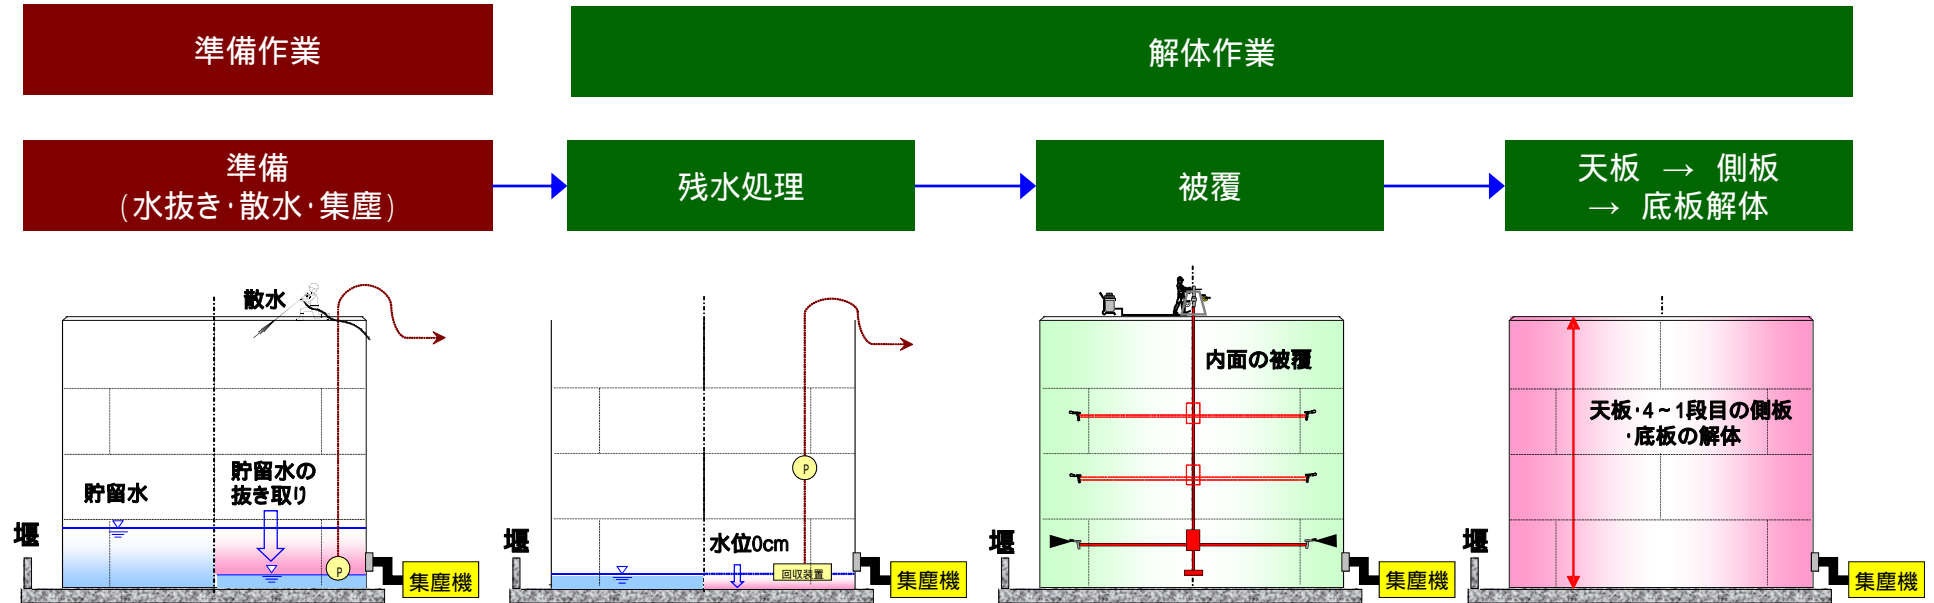

仮設ポンプ等にて、底板から10cmまで水移送

天板を開放し4段目から10cmの残水を処理

天板開放前にはタンク内の上部の空気中の放射性物質の濃度を測定し問題ないことを確認。

タンク内面を被覆(塗装)

タンク天板・側板の解体

以上
