


承認	審査	作成
2025.2.14	2025.2.13	2025.2.13

放射線サーベイ記録

作業件名	1F-2号機 PCV内部調査業務及び付帯作業（直営） 【2024年度】	測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 核種分析
測定場所	2号機R/B2階北～南西エリア、3階南エリア	測定者	
測定目的	2号機原子炉建屋2階北～南西エリア、および3階南 エリアの線量を調査を実施する。	測定器	F1-PS-278
測定計画名称	1F-2 R/B2, 3階線量調査		
測定日時	2025/1/15 10:00 ~ 11:00		

X：空間線量当量率（mSv/h）

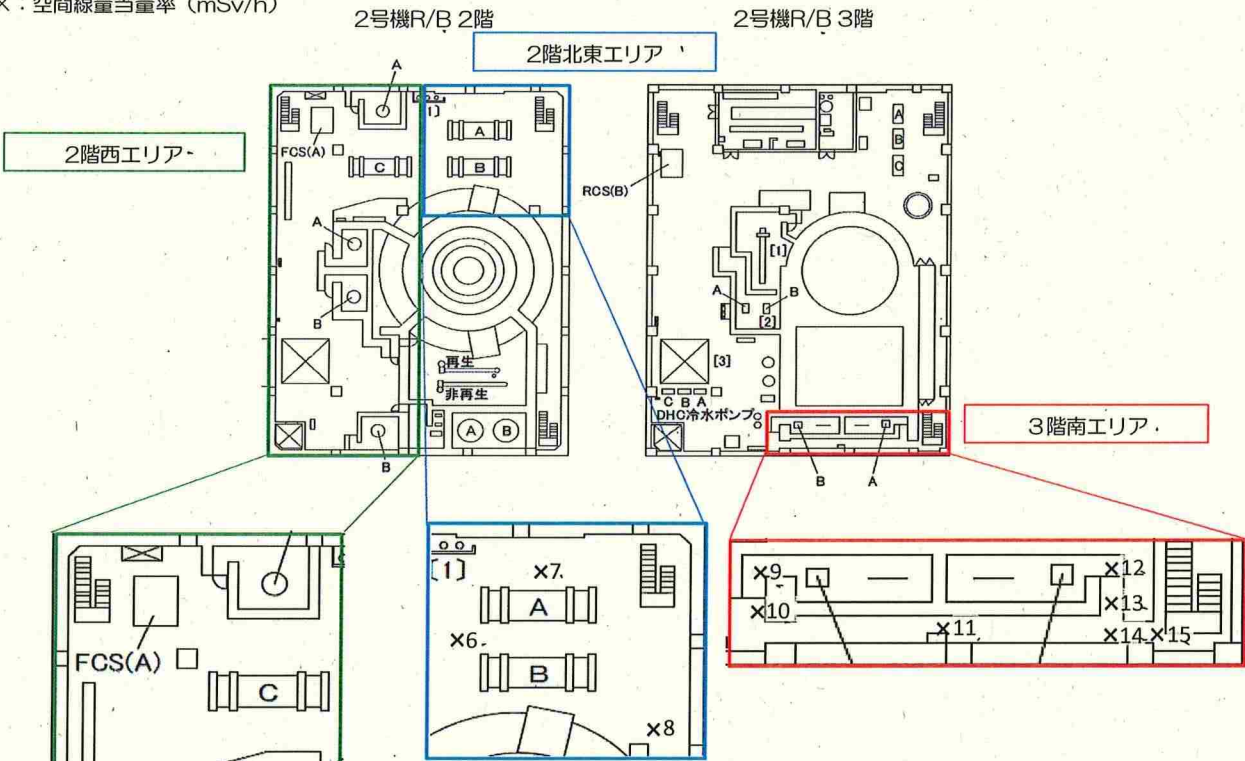

空間線量当量率 2号機R/B2階		
測定No	測定値[mSv/h]	備考
x 1	1.5	
x 2	10	
x 3	10	
x 4	1.2	
x 5	1.5	
x 6	4.0	
x 7	4.5	
x 8	4.5	
空間線量当量率 2号機R/B3階		
測定No	測定値[mSv/h]	備考
x 9	2.5	
x 10	3.0	
x 11	2.1	
x 12	1.0	
x 13	1.6	
x 14	1.5	
x 15	7.0	
