


建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

<参考資料>
 2024年5月13日
 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー

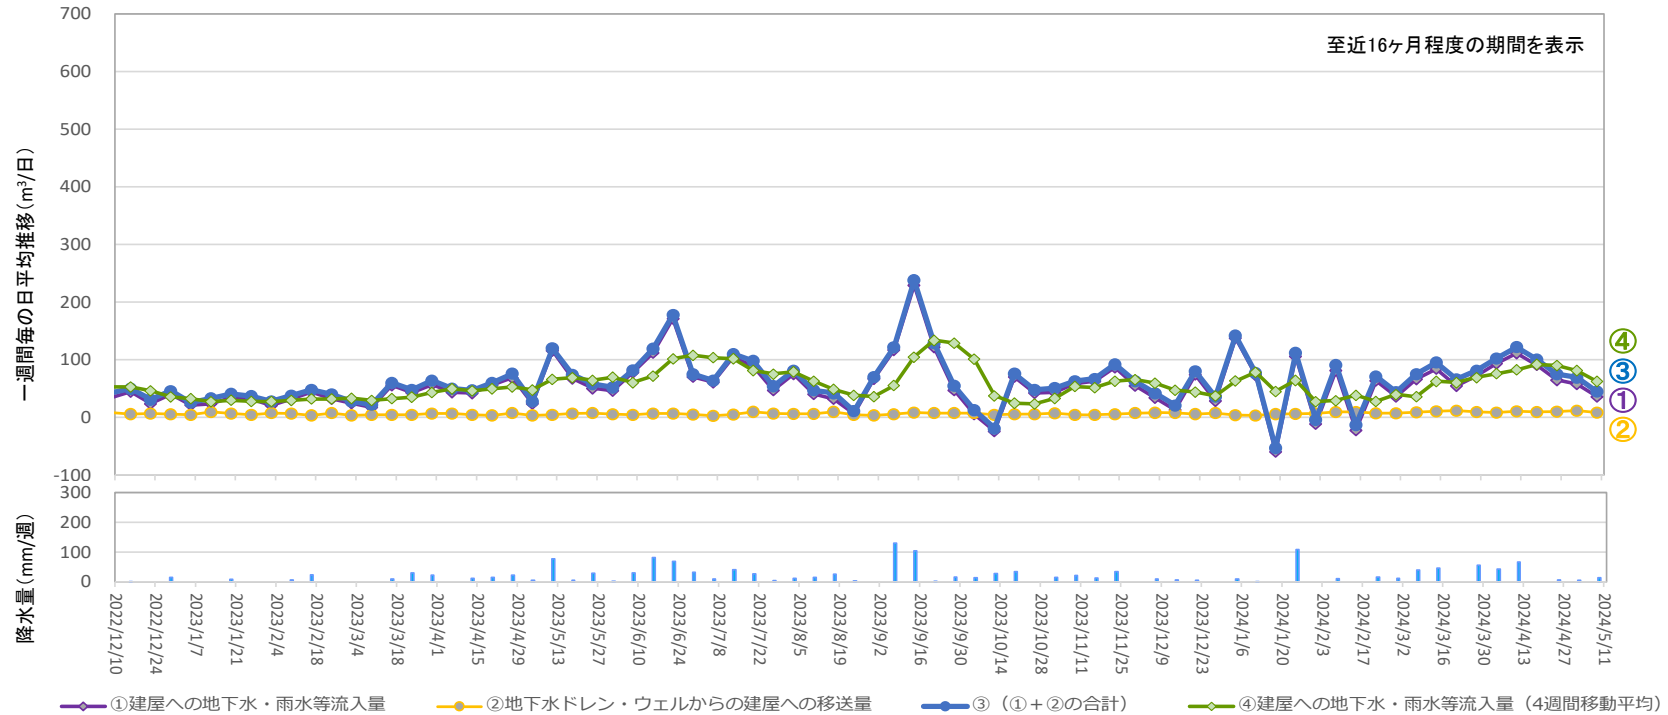

地下水ドレンからタービン建屋への移送量 (2024年5月2日 ~ 2024年5月8日)

日付	地下水ドレン中継タンク				(参考)改修ウェル, ウェルポイント				(参考)タービン 建屋への移送量 [(α)+(β)]
	A	B	C	合計(α)	1-2号機間	2-3号機間	3-4号機間	合計(β)	
5月2日~	0	0	0	0	9	0	0	9	9
5月8日	0	0	0	0	9	0	0	9	9

①建屋への地下水・雨水等流入量:36m³/日, ②地下水ドレン・ウェルからの建屋への移送量:9m³/日, ③(①+②の合計):45m³/日, 降水量:13.5mm/週
 なお, 合計値は小数点第一位のデータを合計しているため, 個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。

※ 2024年4月4日からプロセス主建屋断面積を一部精緻化して①③④を算出。なお, 引き続き算出時に不確かさを含むため, マイナスとなる場合があります。

(参考)④建屋への地下水・雨水等流入量の4週間移動平均:63m³/日

(参考) 評価開始時からの建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

