


建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

<参考資料>
 2024年8月5日
 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー

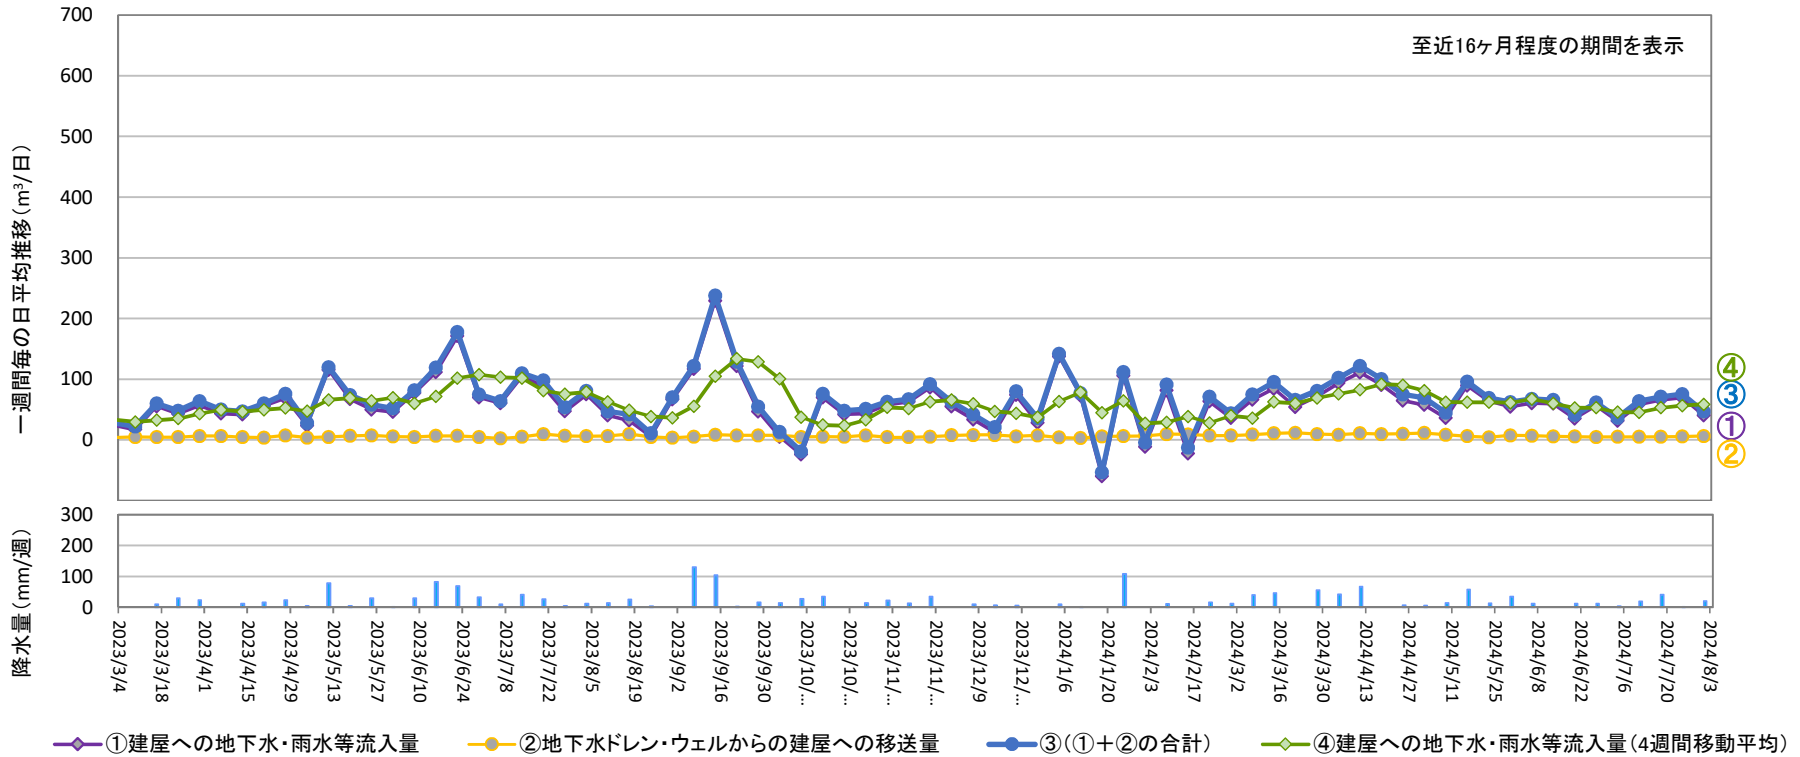

地下水ドレンからタービン建屋への移送量

(2024年7月25日 ~ 2024年7月31日)

[m³/日]

日付	地下水ドレン中継タンク			
	A	B	C	合計(α)
7月25日~	0	0	0	0
7月31日	0	0	0	0

(参考)改修ウェル、ウェルポイント				(参考)タービン建屋への移送量 [(α)+(β)]
1-2号機間	2-3号機間	3-4号機間	合計(β)	
6	0	0	6	6

①建屋への地下水・雨水等流入量: 41 m³/日, ②地下水ドレン・ウェルからの建屋への移送量: 6m³/日, ③①+②の合計: 47m³/日, 降水量: 19.5mm/週

なお、合計値は小数点第一位のデータを合計しているため、個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。

※ 2024年4月4日からプロセス主建屋断面積を一部精緻化して①③④を算出。なお、引き続き算出時に不確かさを含むため、マイナスとなる場合があります。

(参考)④建屋への地下水・雨水等流入量の4週間移動平均: 59 m³/日

(参考) 評価開始時からの建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

