

平成 17 年 7 月 19 日

## 1 号機計画停止における点検状況について

当所 1 号機は、平成 14 年 11 月 20 日以来、第 23 回定期検査を実施してまいりましたが、平成 17 年 7 月 13 日に発電を開始しました。当該号機はプラントを長期間停止していたことから、7 月 15 日に原子炉を一旦停止し、各種機器の点検を実施することとしておりました。

(7 月 13 日お知らせ済み)


7 月 15 日から実施しておりました点検において、原子炉再循環系配管 (A) の排水ラインに漏えいが確認されました。

当該ラインに 2 台設置している排水弁のうち、下流側の弁の分解点検を行ったところ、弁座に割れが確認されたため、同型の弁に取り替えを行うとともに、原因を調査いたします。

なお、上流側の排水弁については開閉を行い、弁内部を洗浄した後、漏えいがなくなったことを確認いたしました。

また、計画停止において実施した点検の結果、他の設備には異常はありませんでした。

以 上

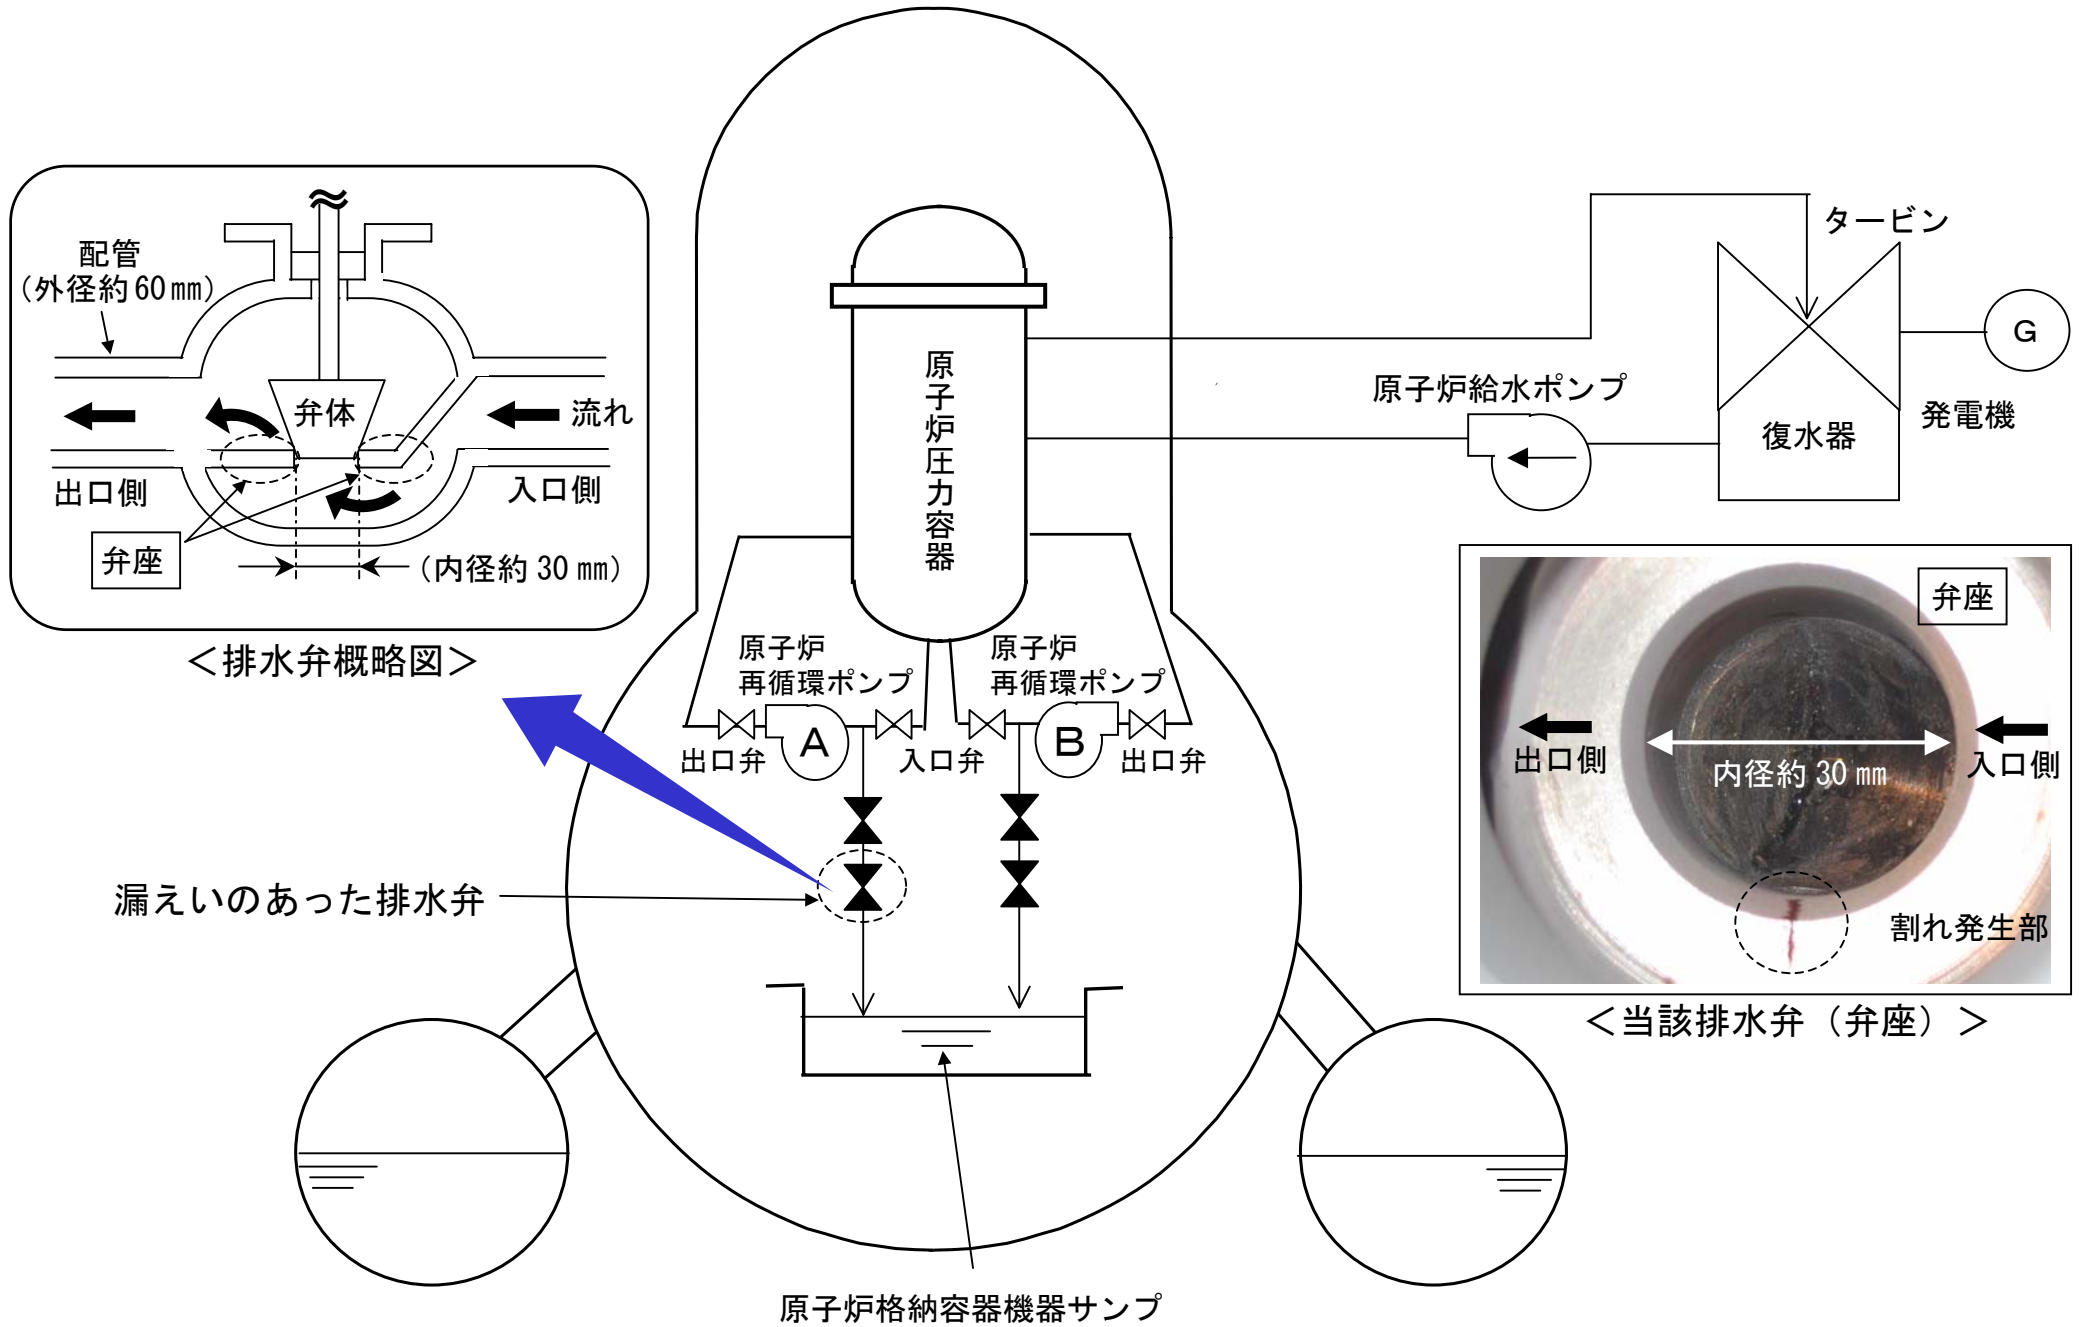

1号機原子炉再循環系排水ライン概略図
