## (お知らせ)

## 当所 1 号機の原子炉起動操作の延期について

平成 22 年 5 月 22 日東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所

当所 1 号機については、昨日午後 10 時 45 分より復水器の真空度の上昇操作を開始し、プラント全体の機能試験を開始しておりますが、本日午前中に原子炉給水ポンプバイパス弁にシートリーク\*等の不具合が確認されました。

当該弁の弁体のシート面に隙間が発生している可能性があることから、当該弁の増し締め等による復旧作業を行っております。


当社といたしましては、プラント全体の機能試験に際しては一つひとつ着実に実施することとしており、本日午後2時から予定していた原子炉起動操作(制御棒引き抜き開始)につきましては、延期することといたしました。

今後の原子炉起動操作(制御棒引き抜き開始)のスケジュールにつきましては、当該弁の復旧状況とあわせて、決まり次第あらためてお知らせいたします。

以上

## \* シートリーク

弁のシート面 (液体などの流れを遮る部分) に隙間が生じて、配管内の流れを完全に止めることができない状態。

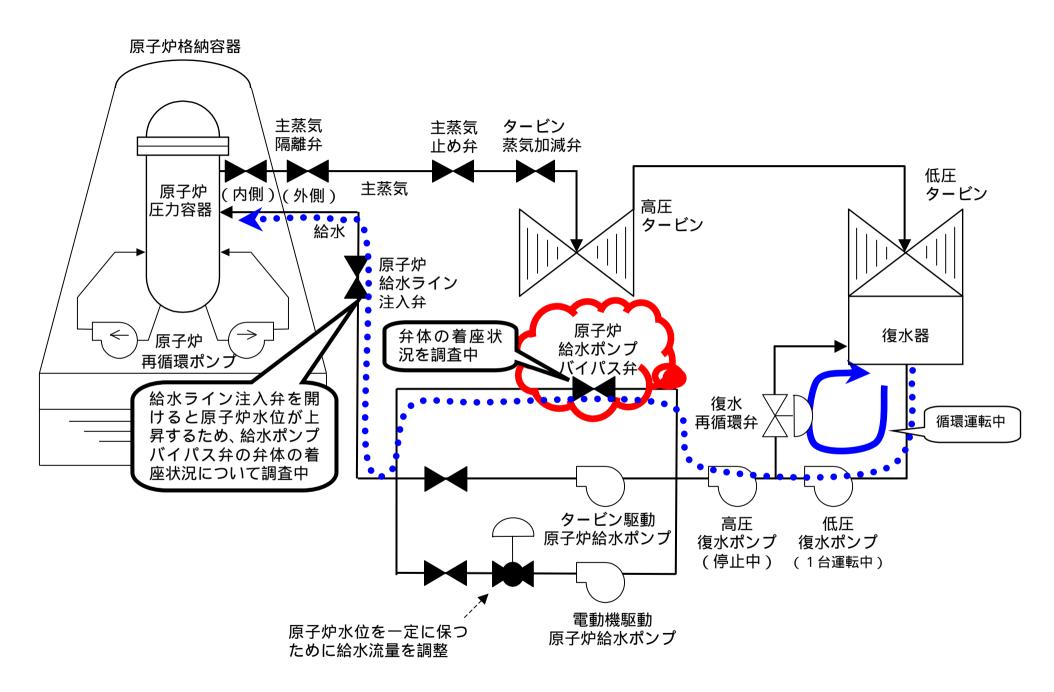

柏崎刈羽原子力発電所 1 号機 系統概略図
