
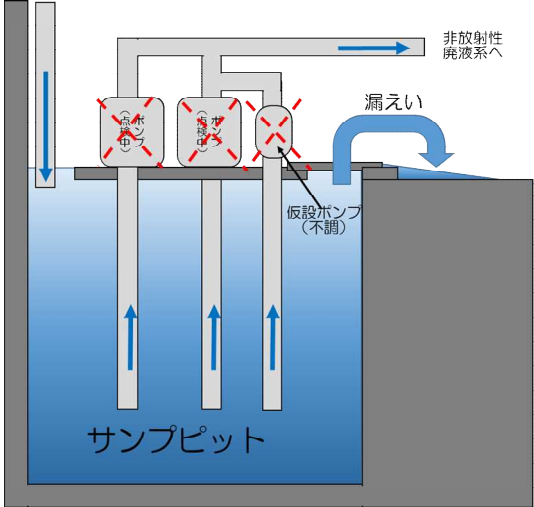
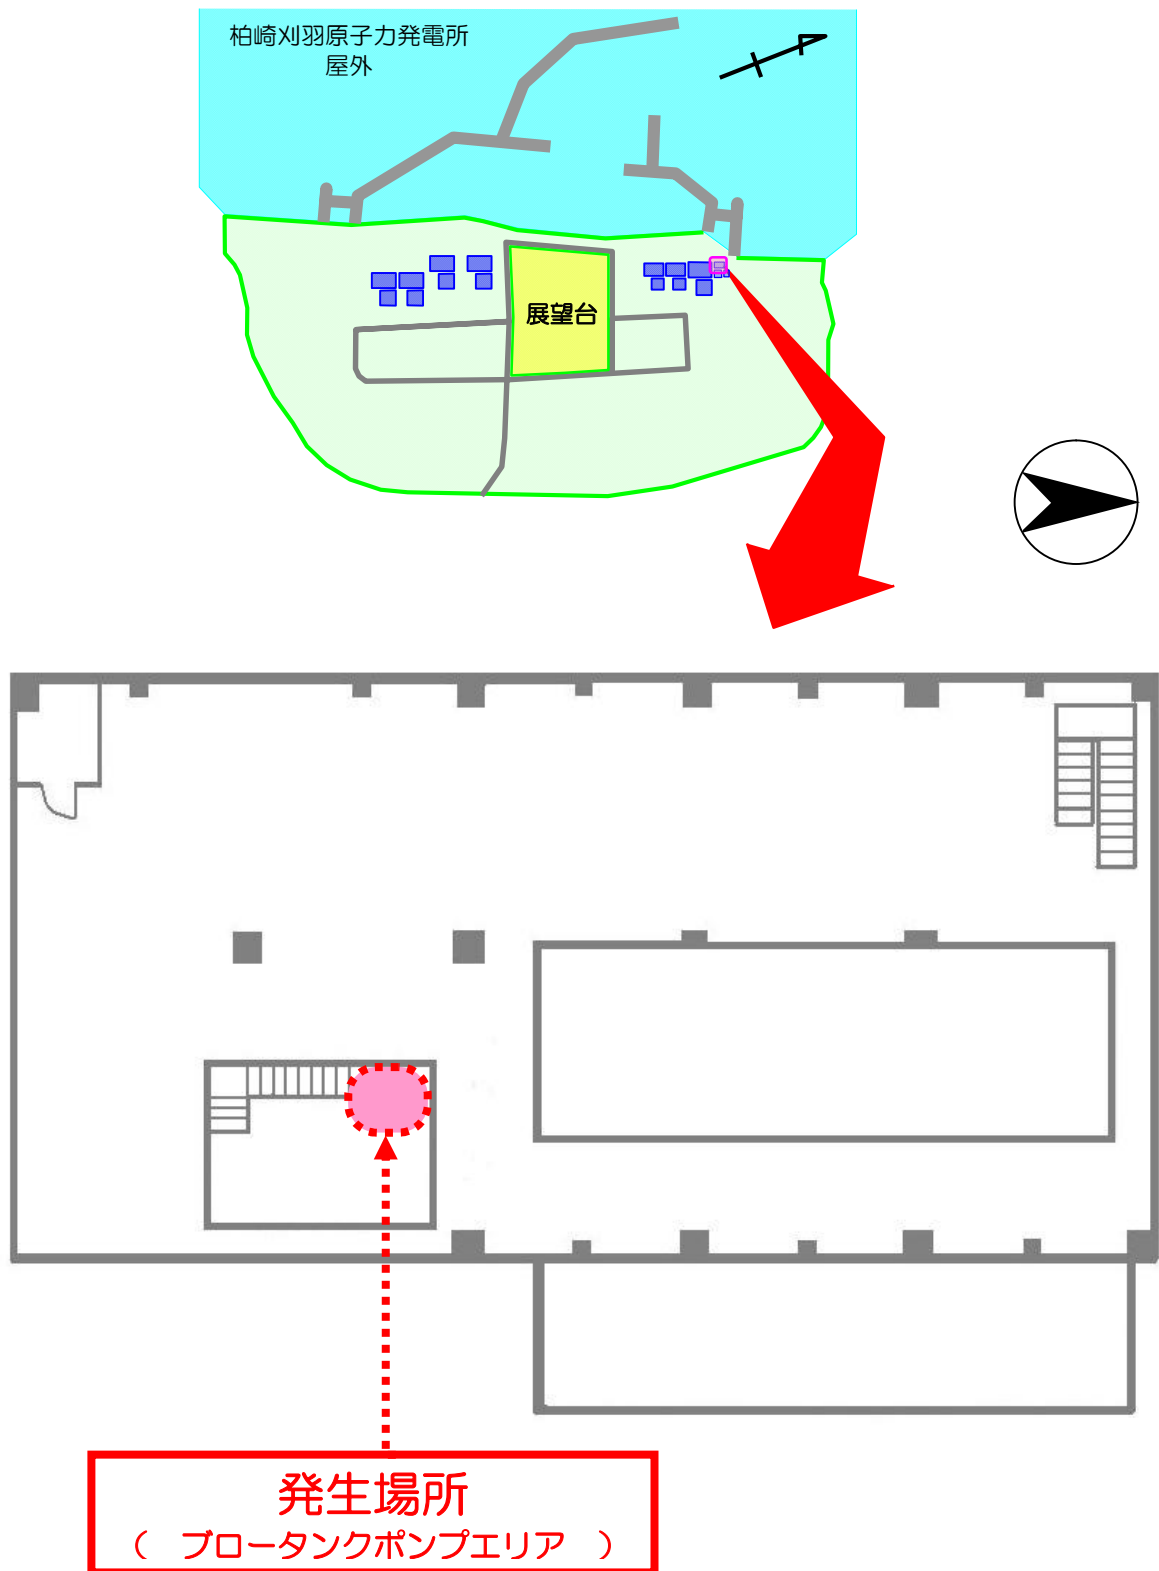


**区分：Ⅲ**

号機	—	
件名	大湊側補助ボイラー建屋（非管理区域）における水漏れについて	
不適合の概要	<p>2020年6月18日午前11時20分頃、大湊側補助ボイラー建屋1階ブロータンクポンプエリア*1（非管理区域）にある補助ボイラー建屋サンプルピット*2の「水位高」警報が発生しました。</p> <p>当社社員が現場を確認したところ、サンプルピットから非放射性的の水が床に約270リットル漏れていることを確認しました。</p> <p>サンプルピットに溜まる水を排水するためのポンプが不調となったことが原因と推定しています。</p> <p>本事象による外部への放射能の影響はありません。</p> <p>その後、別の仮設ポンプにて排水をしたことにより水漏れは停止しました。</p> <p>*1 ブロータンクポンプエリア              ボイラー運転等に際して発生する余剰水を受けるタンクやその移送用ポンプ、今回水漏れが発生したサンプルピット等の設備があるエリア</p> <p>*2 サンプルピット              ボイラー建屋で発生する排水を受ける貯水槽</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div data-bbox="336 1361 884 1848" style="text-align: center;"> <p>現場写真 (黄色線内側サンプルピット)</p>  </div> <div data-bbox="900 1301 1436 1848" style="text-align: center;"> <p>現場イメージ図</p>  </div> </div> <p style="text-align: center;">水漏れした個所の一部</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">その他</span></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>サンプルピットから床に漏れた水については、拭き取り済みです。</p> <p>詳細な原因については現在調査中です。</p>	

# 大湊側補助ボイラー建屋（非管理区域）における水漏れについて



柏崎刈羽原子力発電所 大湊側 補助ボイラー建屋 1階
