


# 高温焼却炉建屋の建屋滞留水水位の運転上の制限の逸脱について

**TEPCO**

---

2016年4月8日  
東京電力ホールディングス株式会社

- 建屋滞留水を高温焼却炉建屋（以下HTI）へ移送を実施（4 / 7時点）  
 2号機タービン建屋，3号機タービン建屋，1号機原子炉建屋  
 → HTI

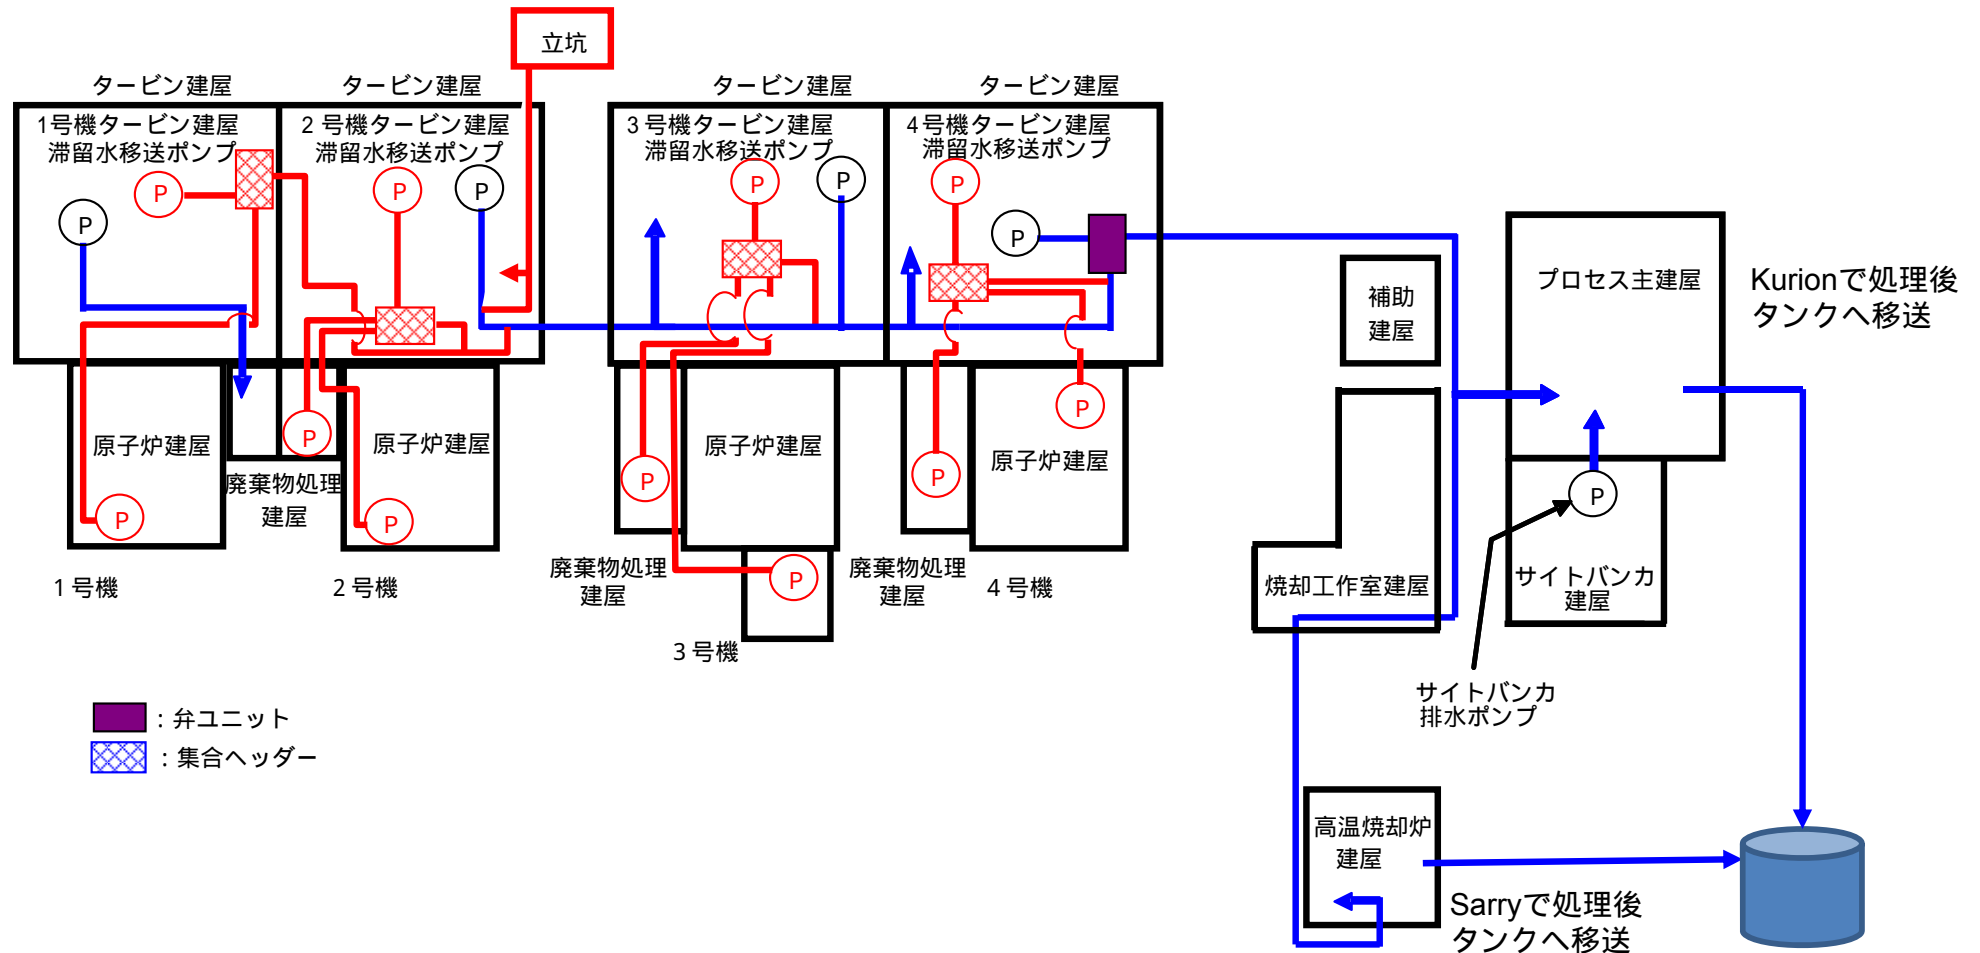

4月7日

7:43 1号機原子炉建屋 HTI移送開始

13:13 ~ 13:18 Sarry : 試運転

15:02 2号機タービン建屋 HTI移送開始

15:08 3号機タービン建屋 HTI移送開始

4月8日

6:11 2号機タービン建屋 HTI移送停止

6:13 3号機タービン建屋 HTI移送停止

7:30 HTI建屋滞留水水位がTP2754mm ( 運転上の制限値 ) を超えていることを確認

7:50 運転上の制限の逸脱を宣言

7:59 Sarry運転開始 ( HTI建屋水位低下開始 )

13:05 HTI建屋滞留水水位がTP2754mm ( 運転上の制限値 ) 以下を確認

14:30 運転上の制限の逸脱からの復帰を宣言

- 水位の上昇傾向は、Sarryを運転していない条件での上昇傾向と一致

