


建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

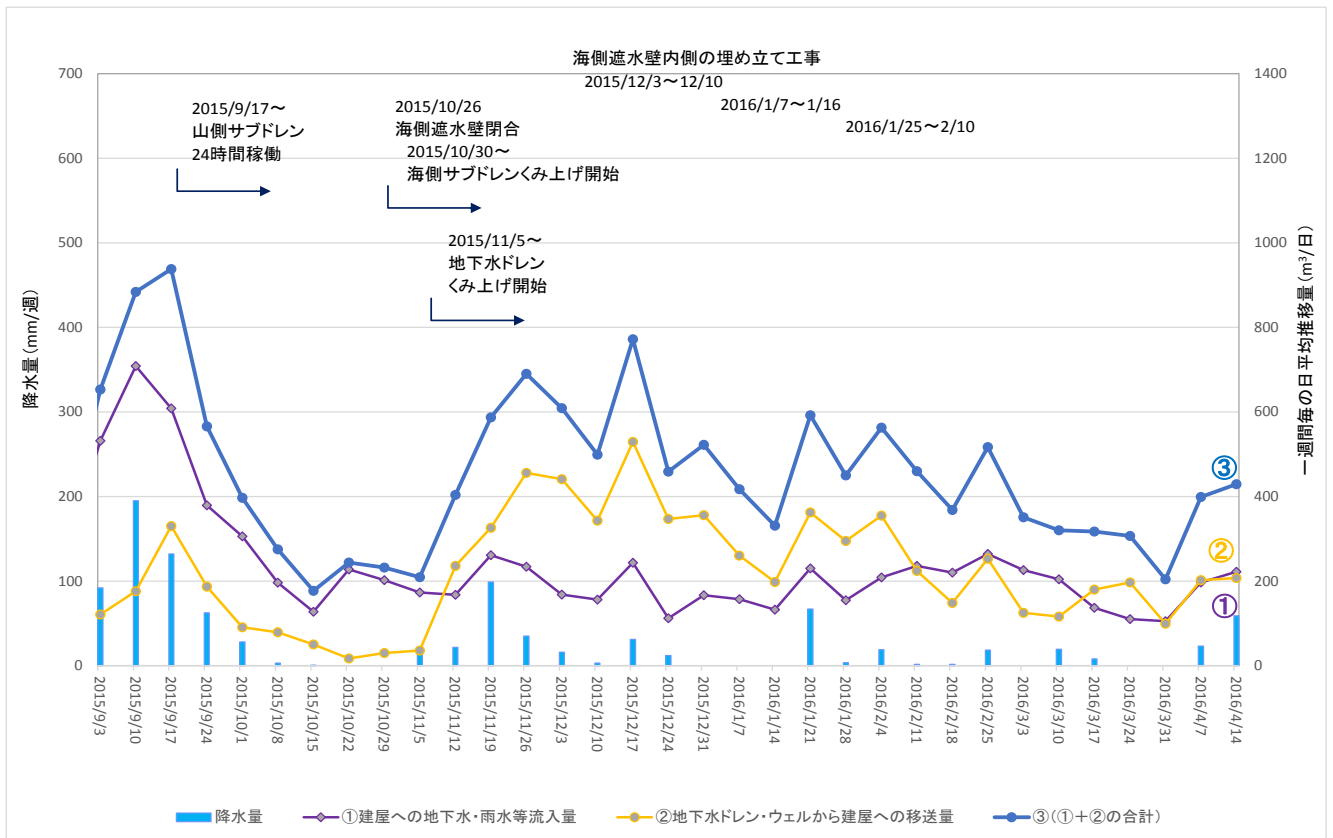

地下水ドレンからタービン建屋への移送量 (2016年4月7日～4月13日分 [0:00～24:00])

日付	地下水ドレン中継タンク				(参考)改修ウェル, ウェルポイント				[(参考)タービン建屋への移送量 [(α)+(β)]]
	A	B	C	合計*(α)	1-2号機間	2-3号機間	3-4号機間	合計*(β)	
4月7日	132	136	0	268	57	74	15	146	414
4月8日	95	80	0	175	56	33	0	89	264
4月9日	69	42	0	111	42	39	7	88	199
4月10日	64	61	0	125	45	27	0	71	196
4月11日	66	0	0	66	46	15	0	61	127
4月12日	62	0	0	62	43	14	0	58	120
4月13日	60	0	0	60	44	15	7	66	126

※合計値は小数点第一位のデータを合計しているため、個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。
