


## 建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

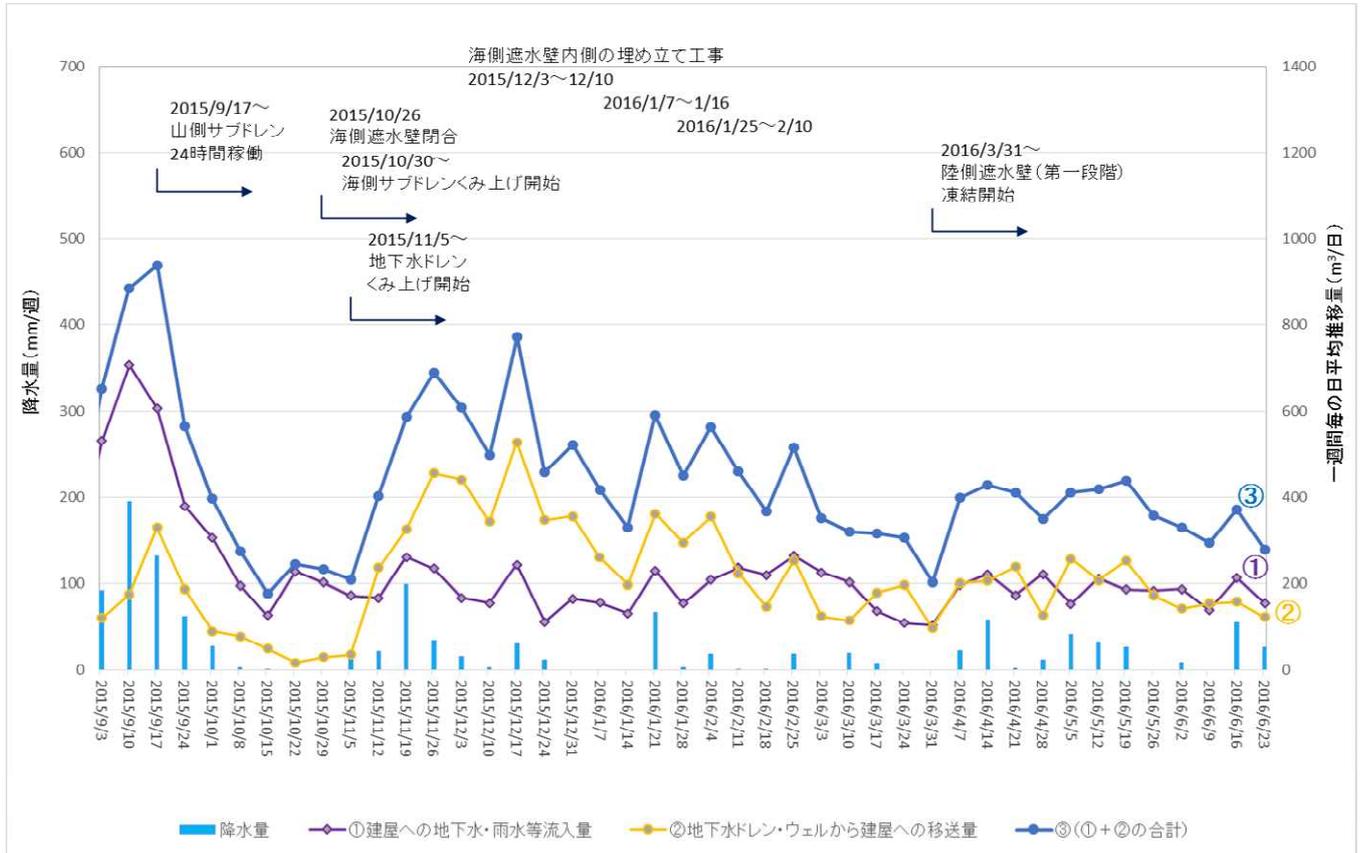

### 地下水ドレンからタービン建屋への移送量 (2016年6月16日~6月22日分[0:00~24:00])

[m<sup>3</sup>/日]

日付	地下水ドレン中継タンク				(参考)改修ウェル, ウェルポイント				(参考)タービン建屋への移送量 [(α)+(β)]
	A	B	C	合計※(α)	1-2号機間	2-3号機間	3-4号機間	合計※(β)	
6月16日	118	0	0	118	72	14	0	85	203
6月17日	78	0	0	78	32	14	7	54	132
6月18日	55	0	0	55	39	0	0	39	94
6月19日	55	0	0	55	42	15	0	57	112
6月20日	55	0	0	55	45	15	0	60	115
6月21日	56	0	0	56	44	14	7	66	122
6月22日	55	0	0	55	28	0	0	28	83

※ 合計値は小数点第一位のデータを合計しているため、個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。
