


建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

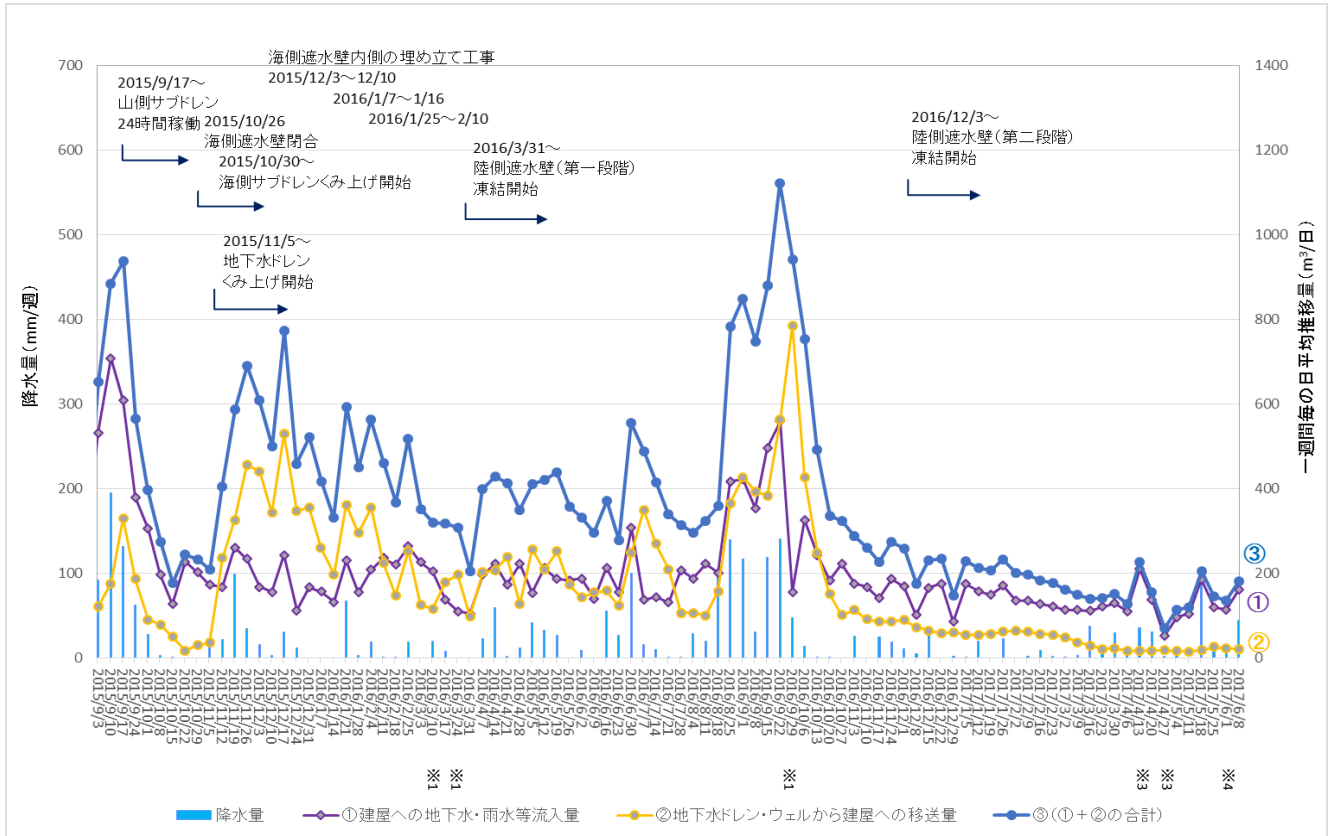

地下水ドレンからタービン建屋への移送量

(2017年6月1日～6月7日分[0:00～24:00])

[m³/日]

日付	地下水ドレン中継タンク				(参考)改修ウェル, ウェルポイント				(参考)タービン建屋への移送量 [(α)+(β)]
	A	B	C	合計※²(α)	1-2号機間	2-3号機間	3-4号機間	合計※²(β)	
6月1日	0	0	0	0	17	0	0	17	17
6月2日	0	0	0	0	25	0	0	25	25
6月3日	0	0	0	0	17	0	0	17	17
6月4日	0	0	0	0	26	0	0	26	26
6月5日	5	0	0	5	16	0	0	16	21
6月6日	0	0	0	0	26	0	0	26	26
6月7日	0	0	0	0	17	0	0	17	17

※ ①建屋への地下水・雨水等流入量:161m³/日, ②地下水ドレン・ウェルからの建屋への移送量:21m³/日, ③(①+②の合計):182m³/日, 降雨量:45.0mm/週

※1 建屋水位計の校正を実施

※2 合計値は小数点第一位のデータを合計しているため, 個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。

※3 集中RW建屋の貯蔵量算出に必要な, 水位に応じた断面積(評価値)の不確かさによるものと推定

※4 2017/6/1の評価以降, 集中RW建屋の貯蔵量算出に必要な, 水位に応じた断面積について補正
