

放射線管理記録

運用部 運用支援G	
GM	メンバー


放管責任者	Gr責任者	担当者

(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2024年度)				測定項目	■ γ ■ $\beta + \gamma$ ■ スミア ■ ダスト
WID番号	240160		天候	晴	測定者	
測定日時	2024年 7月 4日 7時 50分～				測定器	F1-ICWBL-169、リ-ICW-439
測定場所	大型機器点検建屋					F1-DSH-024、F1-GMAD-196
作業内容 (測定目的)	タンク片ブラスト除染				区域区分	Y zone (β 線対象エリア)
	(上記に伴う環境サーベイ)				防護装備 & 措置	全面マスク+カバーオール(2重)
最大値	γ (mSv/h)	0.04	$\beta + \gamma$ (mSv/h)	0.04	特記事項	
	スミア(β) (Bq/cm ²)	2.3E+1	ダスト(β) (Bq/cm ³)	<2.86E-6		

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)

大型機器点検建屋

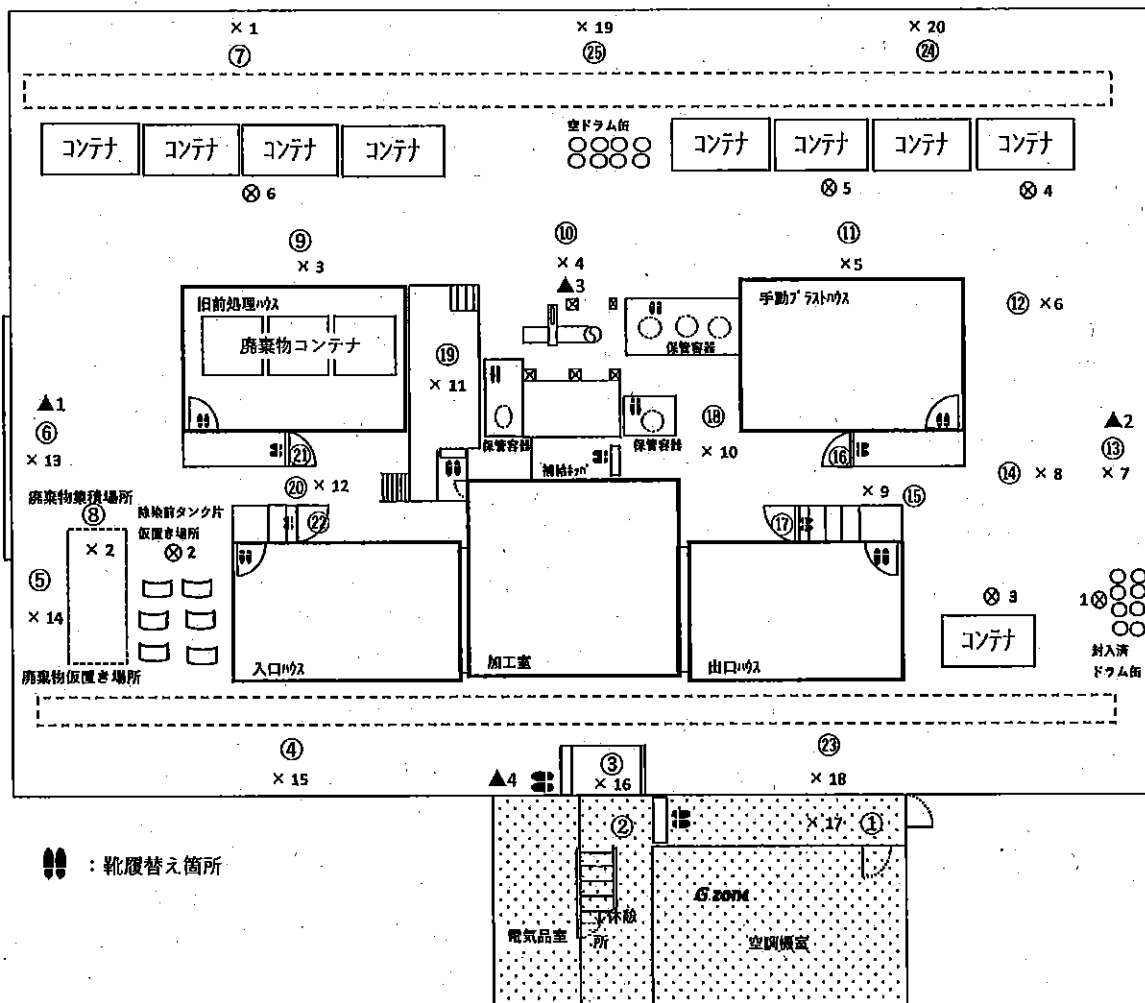

※各測定結果は次紙参照願います。

放射線管理記録

次紙 (2/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2024年度)	WID番号	240160	測定日時	2024年 7月 4日 7時50分～
------	-----------------------	-------	--------	------	--------------------

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ*	γ+β	測定目的
× 1	0.001	0.01	北西側エリア環境把握(主作業範囲外)
× 2	0.002	0.01	廃棄物集積場所前環境変動把握
× 3	0.001	0.01	移動経路環境把握
× 4	0.001	0.01	移動経路環境把握
× 5	0.001	0.01	移動経路環境把握
× 6	0.002	0.01	移動経路環境把握
× 7	0.001	0.01	東側エリア・東側シャッター前環境把握
× 8	0.002	0.01	除染後タンク片仮置エリア環境把握
× 9	0.001	0.01	移動経路環境把握
× 10	0.001	0.01	移動経路環境把握
× 11	0.001	0.01	プラスト装置操作盤エリア環境把握
× 12	0.001	0.01	移動経路環境把握
× 13	0.002	0.01	西側エリア・西側シャッター前環境把握
× 14	0.001	0.01	廃棄物仮置き場所前環境変動把握
× 15	0.001	0.01	南西エリア環境把握(主作業範囲外)
× 16	0.001	0.01	Y Zone入口・南側エリア環境把握
× 17	0.001	0.01	大型機器点検建屋入口環境把握
× 18	—	—	南東エリア環境把握(主作業範囲外)※
× 19	—	—	北側エリア環境把握(主作業範囲外)※
× 20	—	—	北東側エリア環境把握(主作業範囲外)※

※ 毎月1回測定

表面線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ	γ+β	測定箇所
⊗ 1	0.04	0.04	封入済ドラム缶
⊗ 2	0.02	0.04	除染前タンク片仮置場(遮へい前)
⊗ 3	0.002	0.01	空コンテナ(170051)
⊗ 4	0.002	0.01	除染済タンク片コンテナ(170024)
⊗ 5	0.002	0.01	除染済タンク片コンテナ(170232、170071、170115)
⊗ 6	0.006	0.02	除染前タンク片コンテナ(170113、170163、170045、170179)

表面汚染密度(β)測定結果(スミア法:レトマーク時定数10秒)

測定器	F1-GMAD-196
換算定数	5.37E-3 Bq/cm ² ・cpm
B・G測定値	200 cpm
検出限界値(LTD)	スミア拭取効率0.1 6.4E-1 Bq/cm ² NETcpm 118 cpm

No	GROSS (cpm)	NET (cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm ²)	スミア拭取効率	採取場所
①	200	0	LTD	0.1	大型機器点検建屋入口
②	200	0	LTD	0.1	移動経路(靴下エリア)
③	200	0	LTD	0.1	Y Zone入口(靴下エリア)
④	—	—	—	—	南西側エリア移動経路※
⑤	—	—	—	—	廃棄物仮置き場所前※
⑥	3200	3000	1.6E+1	0.1	西側シャッター前
⑦	—	—	—	—	北西側エリア移動経路※
⑧	—	—	—	—	廃棄物集積場所前※
⑨	—	—	—	—	移動経路※
⑩	3500	3300	1.8E+1	0.1	移動経路
⑪	—	—	—	—	移動経路※
⑫	—	—	—	—	移動経路※
⑬	2500	2300	1.2E+1	0.1	東側シャッター前エリア
⑭	—	—	—	—	除染後タンク片仮置エリア※
⑮	2300	2100	1.1E+1	0.1	移動経路
⑯	200	0	LTD	0.1	手動プラストハウスC/P(靴下エリア)
⑰	200	0	LTD	0.1	出口ハウスC/P(靴下エリア)
⑱	—	—	—	—	移動経路※
⑲	1800	1600	8.6E+0	0.1	プラスト装置操作盤エリア
⑳	4500	4300	2.3E+1	0.1	移動経路
㉑	200	0	LTD	0.1	旧前処理ハウスC/P(靴下エリア)
㉒	200	0	LTD	0.1	入口ハウスC/P(靴下エリア)
㉓	—	—	—	—	南東エリア移動経路※
㉔	—	—	—	—	北東エリア移動経路※
㉕	—	—	—	—	北側エリア移動経路※

※ 毎月1回測定

空气中放射能濃度(β)測定結果

測定器	F1-GMAD-196 F1-DSH-024		
β線機器効率:	62.1%	線源効率: 0.4	
使用ろ紙: HE-40T 105 φ	ろ紙有効面積: 62.2cm ²		
捕集流量	888.3	ℓ/min	
補正係数	0.62		
B.G 測定値	200	cpm	

※測定条件(レトマーク)

B・G測定時間: 10 sec

試料測定時間: 10 sec

No	捕集時間	捕集時間	積算流量 (ℓ)	換算定数 (Bq/cm ³ ・cpm)	検出限界値 (Bq/cm ³)	Gross (cpm)	測定結果 (Bq/cm ³)	作業内容
▲1	8:00 ~ 8:10	10分	8883	2.42E-8	2.86E-6	118	200	LTD 大型機器点検建屋内環境測定
▲2	8:15 ~ 8:25	10分	8883	2.42E-8	2.86E-6	118	200	LTD 大型機器点検建屋内環境測定
▲3	8:30 ~ 8:40	10分	8883	2.42E-8	2.86E-6	118	200	LTD 大型機器点検建屋内環境測定
▲4	8:45 ~ 8:55	10分	8883	2.42E-8	2.86E-6	118	200	LTD 大型機器点検建屋内環境測定

放射線管理記録

運用部 運用支援G		
GM	メンバー	


放管責任者	Gr責任者	担当者

(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2024年度)				測定項目	■ γ ■ $\beta + \gamma$ ■ スミア ■ ダスト
WID番号	240160		天候	晴	測定者	
測定日時	2024年 7月 3日 7時 50分～				測定器	F1-ICWBL-169、リ-ICW-439
測定場所	大型機器点検建屋					F1-DSH-024、F1-GMAD-191
作業内容 (測定目的)	タンク片ブラスト除染				区域区分	Y zone (β 線対象エリア)
	(上記に伴う環境サーベイ)				防護装備 & 措置	全面マスク+カバーオール(2重)
最大値	γ (mSv/h)	0.04	$\beta + \gamma$ (mSv/h)	0.04		
	$\text{スミア}(\beta)$ (Bq/cm ²)	2.2E+1	$\text{ダスト}(\beta)$ (Bq/cm ²)	<3.52E-6	特記事項	

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)

大型機器点検建屋

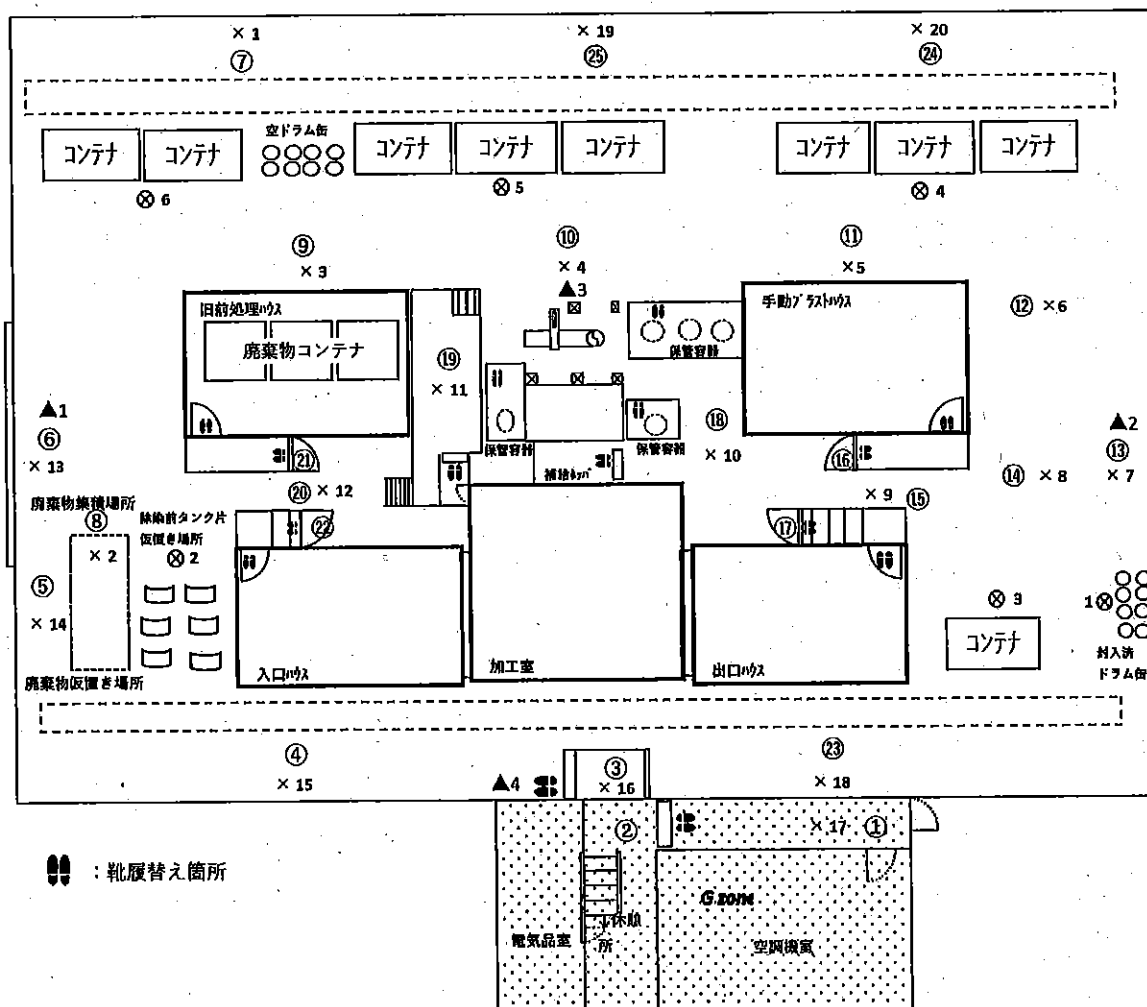

※各測定結果は次紙参照願います。

放射線管理記録

次紙 (2/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2024年度)	WID番号	240160	測定日時	2024年 7月 3日 7時50分～
------	-----------------------	-------	--------	------	--------------------

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ※	γ+β	測定目的
×1	0.001	0.01	北西側エリア環境把握(主作業範囲外)
×2	0.002	0.01	廃棄物集積場所前環境変動把握
×3	0.001	0.01	移動経路環境把握
×4	0.001	0.01	移動経路環境把握
×5	0.001	0.01	移動経路環境把握
×6	0.002	0.01	移動経路環境把握
×7	0.001	0.01	東側エリア・東側シャッター前環境把握
×8	0.002	0.01	除染後タンク片仮置エリア環境把握
×9	0.001	0.01	移動経路環境把握
×10	0.001	0.01	移動経路環境把握
×11	0.001	0.01	プラスト装置操作盤エリア環境把握
×12	0.001	0.01	移動経路環境把握
×13	0.002	0.01	西側エリア・西側シャッター前環境把握
×14	0.001	0.01	廃棄物仮置き場所前環境変動把握
×15	0.001	0.01	南西エリア環境把握(主作業範囲外)
×16	0.001	0.01	Y Zone入口・南側エリア環境把握
×17	0.001	0.01	大型機器点検建屋入口環境把握
×18	—	—	南東エリア環境把握(主作業範囲外)※
×19	—	—	北側エリア環境把握(主作業範囲外)※
×20	—	—	北東側エリア環境把握(主作業範囲外)※

※ 毎月1回測定

表面線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ	γ+β	測定箇所
⊗1	0.04	0.04	封入済ドラム缶
⊗2	0.02	0.04	除染前タンク片仮置場(遮へい前)
⊗3	0.002	0.01	除染済タンク片コンテナ(170024)
⊗4	0.002	0.01	除染済タンク片コンテナ(170232, 170071, 170116)
⊗5	0.002	0.01	除染前タンク片コンテナ(170183, 170045, 170179)
⊗6	0.006	0.02	除染前タンク片コンテナ(170113, 170051)

表面汚染密度(β)測定結果(スミア法:レートメータ時定数10秒)

測 定 器		F1-GMAD- 191			
換算定数		5.51E-3 Bq/cm ² ・cpm			
B . G 測定値		300 cpm			
検出限界値 (LTD)	スミア拭取効率0.1		7.8E-1 Bq/cm ²		
	NETcpm		141 cpm		
No	GROSS (cpm)	NET (cpm)	表面汚染密度 (Bq/cmf)	スミア 拭取効率	採取場所
①	300	0	LTD	0.1	大型機器点検建屋入口
②	300	0	LTD	0.1	移動経路 (靴下エリア)
③	300	0	LTD	0.1	Y Zone入口 (靴下エリア)
④	—	—	—	—	南西側エリア移動経路※
⑤	—	—	—	—	廃棄物仮置き場所前※
⑥	3000	2700	1.5E+1	0.1	西側シャッター前
⑦	—	—	—	—	北西側エリア移動経路※
⑧	—	—	—	—	廃棄物集積場所前※
⑨	—	—	—	—	移動経路※
⑩	3500	3200	1.8E+1	0.1	移動経路
⑪	—	—	—	—	移動経路※
⑫	—	—	—	—	移動経路※
⑬	1500	1200	6.6E+0	0.1	東側シャッター前エリア
⑭	—	—	—	—	除染後タンク片仮置エリア※
⑮	1800	1500	8.3E+0	0.1	移動経路
⑯	300	0	LTD	0.1	手動プラスチック/P (靴下エリア)
⑰	300	0	LTD	0.1	出口ハウスC/P (靴下エリア)
⑱	—	—	—	—	移動経路※
⑲	2300	2000	1.1E+1	0.1	プラスチック装置操作盤エリア
⑳	4300	4000	2.2E+1	0.1	移動経路
㉑	300	0	LTD	0.1	旧前処理ハウスC/P (靴下エリア)
㉒	300	0	LTD	0.1	入口ハウスC/P (靴下エリア)
㉓	—	—	—	—	南東エリア移動経路※
㉔	—	—	—	—	北東エリア移動経路※
㉕	—	—	—	—	北側エリア移動経路※

※ 毎月1回測定

空气中放射能濃度(β)測定結果

測定器	F1-GMAD-191 F1-DSH-024	
β線検出効率	60.5%	線源効率: 0.4
使用ろ紙: HR-40T 105φ	ろ紙有効面積: 62.2cm ²	
捕集流量	888.3	ℓ/min
補正係数	0.62	
B・G測定値	300	cpm

※測定条件(レートメータ)


B・G測定時間: 10 sec

試料測定時間: 10 sec

No	捕集時間	捕集時間	積算流量(ℓ)	換算定数(Bq/cm ³ ・cpm)	検出限界値(Bq/cm ³)	Gross(cpm)	測定結果(Bq/cm ³)	作業内容
▲1	8:00 ~ 8:10	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300 LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲2	8:15 ~ 8:25	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300 LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲3	8:30 ~ 8:40	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300 LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲4	8:45 ~ 8:55	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300 LTD	大型機器点検建屋内環境測定

(1/2)

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)



放射線管理記録

次紙 (2/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2024年度)	WID番号	240160	測定日時	2024年 7月 2日 7時50分～
------	-----------------------	-------	--------	------	--------------------

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ*	γ+β	測定目的
× 1	0.001	0.01	北西側エリア環境把握(主作業範囲外)
× 2	0.002	0.01	廃棄物集積場所前環境変動把握
× 3	0.001	0.01	移動経路環境把握
× 4	0.001	0.01	移動経路環境把握
× 5	0.001	0.01	移動経路環境把握
× 6	0.002	0.01	移動経路環境把握
× 7	0.001	0.01	東側エリア・東側シャッター前環境把握
× 8	0.002	0.01	除染後タンク片仮置エリア環境把握
× 9	0.001	0.01	移動経路環境把握
× 10	0.001	0.01	移動経路環境把握
× 11	0.001	0.01	プラスト装置操作盤エリア環境把握
× 12	0.001	0.01	移動経路環境把握
× 13	0.002	0.01	西側エリア・西側シャッター前環境把握
× 14	0.001	0.01	廃棄物仮置き場所前環境変動把握
× 15	0.001	0.01	南西エリア環境把握(主作業範囲外)
× 16	0.001	0.01	Y Zone入口・南側エリア環境把握
× 17	0.001	0.01	大型機器点検建屋入口環境把握
× 18	—	—	南東エリア環境把握(主作業範囲外)※
× 19	—	—	北側エリア環境把握(主作業範囲外)※
× 20	—	—	北東側エリア環境把握(主作業範囲外)※

※ 毎月1回測定

表面線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ	γ+β	測定箇所
⊗ 1	0.04	0.04	封入済ドラム缶
⊗ 2	0.02	0.04	除染前タンク片仮置場(遮へい前)
⊗ 3	0.002	0.01	空片コンテナ(170024)
⊗ 4	0.002	0.01	除染済タンク片コンテナ(170232、170071、170115)
⊗ 5	0.002	0.01	除染前タンク片コンテナ(170183、170045、170179)
⊗ 6	0.006	0.02	除染前タンク片コンテナ(170113、170051)

表面汚染密度(β)測定結果(スミア法:レートメータ時定数10秒)

測定器	F1-GMAD-191
換算定数	5.51E-3 Bq/cm ² ・cpm
B・G測定値	300 cpm
検出限界値(LTD)	スミア拭取効率0.1 7.8E-1 Bq/cm ² NETcpm 141 cpm

No	GROSS (cpm)	NET (cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm ²)	スミア拭取効率	採取場所
①	300	0	LTD	0.1	大型機器点検建屋入口
②	300	0	LTD	0.1	移動経路(靴下エリア)
③	300	0	LTD	0.1	Y Zone入口(靴下エリア)
④	—	—	—	—	南西側エリア移動経路※
⑤	—	—	—	—	廃棄物仮置き場所前※
⑥	2800	2600	1.4E+1	0.1	西側シャッター前
⑦	—	—	—	—	北西側エリア移動経路※
⑧	—	—	—	—	廃棄物集積場所前※
⑨	—	—	—	—	移動経路※
⑩	2000	1700	9.4E+0	0.1	移動経路
⑪	—	—	—	—	移動経路※
⑫	—	—	—	—	移動経路※
⑬	1800	1500	8.3E+0	0.1	東側シャッター前エリア
⑭	—	—	—	—	除染後タンク片仮置エリア※
⑮	2000	1700	9.4E+0	0.1	移動経路
⑯	300	0	LTD	0.1	手動プラストハウスC/P(靴下エリア)
⑰	300	0	LTD	0.1	出口ハウスC/P(靴下エリア)
⑱	—	—	—	—	移動経路※
⑲	1500	1200	6.6E+0	0.1	プラスト装置操作盤エリア
⑳	3800	3500	1.9E+1	0.1	移動経路
㉑	300	0	LTD	0.1	旧前処理ハウスC/P(靴下エリア)
㉒	300	0	LTD	0.1	入口ハウスC/P(靴下エリア)
㉓	—	—	—	—	南東エリア移動経路※
㉔	—	—	—	—	北東エリア移動経路※
㉕	—	—	—	—	北側エリア移動経路※

※ 毎月1回測定

空气中放射能濃度(β)測定結果

測定器	F1-GMAD-191 F1-DSH-024		
β線機器効率:	60.5%	線源効率: 0.4	
使用ろ紙: HE-40T 105 φ	ろ紙有効面積:	62.2cm ²	
捕集流量	888.3	ℓ/min	
補正係数	0.62		
B.G 測定値	300	cpm	

※測定条件(レートメータ)

B・G測定時間: 10 sec

試料測定時間: 10 sec

No	捕集時間	捕集時間	積算流量 (ℓ)	換算定数 (Bq/cm ³ ・cpm)	検出限界値 (Bq/cm ³)	Gross (cpm)	測定結果 (Bq/cm ³)	作業内容
▲1	8:00 ~ 8:10	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300	LTD 大型機器点検建屋内環境測定
▲2	8:15 ~ 8:25	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300	LTD 大型機器点検建屋内環境測定
▲3	8:30 ~ 8:40	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300	LTD 大型機器点検建屋内環境測定
▲4	8:45 ~ 8:55	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300	LTD 大型機器点検建屋内環境測定

放射線管理記録

運用部 運用支援G		
GM	メンバー	


放管責任者	Gr責任者	担当者

(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2024年度)				測定項目	■ γ ■ $\beta + \gamma$ ■ スミ ■ ダスト
WID番号	240160		天候	曇り	測定者	
測定日時	2024年 7月 1日 7時 50分～				測定器	F1-ICWBL-169、リ-ICW-439
測定場所	大型機器点検建屋					F1-DSH-024、F1-GMAD-191
作業内容 (測定目的)	タンク片プラスト除染				区域区分	Y zone (β 線対象エリア)
	(上記に伴う環境サーベイ)				防護装備 & 措置	全面マスク+カバーオール(2重)
最大値	γ (mSv/h)	0.04	$\beta + \gamma$ (mSv/h)	0.04		
	$\text{スミ}(\beta)$ (Bq/cm ²)	2.3E+1	$\text{ダスト}(\beta)$ (Bq/cm ²)	<3.52E-6	特記事項	

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)

大型機器点検建屋

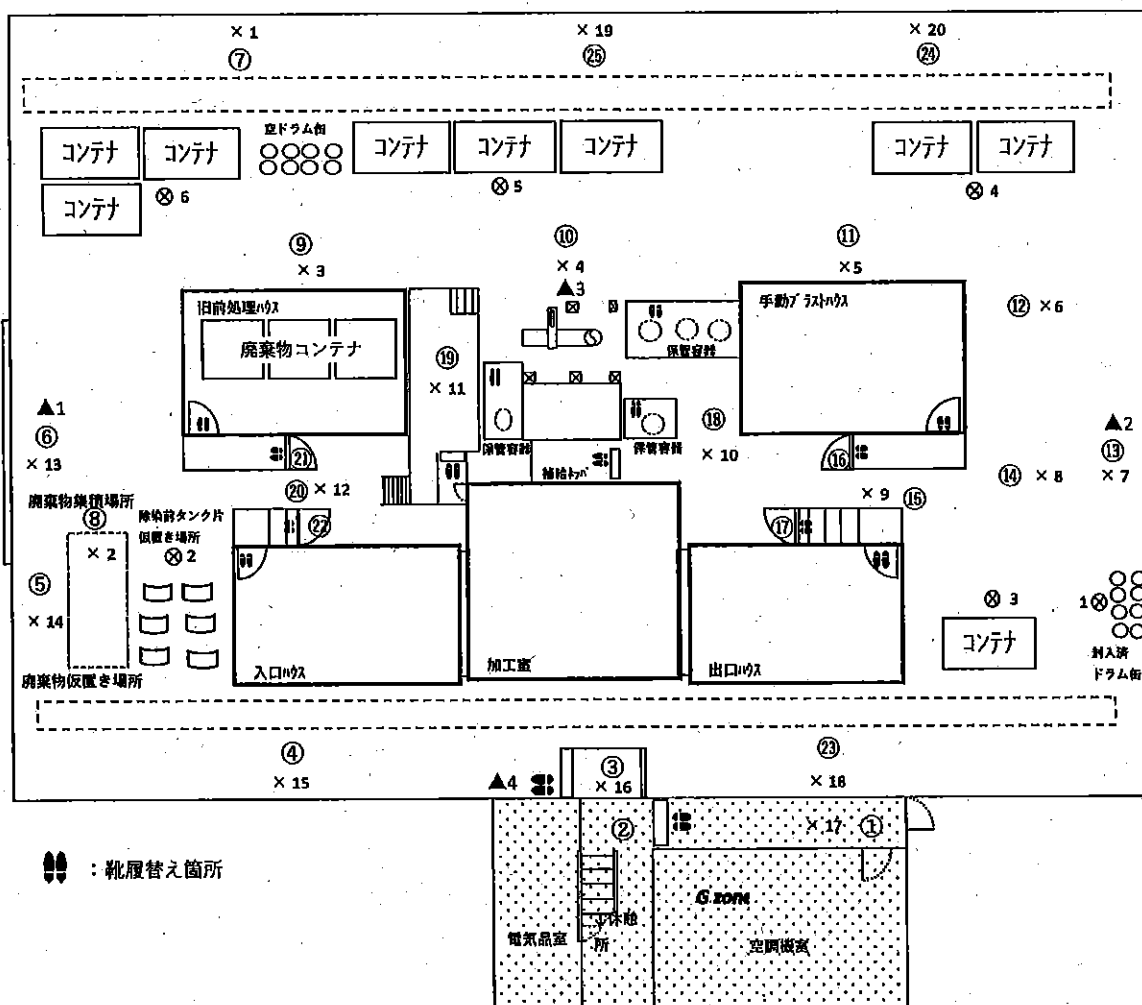

※各測定結果は次紙参照願います。

放射線管理記録

次紙 (2/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2024年度)	WID番号	240160	測定日時	2024年 7月 1日 7時50分～
------	-----------------------	-------	--------	------	--------------------

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ*	γ+β	測定目的
×1	0.001	0.01	北西側エリア環境把握(主作業範囲外)
×2	0.002	0.01	廃棄物集積場所前環境変動把握
×3	0.001	0.01	移動経路環境把握
×4	0.001	0.01	移動経路環境把握
×5	0.001	0.01	移動経路環境把握
×6	0.002	0.01	移動経路環境把握
×7	0.001	0.01	東側エリア・東側シャッター前環境把握
×8	0.002	0.01	除染後タンク片仮置エリア環境把握
×9	0.001	0.01	移動経路環境把握
×10	0.001	0.01	移動経路環境把握
×11	0.001	0.01	プラスト装置操作盤エリア環境把握
×12	0.001	0.01	移動経路環境把握
×13	0.002	0.01	西側エリア・西側シャッター前環境把握
×14	0.001	0.01	廃棄物仮置き場所前環境変動把握
×15	0.001	0.01	南西エリア環境把握(主作業範囲外)
×16	0.001	0.01	Y Zone入口・南側エリア環境把握
×17	0.001	0.01	大型機器点検建屋入口環境把握
×18	0.001	0.01	南東エリア環境把握(主作業範囲外)※
×19	0.001	0.01	北側エリア環境把握(主作業範囲外)※
×20	0.001	0.01	北東側エリア環境把握(主作業範囲外)※

※ 毎月1回測定

表面線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ	γ+β	測定箇所
⊗1	0.04	0.04	封入済ドラム缶
⊗2	0.02	0.04	除染前タンク片仮置場(遮へい前)
⊗3	0.002	0.01	空片コンテナ(170115)
⊗4	0.002	0.01	除染後タンク片コンテナ(170232、170071)
⊗5	0.002	0.01	除染前タンク片コンテナ(170183、170045、170179)
⊗6	0.006	0.02	除染前タンク片コンテナ(170024、170113、170051)

表面汚染密度(β)測定結果(スミア法:レートメータ時定数10秒)

測定器	FI-GMAD-191	
換算定数	5.51E-3 Bq/cm ² ・cpm	
B・G測定値	300 cpm	
検出限界値(LTD)	スミア拭取効率0.1	7.8E-1 Bq/cm ²
	NETcpm	141 cpm

No	GROSS (cpm)	NET (cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm ²)	スミア拭取効率	採取場所
①	300	0	LTD	0.1	大型機器点検建屋入口
②	300	0	LTD	0.1	移動経路(靴下エリア)
③	300	0	LTD	0.1	Y Zone入口(靴下エリア)
④	2300	2000	1.1E+1	0.1	南西側エリア移動経路※
⑤	3500	3200	1.8E+1	0.1	廃棄物仮置き場所前※
⑥	2000	1700	9.4E+0	0.1	西側シャッター前
⑦	3800	3500	1.9E+1	0.1	北西側エリア移動経路※
⑧	4500	4200	2.3E+1	0.1	廃棄物集積場所前※
⑨	1800	1500	8.3E+0	0.1	移動経路※
⑩	2800	2500	1.4E+1	0.1	移動経路
⑪	3000	2700	1.5E+1	0.1	移動経路※
⑫	3000	2700	1.5E+1	0.1	移動経路※
⑬	2300	2000	1.1E+1	0.1	東側シャッター前エリア
⑭	3200	2900	1.6E+1	0.1	除染後タンク片仮置エリア※
⑮	2600	2300	1.3E+1	0.1	移動経路
⑯	300	0	LTD	0.1	手動プラストハウスC/P(靴下エリア)
⑰	300	0	LTD	0.1	出口ハウスC/P(靴下エリア)
⑱	3000	2700	1.5E+1	0.1	移動経路※
⑲	2800	2500	1.4E+1	0.1	プラスト装置操作盤エリア
⑳	4500	4200	2.3E+1	0.1	移動経路
㉑	300	0	LTD	0.1	旧前処理ハウスC/P(靴下エリア)
㉒	300	0	LTD	0.1	入口ハウスC/P(靴下エリア)
㉓	3000	2700	1.5E+1	0.1	南東エリア移動経路※
㉔	3200	2900	1.6E+1	0.1	北東エリア移動経路※
㉕	2800	2500	1.4E+1	0.1	北側エリア移動経路※

※ 毎月1回測定

空气中放射能濃度(β)測定結果

測定器	FI-GMAD-191 FI-DSH-024	
β線機器効率:	60.5%	線源効率: 0.4
使用ろ紙: HE-40T 105φ ろ紙有効面積: 62.2cm ²		
捕集流量	888.3	ℓ/min
補正係数	0.62	
B・G測定値	300 cpm	

※測定条件(レートメータ)

B・G測定時間: 10 sec
試料測定時間: 10 sec

No	捕集時間	捕集時間	積算流量 (ℓ)	換算定数 (Bq/cm ³ ・cpm)	検出限界値 Bq/cm ³	cpm	Gross (cpm)	測定結果 (Bq/cm ³)	作業内容
▲1	8:00 ~ 8:10	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲2	8:15 ~ 8:25	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲3	8:30 ~ 8:40	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲4	8:45 ~ 8:55	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300	LTD	大型機器点検建屋内環境測定

放射線管理記録

運用部 運用支援G	
GM	メンバー


放管責任者	Gr責任者	担当者

(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2024年度)				測定項目	■ γ ■ $\beta + \gamma$ ■ スミア ■ ダスト
WID番号	240160		天候	曇り	測定者	
測定日時	2024年 6月 28日 7時 50分～				測定器	F1-ICWBL-169、J1-ICW-439
測定場所	大型機器点検建屋					F1-DSH-024、F1-GMAD-191
作業内容 (測定目的)	タンク片プラスト除染				区域区分	Y zone (β 線対象エリア)
	(上記に伴う環境サーベイ)				防護装備 & 措置	全面マスク+カバーオール(2重)
最大値	γ (mSv/h)	0.04	$\beta + \gamma$ (mSv/h)	0.04	特記事項	
	スミア(β)(Bq/cm ²)	2.6E+1	ダスト(β)(Bq/cm ³)	<3.52E-6		

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)

大型機器点検建屋

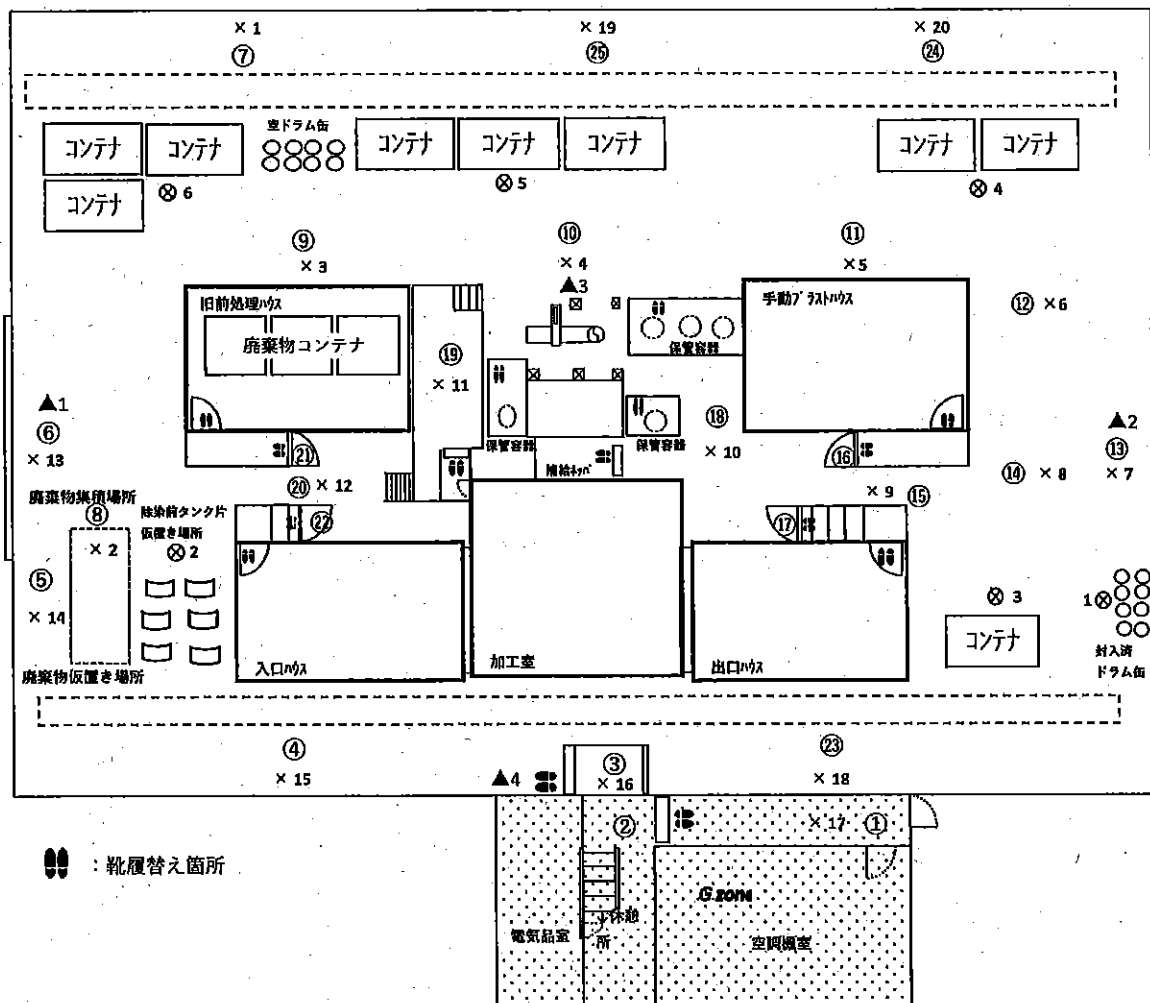

※各測定結果は次紙参照願います。

放射線管理記録

次紙 (2/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2024年度)	WID番号	240160	測定日時	2024年 6月 28日 7時50分～
------	-----------------------	-------	--------	------	---------------------

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ※	γ+β	測定目的
×1	—	0.01	北西側エリア環境把握(主作業範囲外)
×2	—	0.01	廃棄物集積場所前環境変動把握
×3	—	0.01	移動経路環境把握
×4	—	0.01	移動経路環境把握
×5	—	0.01	移動経路環境把握
×6	—	0.01	移動経路環境把握
×7	—	0.01	東側エリア・東側シャッター前環境把握
×8	—	0.01	除染後タンク片仮置エリア環境把握
×9	—	0.01	移動経路環境把握
×10	—	0.01	移動経路環境把握
×11	—	0.01	プラスト装置操作盤エリア環境把握
×12	—	0.01	移動経路環境把握
×13	—	0.01	西側エリア・西側シャッター前環境把握
×14	—	0.01	廃棄物仮置き場所前環境変動把握
×15	—	0.01	南西エリア環境把握(主作業範囲外)
×16	—	0.01	Y Zone入口・南側エリア環境把握
×17	—	0.01	大型機器点検建屋入口環境把握
×18	—	—	南東エリア環境把握(主作業範囲外)※
×19	—	—	北側エリア環境把握(主作業範囲外)※
×20	—	—	北東側エリア環境把握(主作業範囲外)※

※ 毎月1回測定

表面線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ	γ+β	測定箇所
⊗1	0.04	0.04	封入済ドラム缶
⊗2	0.02	0.04	除染前タンク片仮置場(巡へい前)
⊗3	0.002	0.01	空片コンテナ(170115)
⊗4	0.002	0.01	除染済タンク片コンテナ(170232、170071)
⊗5	0.002	0.01	除染前タンク片コンテナ(170183、170045、170179)
⊗6	0.006	0.02	除染前タンク片コンテナ(170024、170113、170051)

表面汚染密度(β)測定結果(スミア法:レートメータ時定数10秒)

測定器	F1-GMAD-191
換算定数	5.51E-3 Bq/cm ² ・cpm
B・G測定値	300 cpm
検出限界値(LTD)	スミア拭取効率0.1 7.8E-1 Bq/cm ² NETcpm 141 cpm

No	GROSS (cpm)	NET (cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm ²)	スミア拭取効率	採取場所
①	300	0	LTD	0.1	大型機器点検建屋入口
②	300	0	LTD	0.1	移動経路(靴下エリア)
③	300	0	LTD	0.1	Y Zone入口(靴下エリア)
④	—	—	—	—	南西側エリア移動経路※
⑤	—	—	—	—	廃棄物仮置き場所前※
⑥	4300	4000	2.2E+1	0.1	西側シャッター前
⑦	—	—	—	—	北西側エリア移動経路※
⑧	—	—	—	—	廃棄物集積場所前※
⑨	—	—	—	—	移動経路※
⑩	3500	3200	1.8E+1	0.1	移動経路
⑪	—	—	—	—	移動経路※
⑫	—	—	—	—	移動経路※
⑬	1000	700	3.9E+0	0.1	東側シャッター前エリア
⑭	—	—	—	—	除染後タンク片仮置エリア※
⑮	2300	2000	1.1E+1	0.1	移動経路
⑯	300	0	LTD	0.1	手動プラスチック/P(靴下エリア)
⑰	300	0	LTD	0.1	出口プラスチック/P(靴下エリア)
⑱	—	—	—	—	移動経路※
⑲	3000	2700	1.5E+1	0.1	プラスト装置操作盤エリア
⑳	5000	4700	2.6E+1	0.1	移動経路
㉑	300	0	LTD	0.1	旧前処理ハウスC/P(靴下エリア)
㉒	300	0	LTD	0.1	入口ハウスC/P(靴下エリア)
㉓	—	—	—	—	南東エリア移動経路※
㉔	—	—	—	—	北東エリア移動経路※
㉕	—	—	—	—	北側エリア移動経路※

※ 毎月1回測定

空气中放射能濃度(β)測定結果

測定器	F1-GMAD-191 F1-DSH-024		
β線機器効率:	60.5%	線源効率:	0.4
使用ろ紙: HE-40T 105 φ	ろ紙有効面積: 62.2cm ²		
捕集流量	888.3	ℓ/min	
補正係数	0.62		
B.G測定値	300	cpm	

※測定条件(レートメータ)

B・G測定時間: 10 sec
試料測定時間: 10 sec

No	捕集時間	捕集時間	積算流量 (ℓ)	換算定数 (Bq/cm ³ ・cpm)	検出限界値 (Bq/cm ³)	Gross (cpm)	測定結果 (Bq/cm ³)	作業内容
▲1	8:00 ~ 8:10	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300 LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲2	8:15 ~ 8:25	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300 LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲3	8:30 ~ 8:40	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300 LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲4	8:45 ~ 8:55	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300 LTD	大型機器点検建屋内環境測定

放射線管理記録

運用部 運用支援G	
GM	メンバー


放管責任者	Gr責任者	担当者

(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2024年度)				測定項目	■ γ ■ $\beta + \gamma$ ■ スミア ■ ダスト
WID番号	240160		天候	晴	測定者	
測定日時	2024年 6月 27日 7時 50分～				測定器	F1-ICWBL-169、リ-ICW-439
測定場所	大型機器点検建屋					F1-DSH-024、F1-GMAD-191
作業内容 (測定目的)	タンク片ブラスト除染				区域区分	Y zone (β 線対象エリア)
	(上記に伴う環境サーベイ)				防護装備 & 措置	全面マスク+カバーオール(2重)
最大値	γ (mSv/h)	0.04	$\beta + \gamma$ (mSv/h)	0.04		
	スミア(β)(Bq/cm ²)	2.3E+1	ダスト(β)(Bq/cm ²)	<3.52E-6	特記事項	

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)

大型機器点検建屋

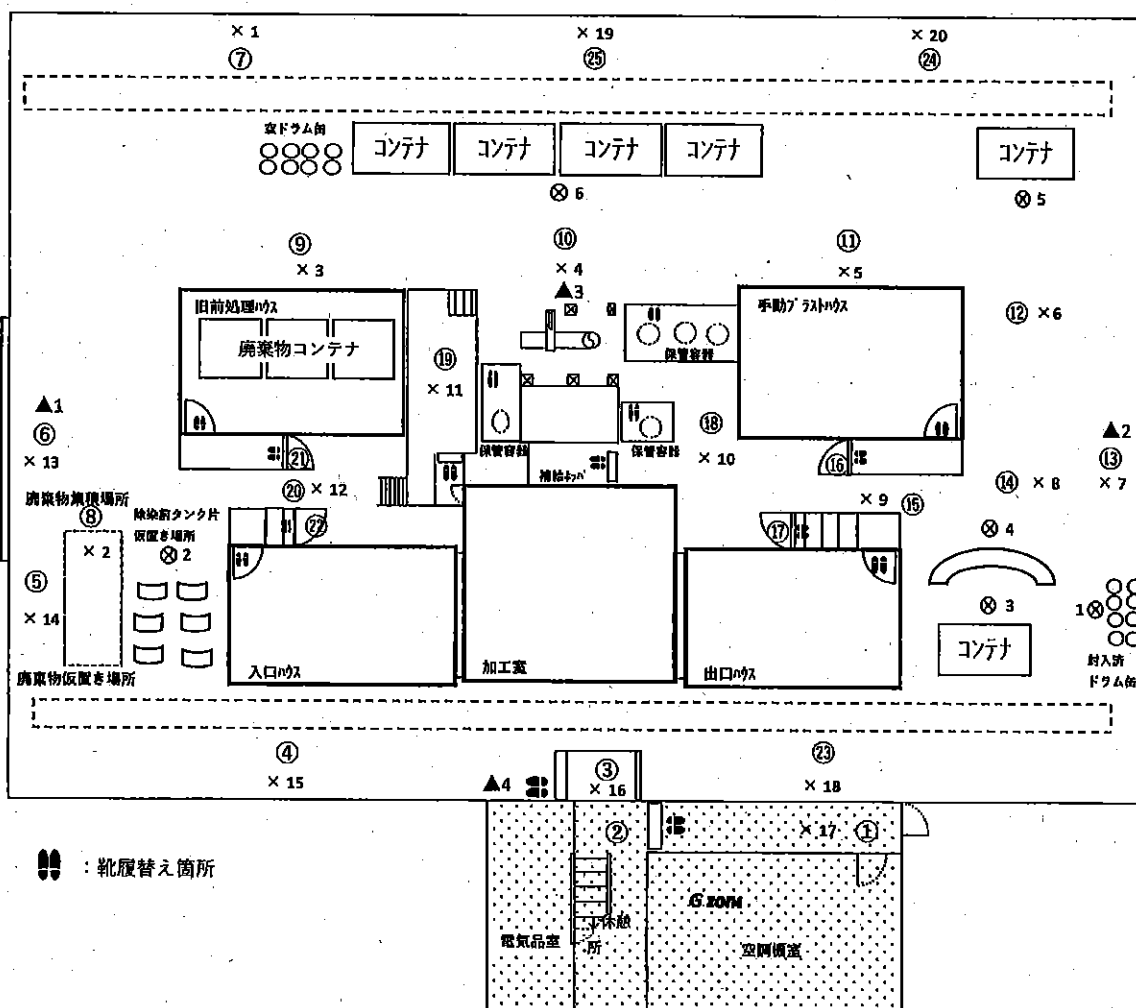

※各測定結果は次紙参照願います。

放射線管理記録

次紙 (2/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2024年度)	WID番号	240160	測定日時	2024年 6月 27日 7時50分～
------	-----------------------	-------	--------	------	---------------------

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)

空間線量当量率測定結果(mSv/h)			
No	γ*	γ+β	測定目的
×1	—	0.01	北西側エリア環境把握(主作業範囲外)
×2	—	0.01	廃棄物集積場所前環境変動把握
×3	—	0.01	移動経路環境把握
×4	—	0.01	移動経路環境把握
×5	—	0.01	移動経路環境把握
×6	—	0.01	移動経路環境把握
×7	—	0.01	東側エリア・東側シャッター前環境把握
×8	—	0.01	除染後タンク片仮置エリア環境把握
×9	—	0.01	移動経路環境把握
×10	—	0.01	移動経路環境把握
×11	—	0.01	プラスト装置操作盤エリア環境把握
×12	—	0.01	移動経路環境把握
×13	—	0.01	西側エリア・西側シャッター前環境把握
×14	—	0.01	廃棄物仮置き場所前環境変動把握
×15	—	0.01	南西側エリア環境把握(主作業範囲外)
×16	—	0.01	Y Zone入口・南側エリア環境把握
×17	—	0.01	大型機器点検建屋入口環境把握
×18	—	—	南東側エリア環境把握(主作業範囲外)※
×19	—	—	北側側面エリア環境把握(主作業範囲外)※
×20	—	—	北東側側面エリア環境把握(主作業範囲外)※

※ 毎月1回測定

表面線量当量率測定結果(mSv/h)			
No	γ	γ+β	測定箇所
⊗1	0.04	0.04	封入済ドラム缶
⊗2	0.02	0.04	除染前タンク片仮置場(遮へい前)
⊗3	0.002	0.01	空片コンテナ(170071)
⊗4	0.002	0.01	除染済タンク片
⊗5	0.002	0.01	除染済タンク片コンテナ(170232)
⊗6	0.008	0.01	除染前タンク片コンテナ(170183, 170011B, 17045, 170179)

表面汚染密度(β)測定結果(スミア法:レートメータ時定数10秒)				
測定器		FI-GMAD-191		
換算定数		5.51E-3 Bq/cm ² ・cpm		
B・G測定値		300 cpm		
検出限界値(LTD)	スミア拭取効率0.1	7.8E-1 Bq/cm ²		
	NETcpm	141 cpm		

No	GROSS (cpm)	NET (cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm ²)	スミア拭取効率	採取場所
①	300	0	LTD	0.1	大型機器点検建屋入口
②	300	0	LTD	0.1	移動経路(靴下エリア)
③	300	0	LTD	0.1	Y Zone入口(靴下エリア)
④	—	—	—	—	南西側エリア移動経路※
⑤	—	—	—	—	廃棄物仮置き場所前※
⑥	4000	3700	2.0E+1	0.1	西側シャッター前
⑦	—	—	—	—	北西側エリア移動経路※
⑧	—	—	—	—	廃棄物集積場所前※
⑨	—	—	—	—	移動経路※
⑩	3800	3500	1.9E+1	0.1	移動経路
⑪	—	—	—	—	移動経路※
⑫	—	—	—	—	移動経路※
⑬	1200	900	5.0E+0	0.1	東側シャッター前エリア
⑭	—	—	—	—	除染後タンク片仮置エリア※
⑮	2000	1700	9.4E+0	0.1	移動経路
⑯	300	0	LTD	0.1	手動プラストハウスC/P(靴下エリア)
⑰	300	0	LTD	0.1	出口ハウスC/P(靴下エリア)
⑱	—	—	—	—	移動経路※
⑲	1500	1200	6.6E+0	0.1	プラスト装置操作盤エリア
⑳	4500	4200	2.3E+1	0.1	移動経路
㉑	300	0	LTD	0.1	旧前処理ハウスC/P(靴下エリア)
㉒	300	0	LTD	0.1	入口ハウスC/P(靴下エリア)
㉓	—	—	—	—	南東側エリア移動経路※
㉔	—	—	—	—	北東側エリア移動経路※
㉕	—	—	—	—	北側側面エリア移動経路※

※ 毎月1回測定

空气中放射能濃度(β)測定結果			
測定器	FI-GMAD-191 FI-DSH-024		
β線機器効率:	60.5%	線源効率:	0.4
使用ろ紙:	HE-40T 105φ	ろ紙有効面積:	62.2cm ²
捕集流量	888.3	ℓ/min	
補正係数	0.62		
B・G測定値	300	cpm	

※測定条件(レートメータ)
B・G測定時間: 10 sec
試料測定時間: 10 sec

No	捕集時間	捕集時間	積算流量 (ℓ)	換算定数 (Bq/cm ³ ・cpm)	検出限界値 Bq/cm ³	cpm	Gross (cpm)	測定結果 (Bq/cm ³)	作業内容
▲1	8:00 ~ 8:10	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲2	8:15 ~ 8:25	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲3	8:30 ~ 8:40	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲4	8:45 ~ 8:55	10分	8883	2.49E-8	3.52E-6	141	300	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
