

1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

2025年7月31日



東京電力ホールディングス株式会社

1.定期散布（1号機）

定期散布

目 的

オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。

頻 度

1回/月

標準散布量

1.5L/m²以上

濃 度

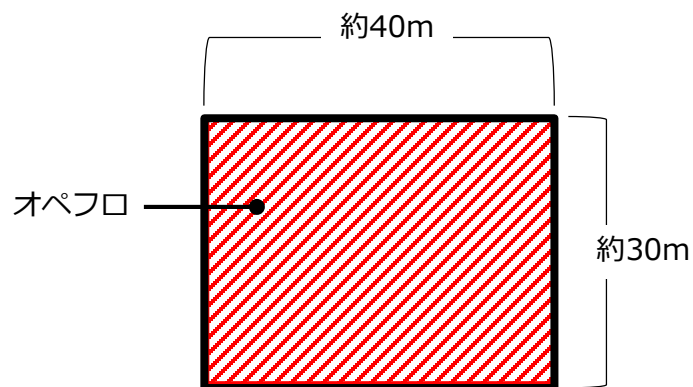
1/10

散布範囲



【凡例】

 : 散布範囲

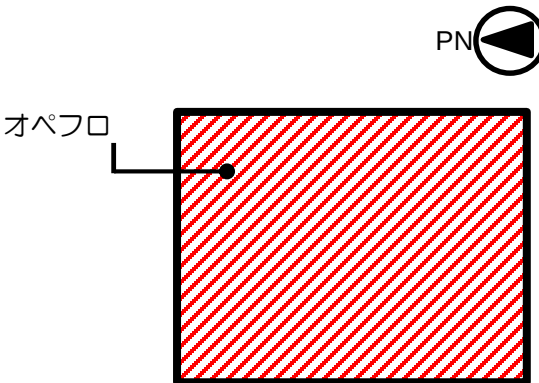
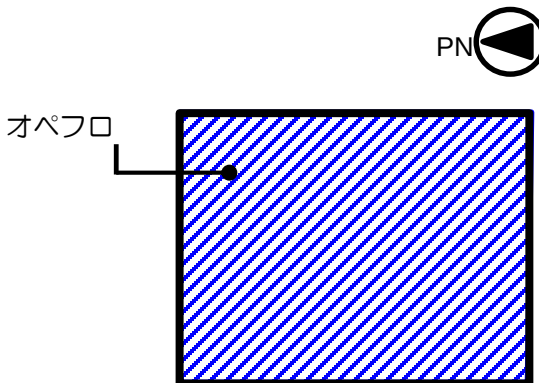
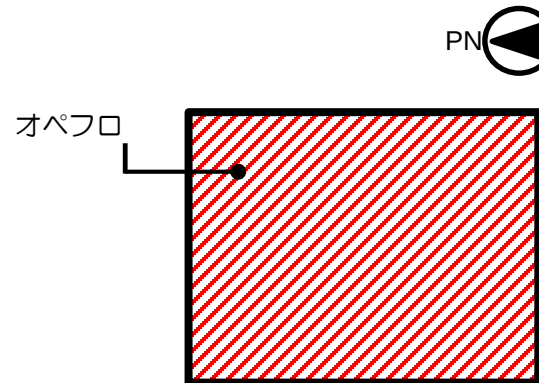


散布面積

1,234m²

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布			
目 的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃 度	1/10
散布対象 作業	ガレキ撤去		

定期散布の実績及び予定		
計画（7月）	実績（7月）	計画（8月）
完了予定日：7月 23日 	完了日：7月 19日 	完了予定日：8月 19日 

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2025年7月29日時点

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

6月	火	22（日）	23（月）	24（火）	25（水）	26（木）	27（金）	28（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	○	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※17	7.29E-05（最大） ND（最小）	9.16E-05（最大） ND（最小）	1.01E-04（最大） ND（最小）	7.47E-05（最大） ND（最小）	6.24E-05（最大） ND（最小）	7.96E-05（最大） 7.46E-07（最小）	9.30E-05（最大） ND（最小）
7月	水	29（日）	30（月）	1（火）	2（水）	3（木）	4（金）	5（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※18	1.01E-04（最大） ND（最小）	8.87E-05（最大） ND（最小）	8.87E-05（最大） ND（最小）	1.10E-04（最大） ND（最小）	9.77E-05（最大） ND（最小）	1.10E-04（最大） ND（最小）	8.26E-05（最大） ND（最小）
	木	6（日）	7（月）	8（火）	9（水）	10（木）	11（金）	12（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※19	7.97E-05（最大） ND（最小）	1.19E-04（最大） ND（最小）	3.85E-03（最大） ND（最小）	8.04E-04（最大） ND（最小）	6.73E-04（最大） ND（最小）	6.44E-04（最大） ND（最小）	6.36E-04（最大） ND（最小）
	金	13（日）	14（月）	15（火）	16（水）	17（木）	18（金）	19（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	○
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※20	6.03E-04（最大） ND（最小）	6.07E-04（最大） ND（最小）	7.14E-04（最大） ND（最小）	6.51E-04（最大） ND（最小）	5.65E-04（最大） ND（最小）	6.41E-04（最大） ND（最小）	5.85E-04（最大） ND（最小）
	土	20（日）	21（月）	22（火）	23（水）	24（木）	25（金）	26（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	○	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※21	6.04E-04（最大） ND（最小）	5.90E-04（最大） ND（最小）	6.01E-04（最大） ND（最小）	6.44E-04（最大） ND（最小）	1.04E-04（最大） ND（最小）	1.79E-05（最大） ND（最小）	1.18E-05（最大） ND（最小）
	日	27（日）	28（月）	29（火）	30（水）	31（木）	1（金）	2（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※22	1.27E-05（最大） ND（最小）	1.37E-05（最大） ND（最小）	－（最大） －（最小）	－（最大） －（最小）	－（最大） －（最小）	－（最大） －（最小）	－（最大） －（最小）

※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

2025年7月29日時点
