

1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

2025年8月28日



東京電力ホールディングス株式会社

1.定期散布（1号機）

定期散布

目 的

オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。

頻 度

1回/月

標準散布量

1.5L/m²以上

濃 度

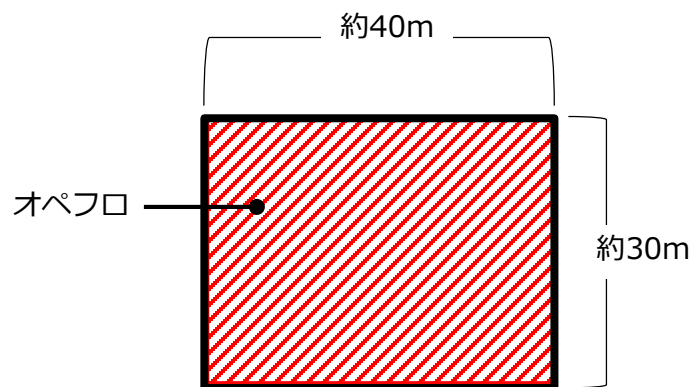
1/10

散布範囲



【凡例】

 : 散布範囲

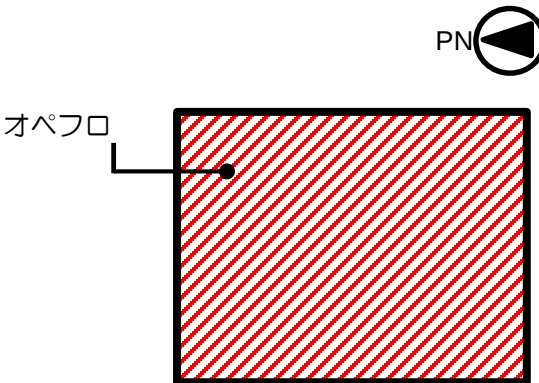
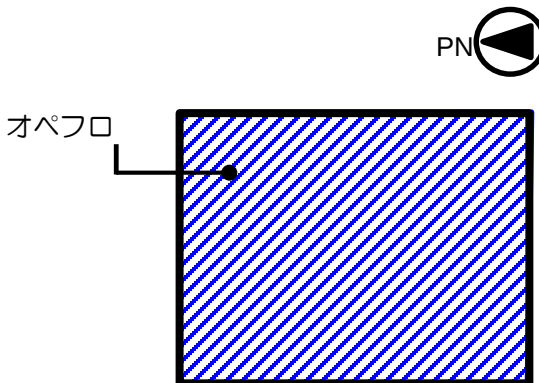
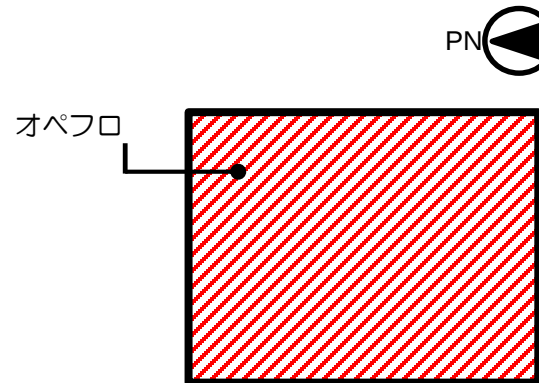


散布面積

1,234m²

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布			
目 的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃 度	1/10
散布対象 作業	ガレキ撤去		

定期散布の実績及び予定		
計画（8月）	実績（8月）	計画（9月）
完了予定日：8月 19日 	完了日：8月 12日 	完了予定日：9月 9日 

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2025年8月26日時点

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

7月	土	20（日）	21（月）	22（火）	23（水）	24（木）	25（金）	26（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	○	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※21	6.04E-04（最大） ND（最小）	5.90E-04（最大） ND（最小）	6.01E-04（最大） ND（最小）	6.44E-04（最大） ND（最小）	1.04E-04（最大） ND（最小）	1.79E-05（最大） ND（最小）	1.18E-05（最大） ND（最小）
	日	27（日）	28（月）	29（火）	30（水）	31（木）	1（金）	2（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※22	1.27E-05（最大） ND（最小）	1.37E-05（最大） ND（最小）	3.99E-05（最大） ND（最小）	5.16E-05（最大） ND（最小）	2.51E-05（最大） ND（最小）	1.34E-05（最大） ND（最小）	2.81E-05（最大） ND（最小）
8月	月	3（日）	4（月）	5（火）	6（水）	7（木）	8（金）	9（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※23	3.98E-05（最大） ND（最小）	7.50E-06（最大） ND（最小）	2.22E-05（最大） ND（最小）	2.51E-05（最大） ND（最小）	1.93E-05（最大） ND（最小）	3.98E-05（最大） ND（最小）	2.22E-05（最大） ND（最小）
	火	10（日）	11（月）	12（火）	13（水）	14（木）	15（金）	16（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	○	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※24	4.56E-05（最大） ND（最小）	4.27E-05（最大） ND（最小）	2.81E-05（最大） ND（最小）	2.22E-05（最大） ND（最小）	3.40E-05（最大） ND（最小）	2.52E-05（最大） ND（最小）	2.51E-05（最大） ND（最小）
	水	17（日）	18（月）	19（火）	20（水）	21（木）	22（金）	23（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	○	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※25	2.22E-05（最大） ND（最小）	2.81E-05（最大） ND（最小）	2.51E-05（最大） ND（最小）	2.81E-05（最大） ND（最小）	1.63E-05（最大） ND（最小）	3.10E-05（最大） ND（最小）	4.28E-05（最大） ND（最小）
	木	24（日）	25（月）	26（火）	27（水）	28（木）	29（金）	30（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※25	2.81E-05（最大） ND（最小）	6.04E-05（最大） ND（最小）	－（最大） －（最小）	－（最大） －（最小）	－（最大） －（最小）	－（最大） －（最小）	－（最大） －（最小）

※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

2025年8月26日時点
