


区分：Ⅲ


号機	3号機	
件名	原子炉建屋（非管理区域）における水漏れについて	
不適合の概要	<p>（事象の発生状況） 定期検査中の3号機において、平成23年1月27日午前11時59分頃、原子炉建屋地下1階の非常用ディーゼル発電機*（B）室（非管理区域）で、非常用ディーゼル発電機（B）付属機器の点検のため冷却水の水抜き作業を行っていたところ、当該作業に従事していた当直員が、水抜き用配管がつながっている排水口から床面に水が漏れいしていることを発見しました。 床面に溜まっていた漏れい水は約470リットルであり、水抜きのために開けていた弁を閉めたことにより、水漏れは停止しました。</p> <p>（安全性、外部への影響） 漏れた水には放射性物質は含まれておらず、本事象による外部への放射能の影響はありません。</p> <p>* 非常用ディーゼル発電機 所内電源喪失時に所内へ電源を供給するためのディーゼルエンジン駆動の非常用発電機。 ディーゼル発電機は3台設置されている。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / <u>その他設備</u></p>	<p><損傷の程度> <input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	床面に漏れた水については、同日、排水を行い、清掃を実施しました。今後、水漏れの原因について調査いたします。	

柏崎刈羽原子力発電所3号機
 原子炉建屋（非管理区域）における水漏れについて

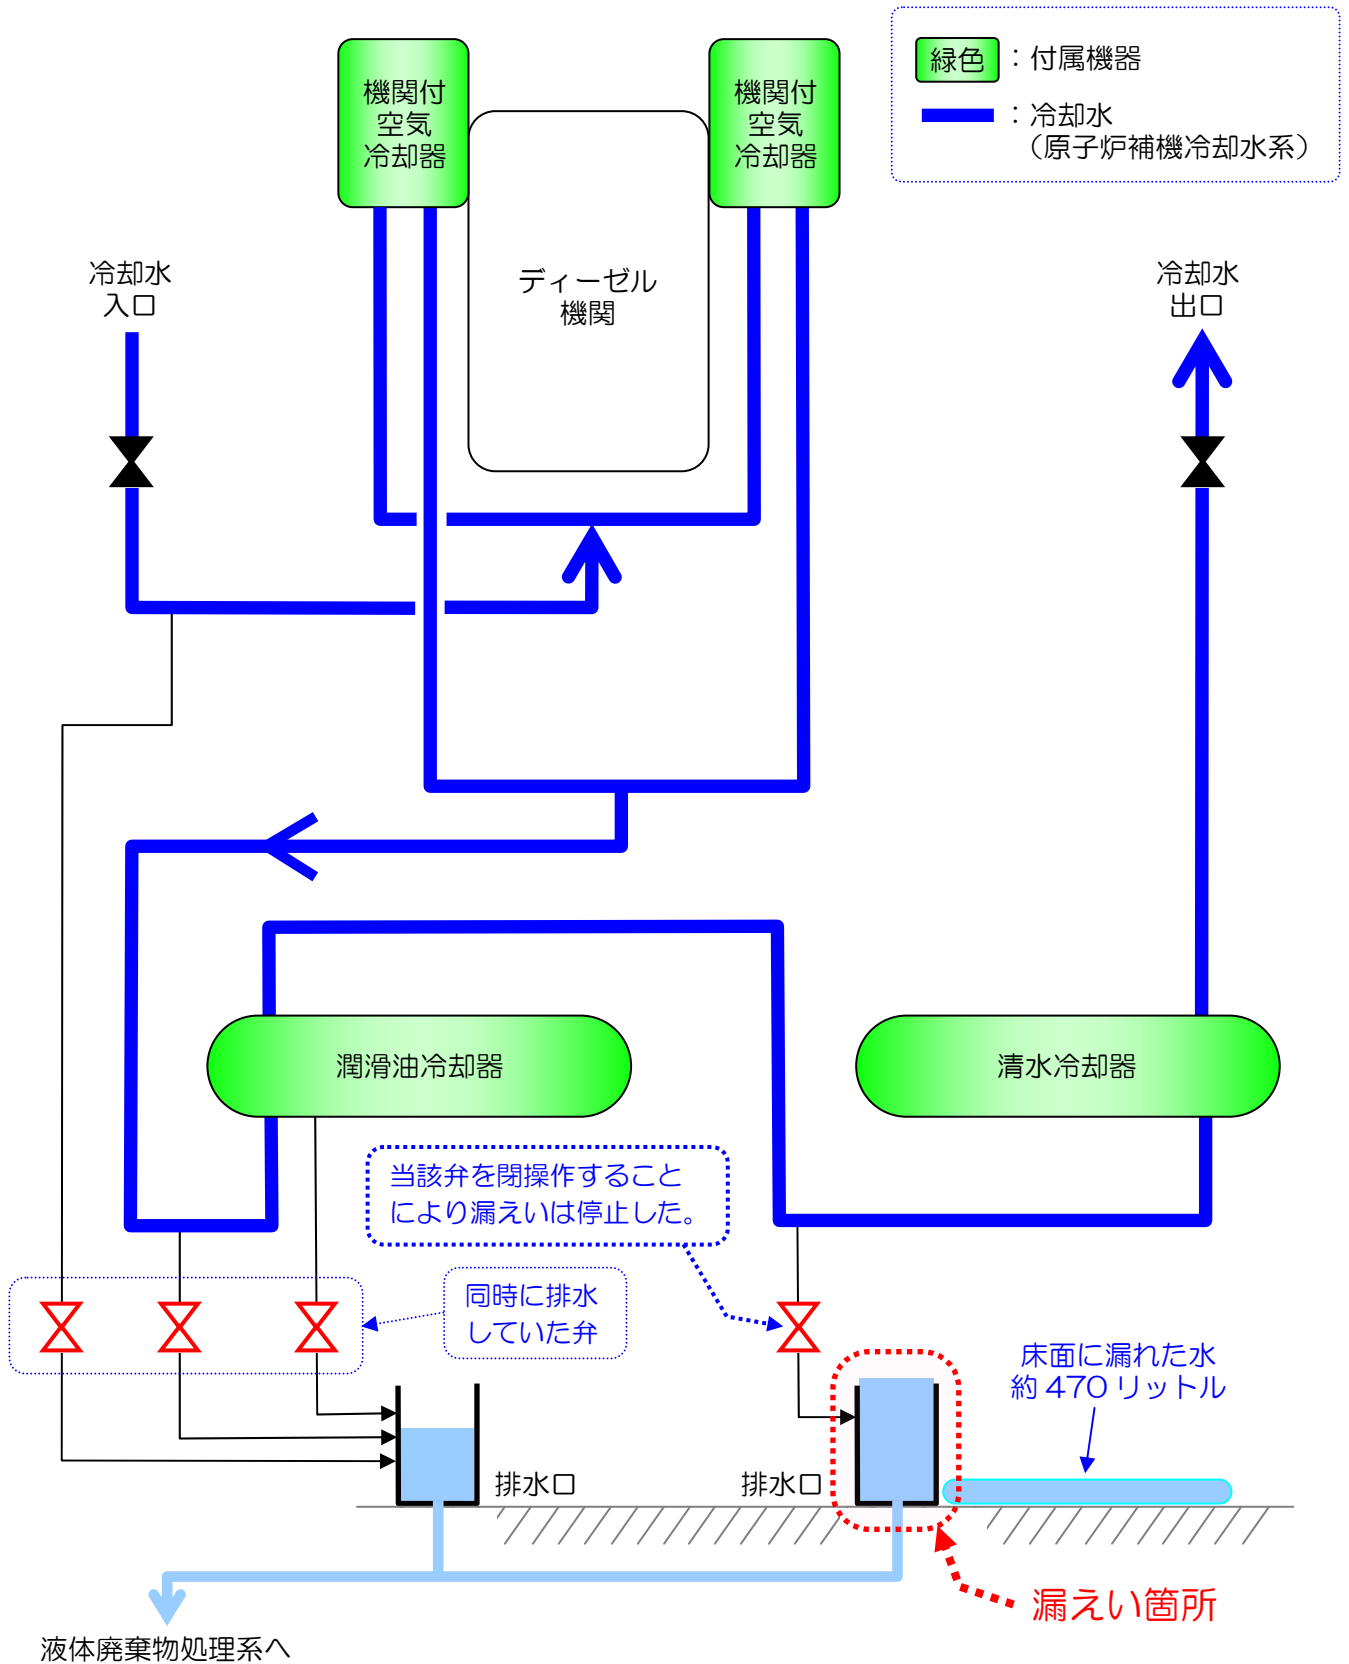

非常用ディーゼル発電機（B）室（非管理区域）
 水漏れ状況概略図

3号機 原子炉建屋（非管理区域）における水漏れについて

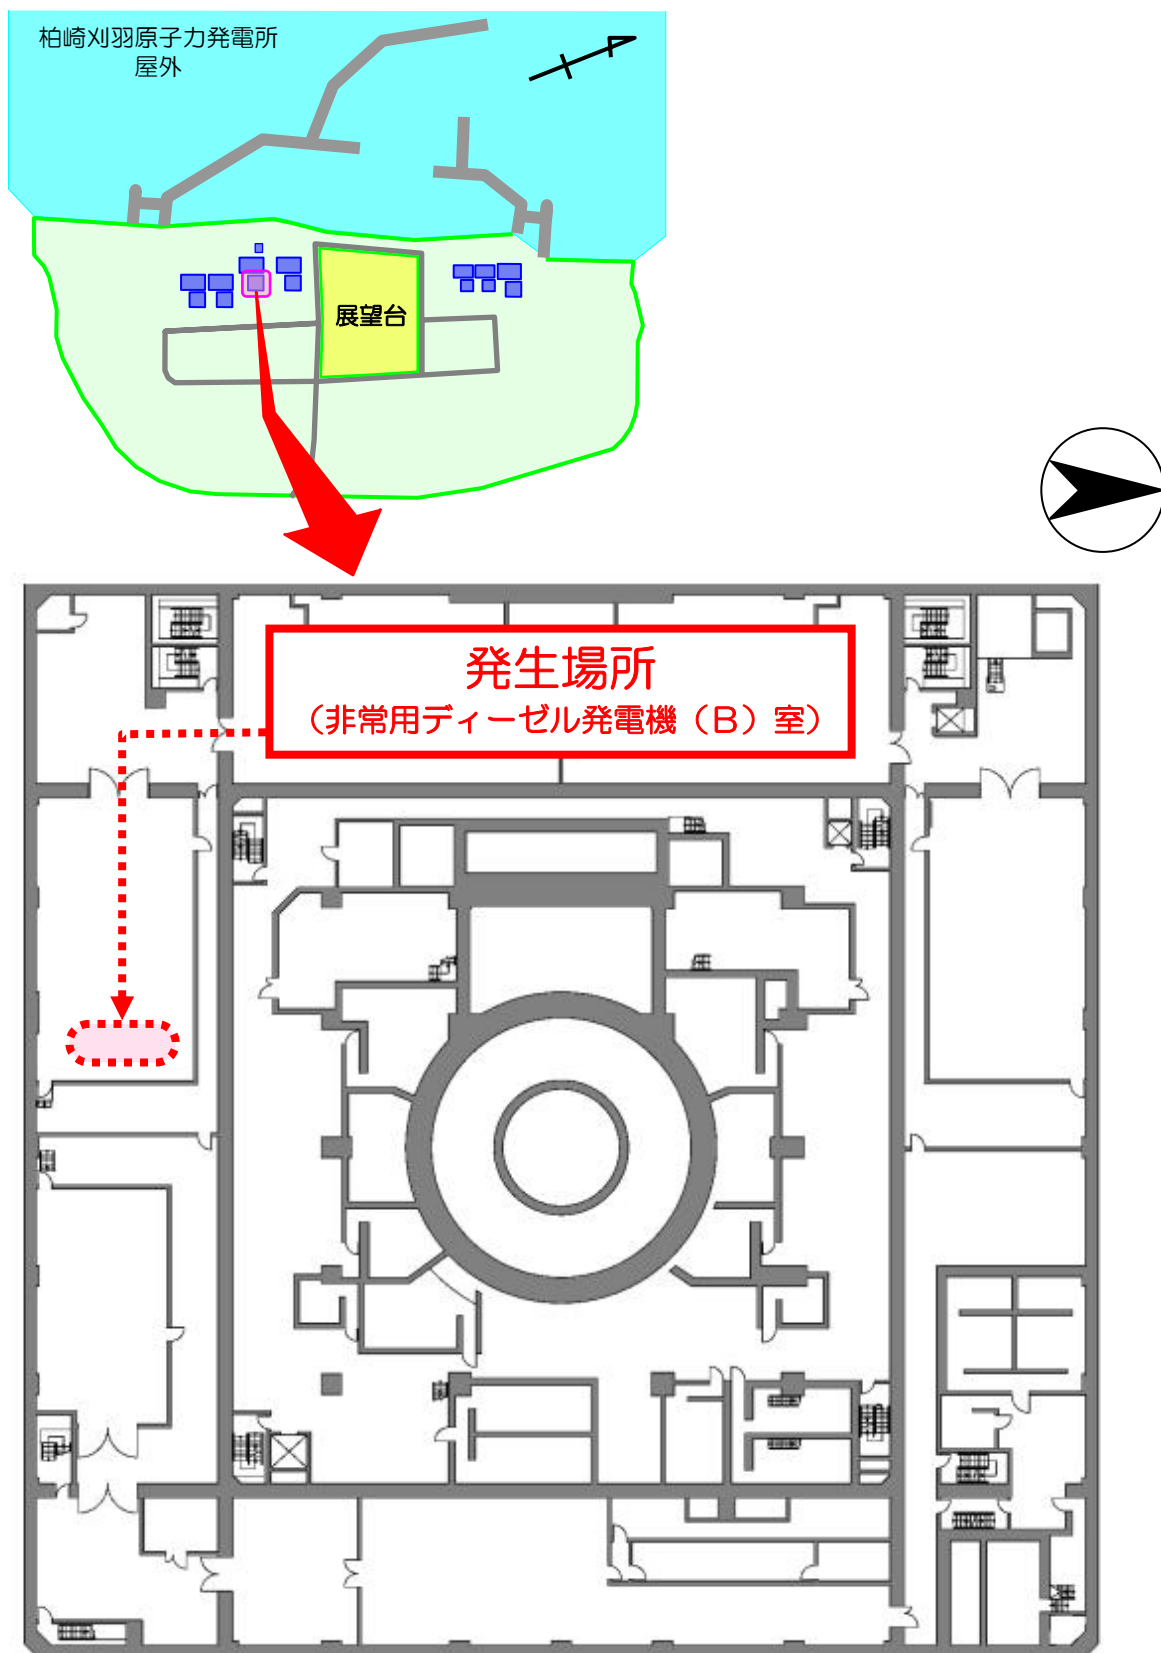

柏崎刈羽原子力発電所3号機 原子炉建屋 地下1階
