


荒浜側洞道内のケーブル火災 調査スケジュール

東京電力ホールディングス株式会社
 柏崎刈羽原子力発電所
 2018年11月21日

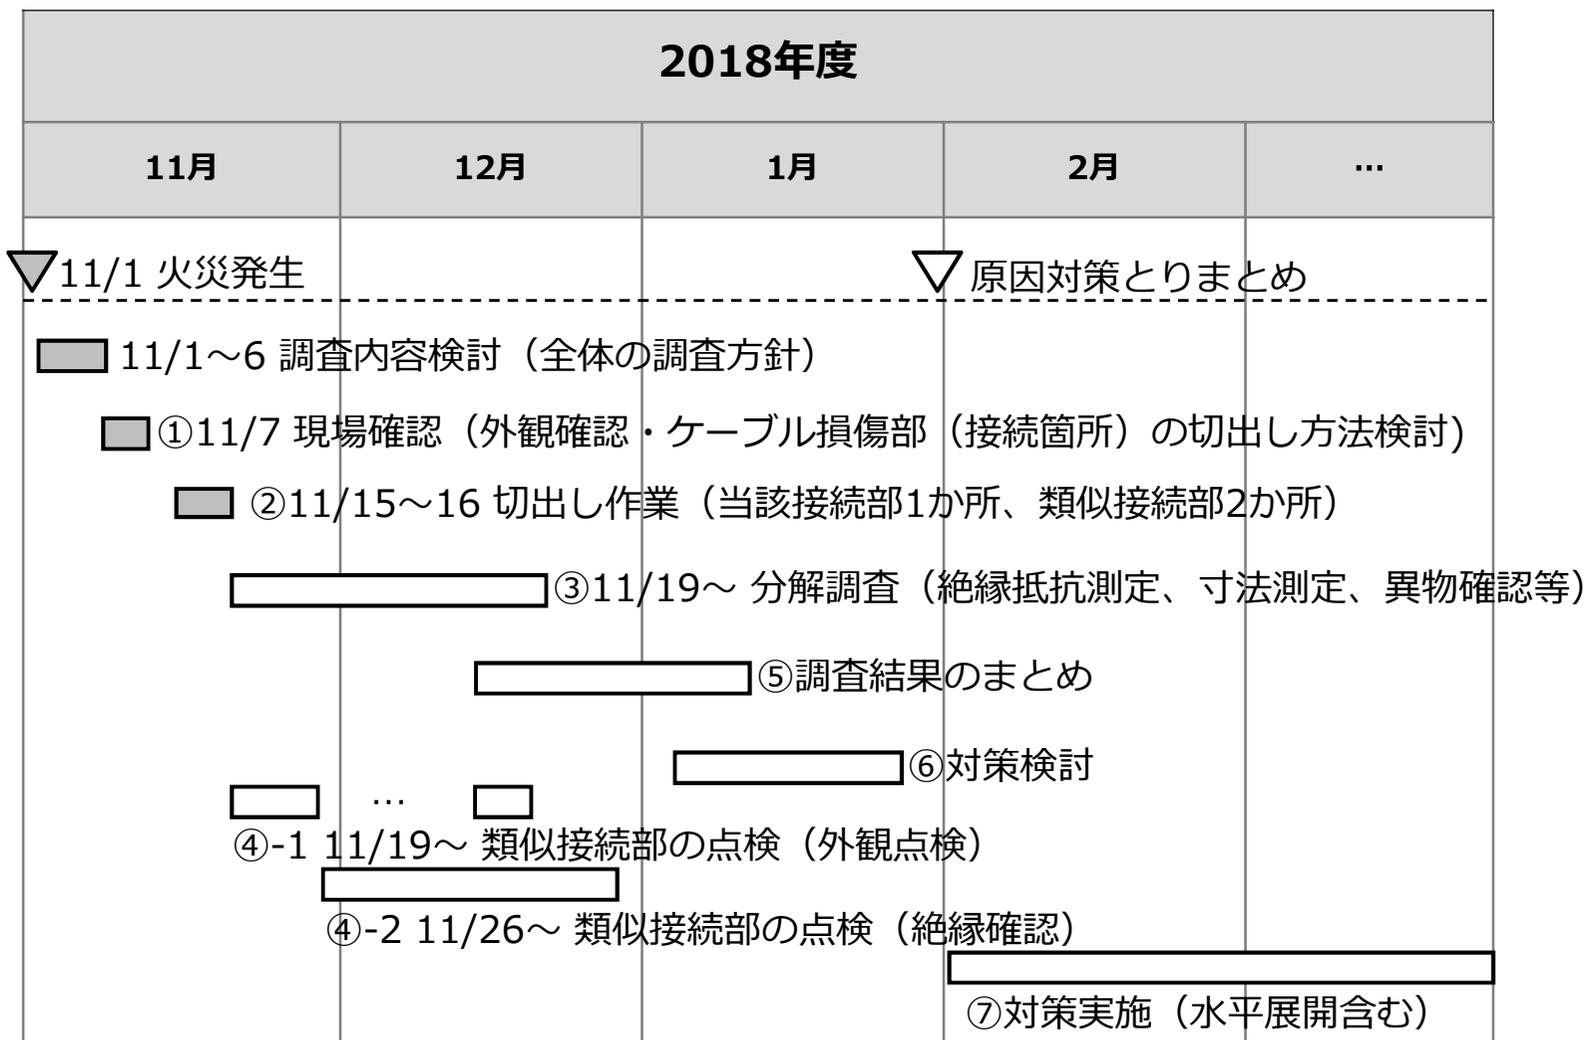

※③④ 分解調査及び類似接続部の点検等については、調査状況を踏まえて見直す場合あり

※④-1 一部の充電部や高所については、12月に実施

④類似接続部の点検(外観点検、絶縁確認) 調査スケジュール

東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
2018年11月21日

<④-1 外観点検>

(A) 外観確認 (全数：95か所)

(B) 熱画像撮影による確認 (充電中の箇所のみ：38か所)

全95か所		管理区域 内・外	11月				備考
			19日	20日	21日	22日	
外部電源 (10か所)		全て外			—	—	
非常用D/G (対象無し)		—	—	—	—	—	
第一GTG (対象無し)		—	—	—	—	—	
第二 GTG	共通 (18か所)	全て外	—				※1 (8か所)
	荒浜M/C (37か所)	全て外	—				
	大湊M/C (6か所)	全て外	—				※2 (1か所)
その他 (24か所)		全て外	—				※1 (9か所) ※2 (2か所)

✓ ※1～2 (20か所) については、以下の理由から12月に実施 (12月中に完了予定)

※1 充電部かつ養生されており、電源停止後、点検

※2 高所につき足場設置後に点検

✓ 外観確認 (全数：95か所) のうち、※1～2 (20か所) を除く、75か所について11月19日の週に実施 (11月22日中に完了予定)

<④-2 絶縁確認>

充電されていない接続部 (57か所) について、絶縁確認を実施 (11月26日以降)

※充電されている接続部 (38か所) については、現状で絶縁状態が維持されていることを確認している
