


7号機における原子炉系主要設備の健全性確認の進捗状況について

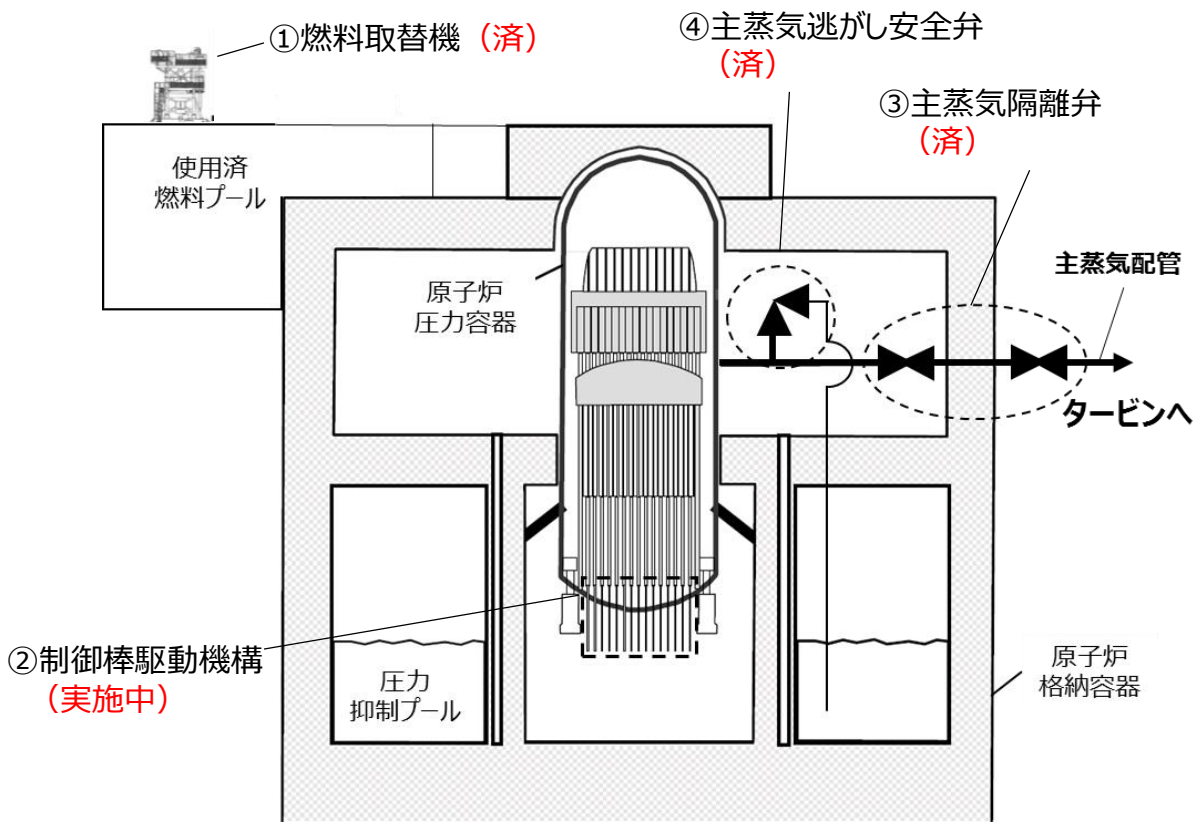

【これまでの進捗状況】

- ①燃料取替機の健全性確認：済
・3月10日～3月23日
- ②制御棒駆動機構の健全性確認：実施中
・3月24日～
- ③主蒸気隔離弁の健全性確認：済
・3月28日、29日（弁の全開・全閉）
・4月7日（漏えい確認）
- ④主蒸気逃がし安全弁の健全性確認：済
・5月25日

- ② 制御棒駆動機構の健全性確認を実施中（6月8日時点：204／205体実施）
 - ・不具合があると推定された燃料取替機の制御基板（3月27日公表）は、メーカーにて詳細調査中
 - ・消灯すべき表示が消灯しない事案（5月25日公表）については、原因を継続調査中
- ④ 主蒸気逃がし安全弁の健全性確認を5月25日に実施済
