


福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 (護岸地下水サンプリング箇所)

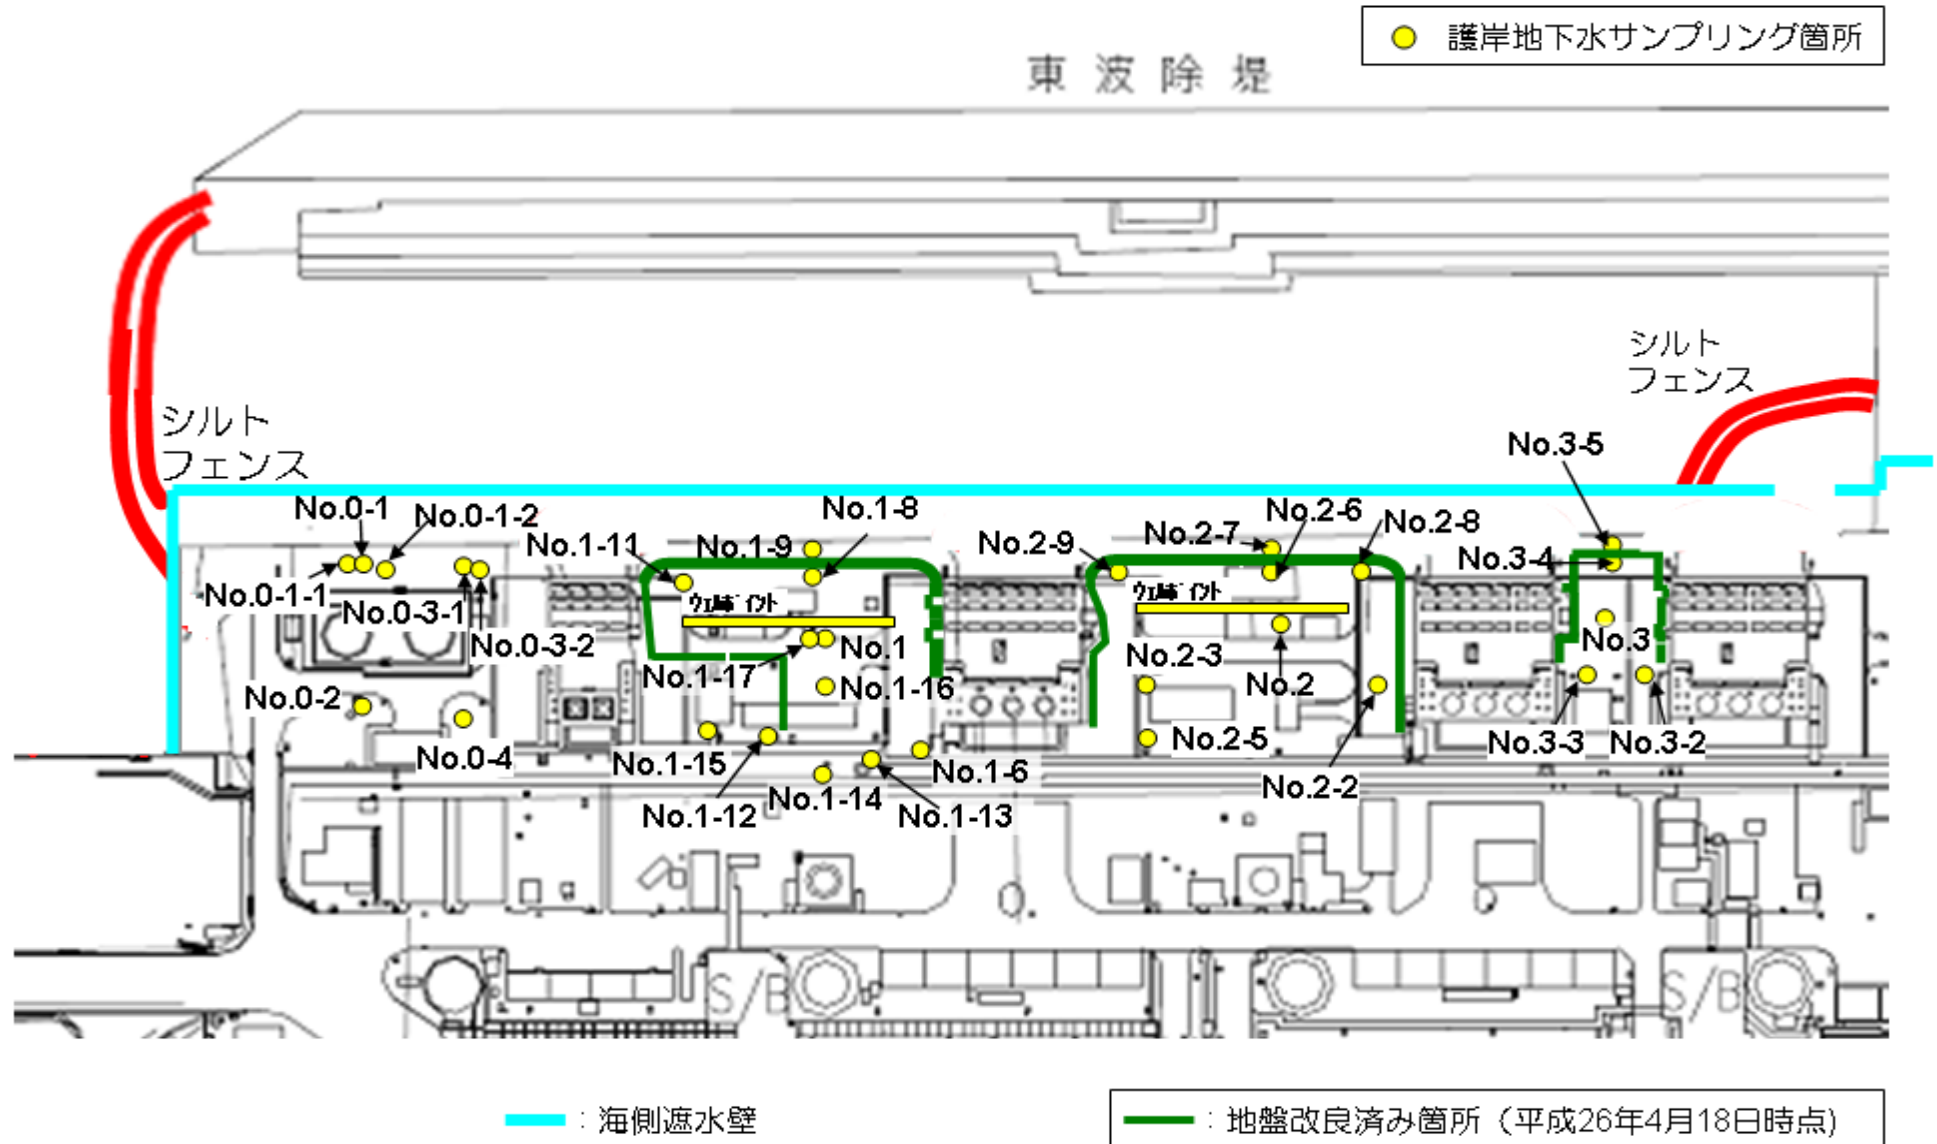

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/2)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取日							4月14日	4月14日	4月14日	4月13日	4月14日	4月14日	4月14日	4月14日	4月14日
採取時刻							10:20	10:15	10:40	6:26	9:55	9:07	9:21	9:35	9:34
塩素(単位: ppm)							—	—	—	200	—	—	—	—	—
Cs-134(約2年)							ND(0.38)	4,900	14	5.2	ND(0.47)	3.1	7.6	ND(1.2)	ND(0.45)
Cs-137(約30年)							0.46	13,000	35	15	1.2	7.5	21	ND(0.82)	ND(0.59)
その他 γ	Mn-54(約310日)						ND	130	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Co-60(約5年)						ND	450	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Sb-125(約3年)						ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	ND
全β							170	580,000	16,000	90	21	150	1,000	800,000	4,200
H-3(約12年)							160,000	12,000	12,000	190	9,300	43,000	3,600	7,500	13,000
Sr-90(約29年)							170	520,000	16,000	30	10	47	900 ^{*1}	680,000	4,000 ^{*1}

	1,2号機 ウエルポイント 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	2,3号機 ウエルポイント 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5
採取日											4月18日	4月30日		
採取時刻											11:08	12:10		
塩素(単位: ppm)											—	—		
Cs-134(約2年)											3.9	51		
Cs-137(約30年)											11	140		
その他 γ	Mn-54(約310日)										ND	ND		
	Co-60(約5年)										ND	ND		
	Sb-125(約3年)										ND	ND		
全β										2,200	4,900			
H-3(約12年)										2,500	2,600			
Sr-90(約29年)										2,000	3,600 ^{*1}			

* 太枠内が今回公表データ。他は平成26年4月14日、15日、16日、18日、19日、5月1日、5日にお知らせ済み。


* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「—」と記す。

※1 平成26年5月8日、12日の公表資料において、5月7日採取分を「分析中」としましたが、分析対象を4月30日採取分に訂正いたします。

*1 過去最高値(「福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果」およびその関連の参考資料で過去に示した値との比較)

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 (海水サンプリング箇所)

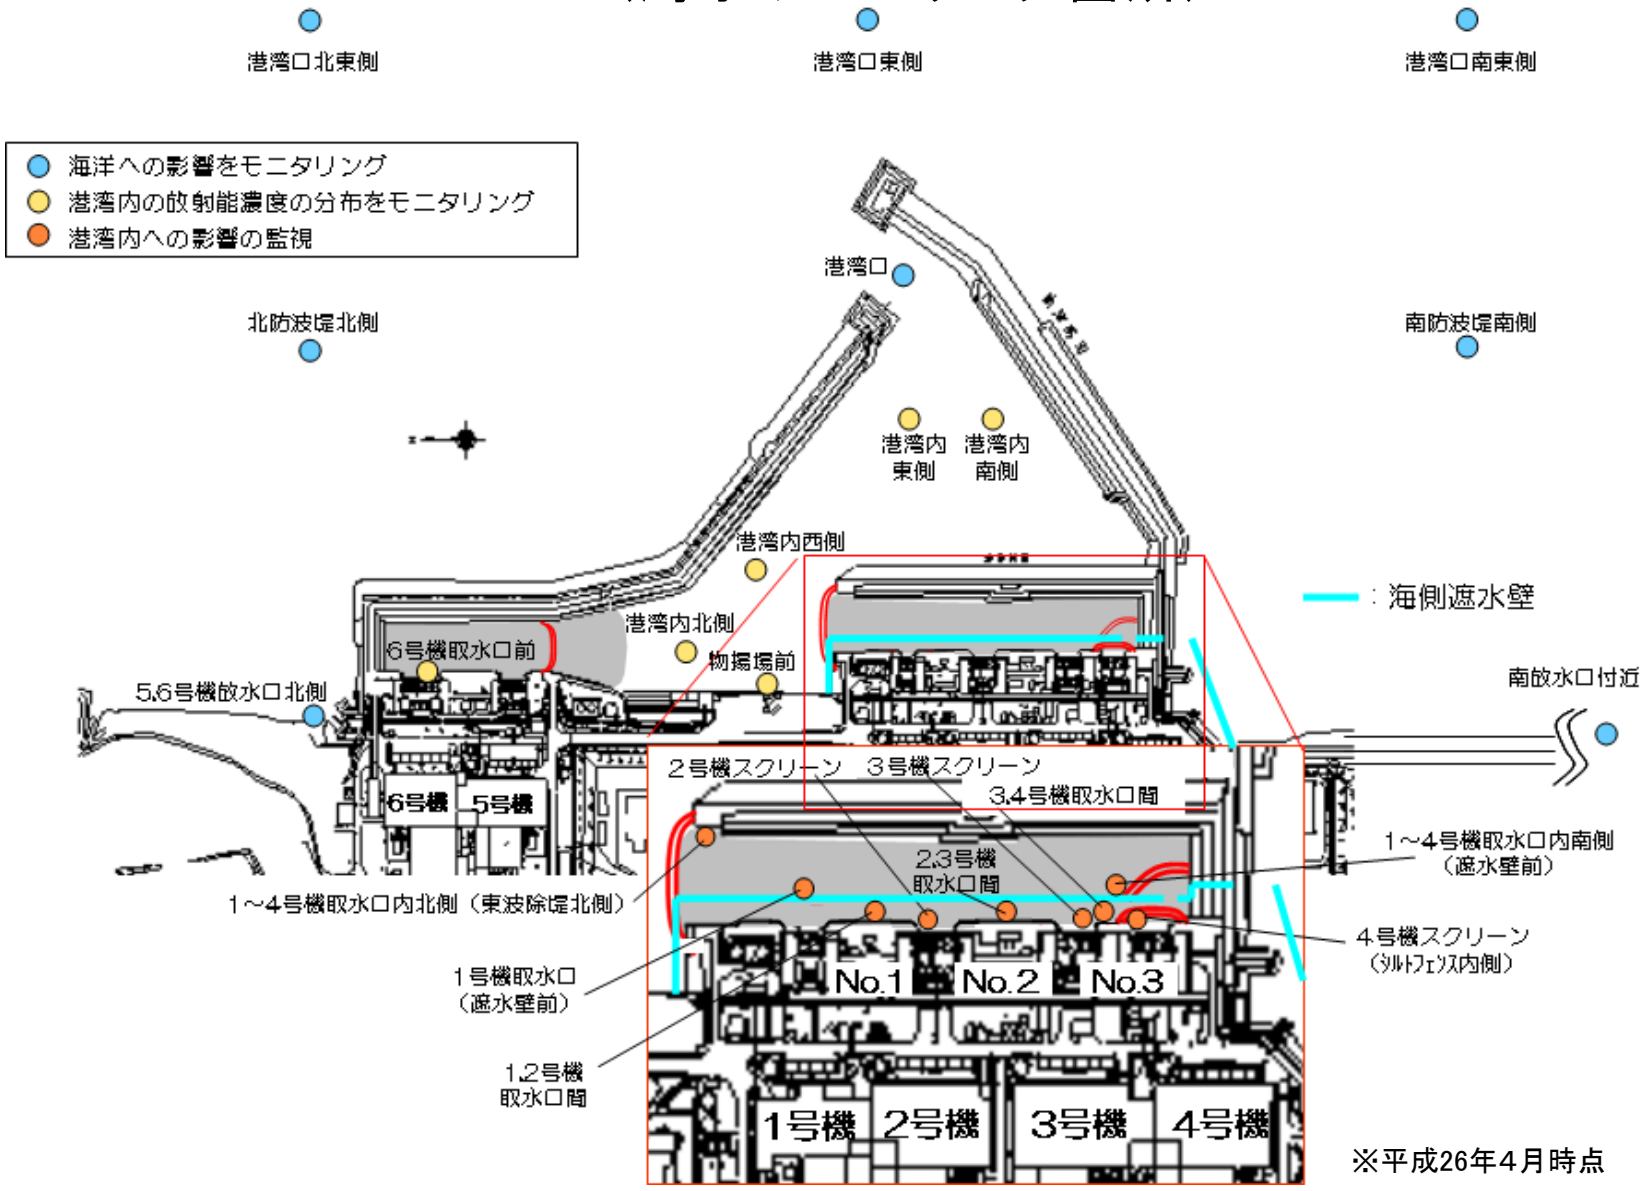

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/2)海水

単位: Bq/L

	福島第一 5,6号機 放水口北側	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東波除堤北側)	福島第一 1,2号機 取水口間 (表層)	福島第一 1,2号機 取水口間 (下層)	福島第一 2号機 スクリーン	福島第一 2,3号機 取水口間	福島第一 3号機 スクリーン	福島第一 3,4号機 取水口間	福島第一 4号機 スクリーン (シルトフェンス内側)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	炉規則 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質 ガイドライン
採取日	4月14日		4月14日	4月14日	4月17日	4月17日	4月14日	4月14日	4月14日	4月14日	4月14日			
採取時刻	6:10		6:25	6:55	6:43	6:43	6:31	6:35	6:40	6:43	6:42			
Cs-134 (約2年)	ND(0.69)		ND(2.1)	7.4	7.4	ND(1.9)	9.0	10	9.5	15	13		60	10
Cs-137 (約30年)	ND(0.54)		ND(2.5)	18	22	7.0	28	26	32	35	32		90	10
全β	14		ND(20)	120	560	40	610	490	490	450	290			
H-3 (約12年)	ND(1.6)		3.6	230	1,500	120	1,500	1,400	1,200	1,200	770		60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	0.14		1.6	71	410	21	370	400*1	330*1	370*1	230*1		30	10

単位: Bq/L

	福島第一 南放水口 付近	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 北防波堤 北側	福島第一 港湾口 北東側	福島第一 港湾口 東側	福島第一 港湾口 南東側	福島第一 南防波堤 南側	炉規則 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質 ガイドライン
採取日	4月14日	4月7日											
採取時刻	5:30	9:25											
Cs-134 (約2年)	ND(0.55)	ND(0.96)										60	10
Cs-137 (約30年)	ND(0.53)	ND(0.92)										90	10
全β	14	ND(16)											
H-3 (約12年)	ND(1.6)	ND(1.7)										60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	0.012	0.25										30	10

* 太枠内が今回公表データ。他は4月8日、15日、18日、21日にお知らせ済み。

破線枠内の5,6号機放水口および南放水口付近のSr-90は、平成26年5月20日に「海水核種分析結果」資料でお知らせしたものの再掲。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

※実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に定める告示濃度限度(別表第2第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

* 1 過去最高値(「福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果」およびその関連の参考資料で過去に示した値との比較)

<参考> 前回公表までの最高値(護岸地下水)

単位: Bq/L

	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-1 [※]	地下水観測孔 No.1-2 [※]	地下水観測孔 No.1-3 [※]	地下水観測孔 No.1-4 [※]	地下水観測孔 No.1-5 [※]	地下水観測孔 No.1-6
Cs-134(約2年)	29 <5/25>	ND	0.61 <3/2>	0.61 [10/13]	0.64 <4/6>	0.82 <1/14>	0.70 <6/29>	13 [8/29]	1.9 [7/8]	11,000 [7/9]	10 [9/2]	1.5 [7/8]	310 [8/5]	12,000 <8/12>
Cs-137(約30年)	78 <5/25>	ND	1.5 <3/2>	2.2 <1/12>	1.1 <4/6>	2.1 <1/14>	1.6 <6/29>	31 [8/29]	3.6 [7/8]	22,000 [7/9]	24 [9/2]	3.6 [7/8]	650 [8/5]	34,000 <8/12>
その他 γ	Ru-106(約370日)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	26 [5/24]	7.9 [7/8]	160 [8/15]	17 [7/22] [8/8]	3.1 [8/8]	ND	ND
	Mn-54(約310日)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0 [7/5]	62 [7/5]	ND	ND	ND	320 <2/13> <2/17>
	Co-60(約5年)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.50 [7/19]	ND	3.1 [7/8]	ND	ND	ND	830 <2/20>
	Sb-125(約3年)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.7 [7/11]	ND	250 [7/15]	1.4 [7/12] [8/26]	ND	12 [8/8]
全β	300 [8/29] <5/18>	21 [12/7]	24 <6/22>	87 [10/13]	ND	67 ^{*1} [12/11]	44 <6/22>	1,900 [5/24]	4,400 [7/8]	9,300,000 [7/8]	160,000 [8/12] [8/15]	380 [8/19]	56,000 [8/5]	1,400,000 <8/12>
H-3(約12年)	45,000 [8/29]	18,000 [12/7]	74,000 [12/15] <1/19>	6,800 <2/16>	ND	76,000 <2/6>	56,000 <2/23>	500,000 [5/24] [6/7]	630,000 [7/8]	430,000 [9/16]	290,000 [7/12]	98,000 [7/11]	72,000 [8/15]	110,000 ^{*2} <2/6>
Sr-90(約29年)	140 [8/8]	7.9 [12/7]	2.6 [11/10]	0.73 [9/2]	1.5 [11/20]	2.3 [12/6]	ND(0.83) [10/27]	1,300 [8/22]	2,300 [6/28]	5,000,000 [7/5]	130,000 [8/8]	200 [7/8]	5,100 [8/22]	590,000 <2/13>

単位: Bq/L

	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9	地下水観測孔 No.1-10	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-13	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-15	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17	1・2号機間 ウエルポイント 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-1 [※]	地下水観測孔 No.2-2
Cs-134(約2年)	47 [11/25]	170 [9/3]	-	1.1 <1/13>	74 [10/21]	37,000 <2/13>	88 ^{*2} <2/27>	ND	30 <7/28>	1.4 <7/7>	110 [9/23]	0.88 <2/26>	0.66 [9/1]	15 <2/12>
Cs-137(約30年)	110 [11/25]	380 [9/3]	-	3.4 <4/28>	170 [10/21]	93,000 <2/13>	230 ^{*2} <2/27>	0.88 <7/10>	86 <7/28>	2.8 <4/28>	250 [9/23]	2.5 <2/26>	1.1 [8/29] [9/1]	38 <2/12>
その他 γ	Ru-106(約370日)	ND	ND	-	ND	5.4 [10/28]	ND	ND	9.2 [10/28]	5.5 <4/21> <5/1>	25 [9/2]	ND	ND	ND
	Mn-54(約310日)	12 <2/3>	ND	-	ND	ND	ND	1.8 <8/18>	ND	11 <8/25>	ND	8.5 <4/28>	ND	ND
	Co-60(約5年)	1.3 <2/3>	ND	-	ND	0.51 [10/24]	ND	0.44 <5/29>	ND	0.9 [11/7]	0.61 [11/25]	0.61 <6/9>	ND	ND
	Sb-125(約3年)	ND	ND	-	ND	61 [10/21]	ND	ND	ND	24 <6/16>	2.1 [11/25]	ND	ND	ND
全β	59,000 <2/3>	2,100 ^{*2} [11/17]	78 ^{*2} <1/27>	2,300 [12/26]	1,100 <5/5>	260,000 <2/12> <2/13>	22,000 <8/14>	110 <7/10>	3,100,000 <1/20> <1/30> <2/3>	580,000 <8/28>	1,900,000 [9/23]	1,700 [7/8]	380 [7/29]	600 <4/16>
H-3(約12年)	33,000 <6/2>	860 ^{*2} [11/14]	270,000 ^{*2} <1/27>	85,000 [9/13]	440,000 [10/31]	88,000 <2/12>	23,000 <2/13>	74,000 <7/10>	43,000 [9/26]	32,000 <1/20>	460,000 [8/19]	1,000 <2/23>	440 [8/26]	660 <1/8>
Sr-90(約29年)	35,000 <2/17>	300 [10/3]	-	22 <1/9>	290 [10/21]	160,000 <2/12>	770 <3/10>	分析中	2,700,000 <2/13>	620 <3/10>	-	54 [5/31]	5.9 [7/25]	320 [12/25]

単位: Bq/L

	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	地下水観測孔 No.2-9	2・3号機間 ウエルポイント 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-1 [※]	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5
Cs-134(約2年)	2.2 <2/26>	41 <5/7>	17 <3/11>	3.5 <2/23>	1.3 <7/20>	ND	2.0 <4/23>	3.5 [7/25]	1.2 [7/25] [8/8]	23 <8/27>	180 <7/2>	5.1 <7/23>	100 <7/30>
Cs-137(約30年)	5.5 <2/26>	110 <5/7>	50 <3/11>	9.0 <2/23>	3.4 <7/20>	0.58 ^{*2} <2/11>	4.7 <4/23>	5.9 [8/8]	2.6 [8/1]	63 <8/6>	500 <7/2>	16 <8/27>	310 <7/30>
その他 γ	Ru-106(約370日)	ND	ND	ND	ND	ND	6.5 ^{*2} <2/11>	ND	ND	ND	ND	ND	-
	Mn-54(約310日)	0.29 [12/6]	0.95 <6/4>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.54 [10/30]	-
	Co-60(約5年)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
	Sb-125(約3年)	ND	74 <5/7>	ND	ND	ND	ND	ND	1.6 <1/1>	ND	ND	ND	ND
全β	1,500 [12/6] <1/8>	150,000 <2/12>	3,200 [12/5]	1,300 <6/20>	5,800 <7/23>	1,700 <2/7>	240,000 [12/12]	1,400 [7/11]	180 [8/1]	3,100 <8/20> <8/28>	8,900 <7/2>	46 <8/13>	510 <7/16>
H-3(約12年)	1,700 [12/6]	7,900 <4/9>	1,900 <8/10>	1,100 <1/19>	1,700 <4/6> <8/6> <8/13>	13,000 ^{*2} <2/7> <2/11>	8,800 <8/13>	3,200 [H24. 12/12]	460 [8/1]	3,700 <7/9>	8,000 <5/7>	170 [9/18]	170 <1/8>
Sr-90(約29年)	1,200 [12/6]	分析中	分析中	ND(1.4) [11/21]	3,900 <3/30>	1,200 ^{*2} <2/11>	-	8.3 [H24. 12/12]	4.4 [7/23]	分析中	-	ND	-

●ストロンチウム90については、過去に採取した試料の一部に分析中のものがあるため、公表済みの数値のうち、最高の値を記載。

*1 汲み上げ水の分析結果。

*2 濁度高のため参考値(ろ過処理後に測定を実施。)

* NDは検出限界値未満を表す。

* カッコ内は、各値の採取日を示す。[]は平成25年、< >は平成26年。

※地盤改良に伴う薬液注入の影響によって、現在試料採取を行えない観測孔。

<参考> 前回公表※までの最高値(海水)

単位: Bq/L

	福島第一 5.6号機放水口北側	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東波除堤北側)	福島第一 1号機取水口 (遮水壁前)	福島第一 1,2号機取水口間 (表層)	福島第一 1,2号機取水口間 (下層)	福島第一 2号機取水口 (遮水壁前)	福島第一 2,3号機取水口間	福島第一 3,4号機取水口間	福島第一 4号機スクリーン (シルトフェンス内側)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)
Cs-134 (約2年)	2 [6/21]	3 [12/2]	5 [8/5]	32 [10/11]	12 <6/23>	87 [10/10]	93 [10/10]	8 <6/23>	52 [12/21]	37 <5/12>	62 [9/16]	15 <4/14> <5/19>
Cs-137 (約30年)	5 <3/17>	6 [12/2]	9 [8/5]	73 [10/11]	33 <5/12>	200 [10/10]	200 [10/10]	27 <6/23>	110 0/11][12/2	98 <5/12>	140 [9/16]	45 <5/19>
全β	17 <1/6>	46 [8/19]	40 [7/3]	320 [8/12]	140 <5/5> <7/14> <8/18> <9/1>	1,900 <5/20>	1,500 <6/10>	160 <8/18>	1,000 <6/2>	660 <6/9>	610 <6/23>	380 <3/10>
H-3 (約12年)	9 <5/12>	24 [8/19]	340 [6/26]	600 [8/18]	460 <8/18>	4,200 <5/27>	3,900 <6/10>	350 <8/18>	2,600 <6/2>	2,500 <6/23>	2,200 <7/21>	810 <8/4>
Sr-90 (約29年)	5 [6/26]	—	7 [6/26]	220 [8/19]	—	480 [8/22]	290 [10/20]	—	340 [10/14]	190 [9/23]	140 [6/21]	—

単位: Bq/L

	福島第一 南放水口付近	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内東側	福島第一 港湾内西側	福島第一 港湾内北側	福島第一 港湾内南側	福島第一 北防波堤北側	福島第一 港湾口北東側	福島第一 港湾口東側	福島第一 港湾口南東側	福島第一 南防波堤南側
Cs-134 (約2年)	1.8 <6/9>	3.3 [12/24]	3.3 [10/17]	4.4 [12/24]	5.0 [12/2]	3.5 [10/17]	ND	ND	ND	ND	ND
Cs-137 (約30年)	4.9 <6/9>	7.3 [10/11]	9.0 [10/17]	10 [12/24]	8.4 [12/2]	7.8 [10/17]	ND	ND	1.6 [10/18]	ND	ND
全β	16 <6/9> <8/4>	69 [8/19]	74 [8/19]	60 [7/4]	69 [8/19]	79 [8/19]	ND	ND	ND	ND	ND
H-3 (約12年)	5.6 <5/19>	68 [8/19]	67 [8/19]	59 [8/19]	52 [8/19]	60 [8/19]	4.7 [8/14]	1.7 <4/23>	6.4 [10/8]	1.8 <5/29>	2.8 <4/23>
Sr-90 (約29年)	0.29 [6/26]	49 [8/19]	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※「福島第一港湾内、放水口、護岸の詳細分析結果」およびその関連の参考資料で示した値の中で、最も高い値を記す。
 「福島第一 1~4号機取水口内北側」は、平成25年1月14日以降の採取分。それ以外は、平成25年6月14日以降の採取分。
 ●ストロンチウム90については、過去に採取した試料の一部に分析中のものがあるため、公表済みの数値のうち、最高の値を記載。

* NDは検出限界値未満を表す。
 * カッコ内は、各値の採取日を示す。[]は平成25年、< >は平成26年。
 * 測定対象外の項目は「—」と記す。

【参考】基準値

単位: Bq/L 単位: Bq/L

	Cs-134	Cs-137	H-3	Sr-90	Sr-90
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 に定める告示濃度限度 (別表第2 第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度)	60	90	60,000	30	30
WHO飲料水水質ガイドライン	10	10	10,000	10	10
