


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

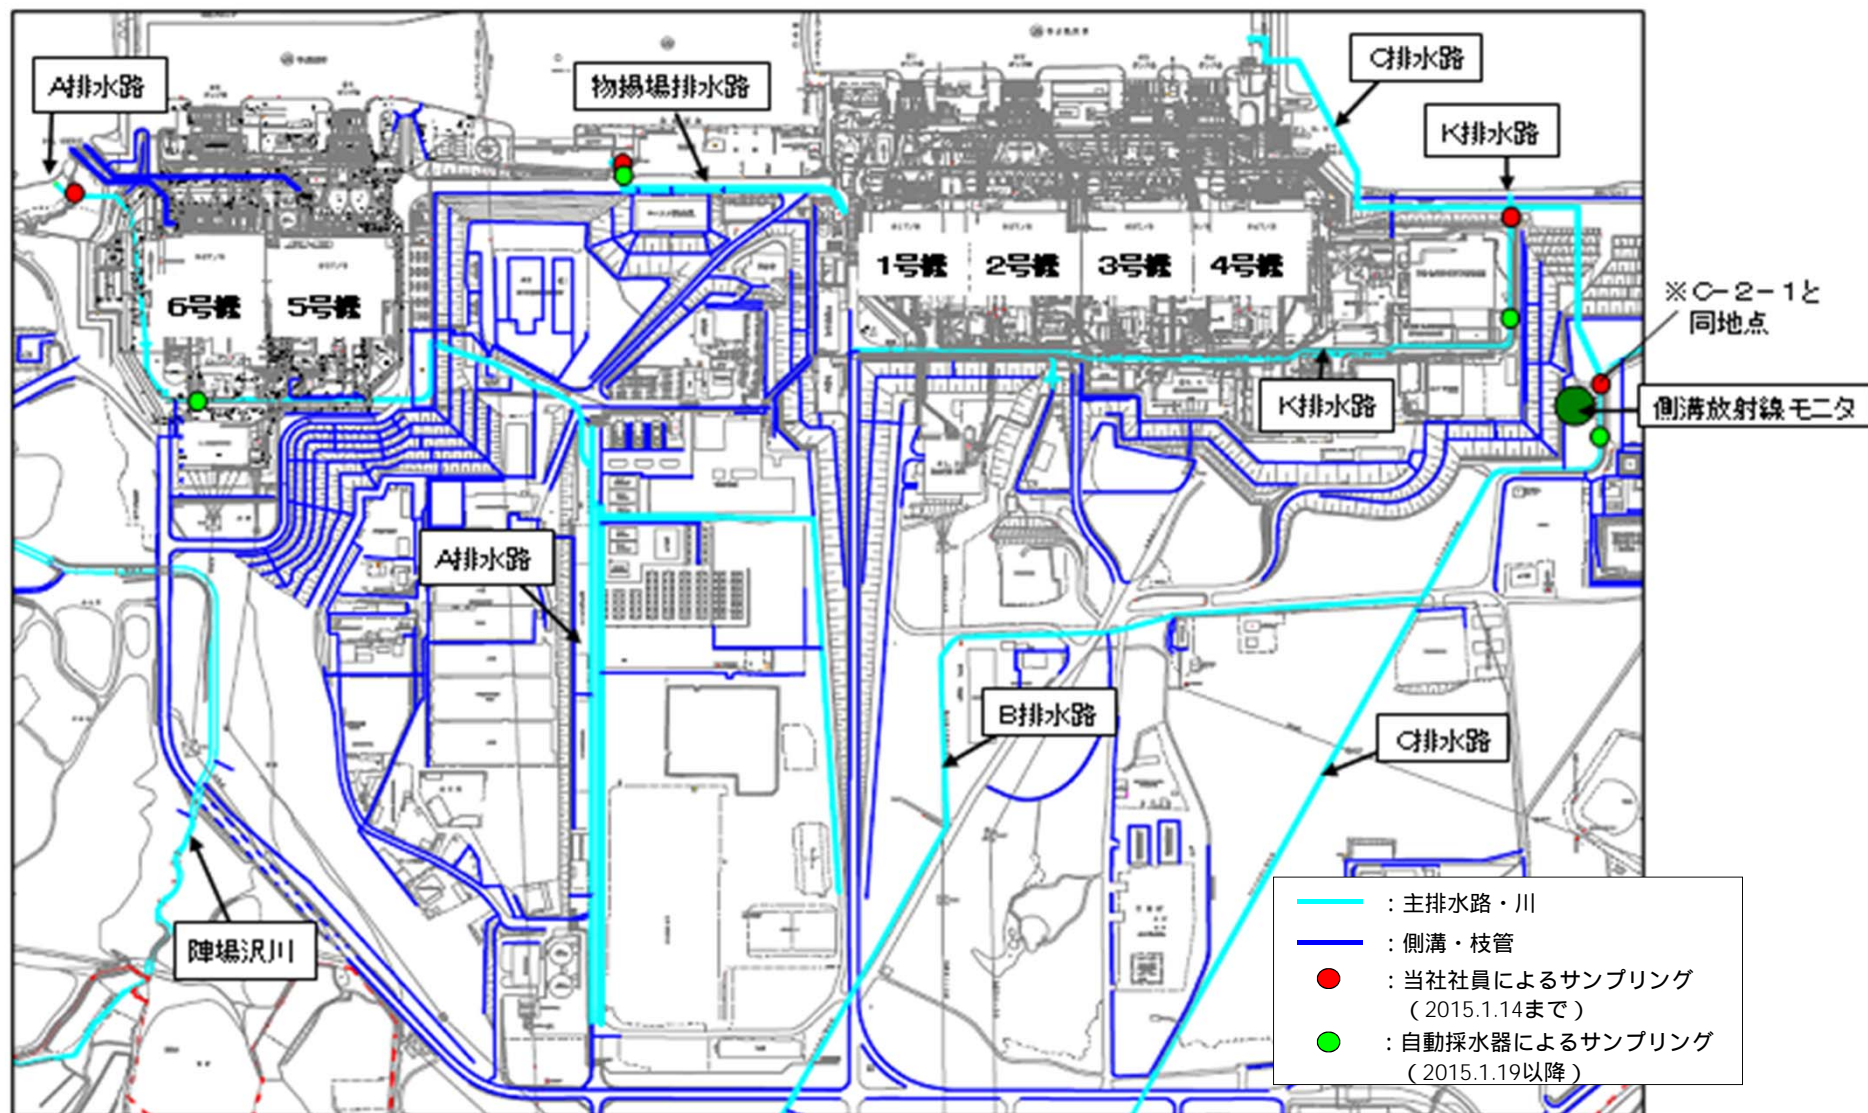

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口							物揚場排水口						
	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日
採取時刻	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Cs-134(約2年)	0.87	1.1	ND(0.7)	ND(0.7)	ND(0.7)	2.4	1.2	ND(0.8)	0.94	ND(0.8)	0.98	0.99	0.74	ND(0.7)
Cs-137(約30年)	6.0	6.9	2.2	2.2	1.9	11	5.8	6.1	4.9	4.8	5.7	4.3	4.5	4.5
全	15	20	4.3	5.2	ND(4.5)	18	8.4	6.1	7.3	9.7	8.2	5.4	8.0	7.8
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	9.7	-	-	-	-	-	-	12

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日
採取時刻	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.012	0.014	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.029	0.020	0.027	0.023	0.031	0.030	0.024
Cs-134(約2年)	3.2	2.1	1.9	1.9	1.7	1.7	2.1	ND(0.6)	ND(0.6)	ND(0.7)	ND(0.6)	ND(0.7)	ND(0.7)	ND(0.6)
Cs-137(約30年)	11	10	11	9.3	8.1	9.3	10	ND(0.7)	ND(0.7)	ND(0.9)	ND(0.9)	ND(1.0)	ND(0.9)	ND(0.7)
全	19	16	18	17	14	16	18	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(4.5)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	ND(8.6)

* 太枠内が今回公表データ。他は11月4日のお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 試料採取は自動採水器により実施。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口							物揚場排水口						
	10月29日	10月30日	10月31日	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	10月29日	10月30日	10月31日	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日
採取時刻	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	22.5	0	0	0	0	0	0	22.5	0	0
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	1.3	1.1	ND(0.6)	ND(0.6)	1.2	ND(0.7)	1.1	0.81	0.91	1.2	0.84	3.2	1.0	ND(0.6)
Cs-137(約30年)	8.5	5.7	2.5	1.9	5.6	3.9	5.2	5.2	4.4	5.0	4.5	16	4.2	4.6
全	17	8.9	7.3	ND(3.9)	12	11	15	7.8	5.0	8.2	7.4	29	8.0	5.6
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	ND(8.6)	-	-	-	-	-	-	13

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	10月29日	10月30日	10月31日	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	10月29日	10月30日	10月31日	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日
採取時刻	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	22.5	0	0	0	0	0	0	22.5	0	0
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	1.9	1.8	2.1	2.6	27	8.7	4.2	ND(0.6)	ND(0.6)	ND(0.6)	ND(0.6)	ND(0.7)	ND(0.6)	ND(0.8)
Cs-137(約30年)	9.4	11	12	11	120	44	18	ND(0.7)	ND(0.7)	ND(0.9)	ND(0.8)	1.2	ND(0.7)	ND(0.9)
全	18	15	24	17	200	53	24	ND(4.1)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(4.1)	13	ND(4.6)	ND(4.6)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	440	-	-	-	-	-	-	ND(8.6)

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 試料採取は自動採水器により実施。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。
