


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

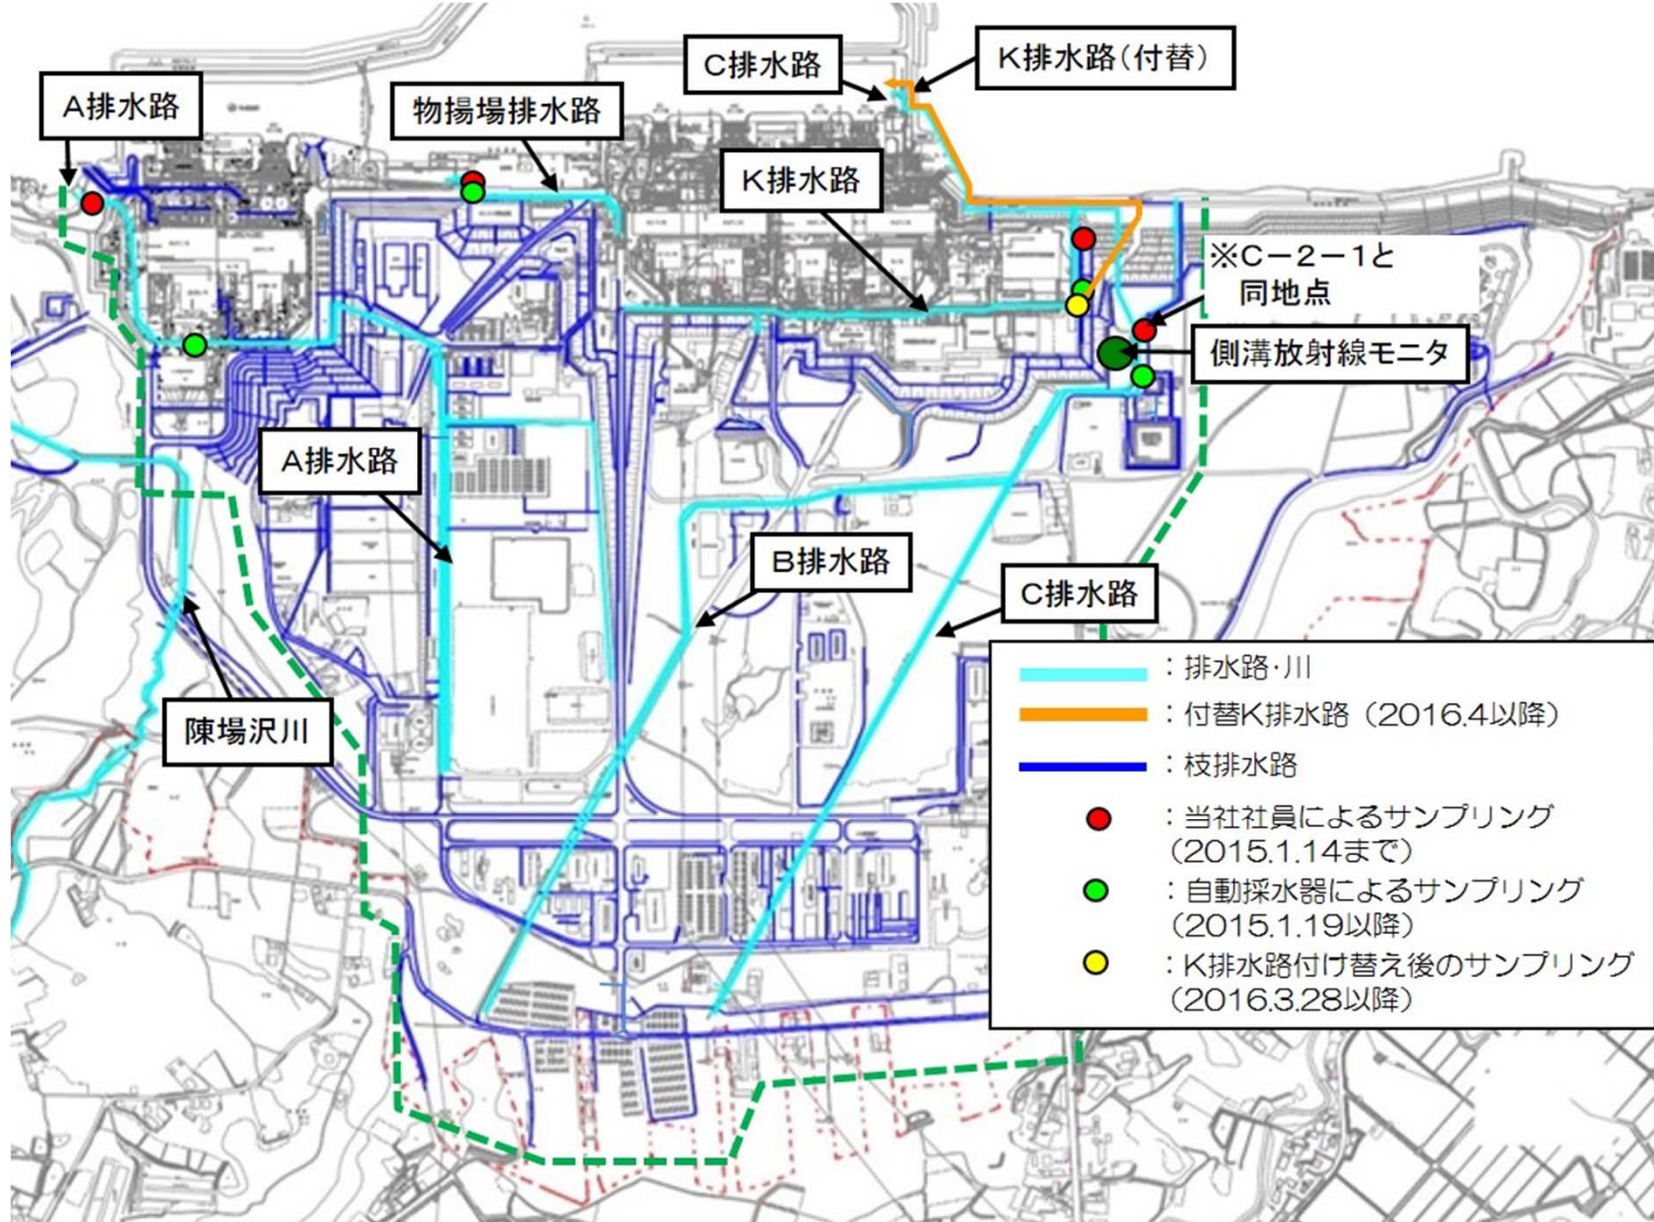

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口					物揚場排水口				
	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	※1	7:00	7:00	7:00	7:00	※1
降雨量(mm/日)	5.5	37	7	1.5	54	5.5	37	7	1.5	54
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	1.2	0.89	0.85	ND(0.6)	※1	ND(1.2)	1.6	0.98	ND(0.7)	※1
Cs-137(約30年)	11	8.7	6.8	5.7	※1	3.7	11	4.8	5.9	※1
全β	17	13	13	9.5	※1	5.1	20	8.8	10	※1
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口					C排水路 35m盤				
	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	※1	7:00	9:41	7:48	8:10	※1
降雨量(mm/日)	5.5	37	7	1.5	54	5.5	37	7	1.5	54
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	10	51 [※]	12	12	※1	ND(0.8)	ND(0.6)	ND(0.9)	ND(0.8)	※1
Cs-137(約30年)	55	300 [※]	73	78	※1	ND(0.8)	3.1	0.90	0.87	※1
全β	82	420 [※]	120	110	※1	ND(3.5)	17	11	8.8	※1
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 太枠内が今回公表データ。他は8月30日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

※ 降雨による表層土の流入のため上昇したものと考えられる。

※1 悪天候のため、回収できず。9月1日公表予定。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

<前回公表までの最高値>

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全β	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。
