

< 実施内容 >

G1エリアのタンクリプレースに伴い、4月17日より既存埋設タンクの残水を移送する。


< 実施方法 >

- ・ 移送ラインは、2系統でG1タンク 3m³鋼製仮設プール G3(北)-H2タンク。
- ・ 耐圧ホースを使用し、空気圧での抜き取りにて移送を実施。
- ・ 水漏れ等のトラブルに迅速に対応できるように、移送時は監視員を配備。
- ・ 空気圧での抜き取りは、7月下旬頃まで実施予定。その後、タンク底部に残る残水については、別工事にて水中ポンプ等を使用して移送予定。

< G1エリアタンク >

- ・ G1タンク100基中71基に残水あり(約6,200m³)
- ・ タンク内残水：RO処理水(全 : 298Bq/cc サンプルング日：2017年3月7日)

【移送概略図】

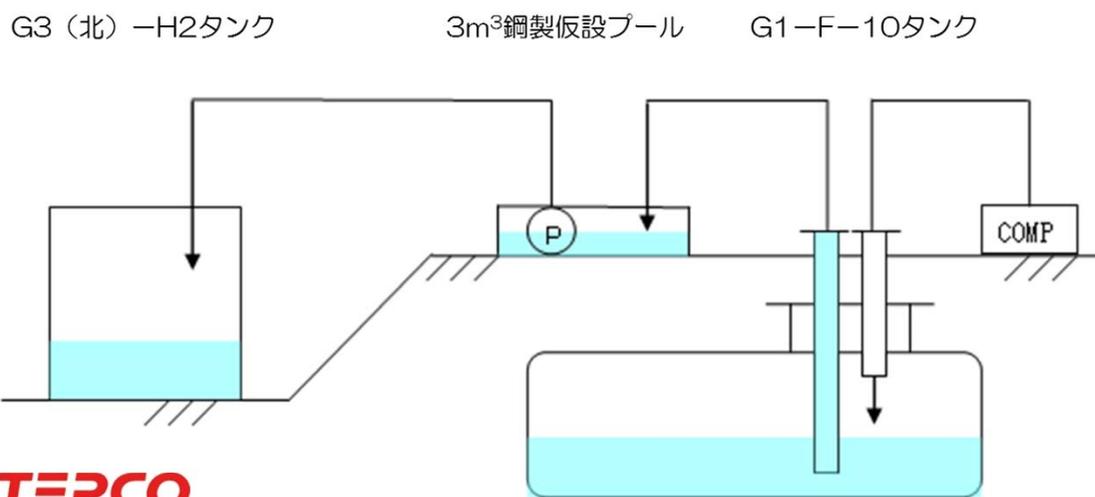

【タンク位置図】

