
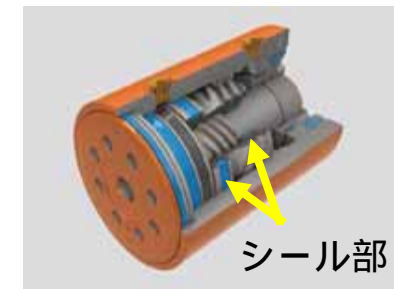


福島第一原子力発電所 3号機 燃料取出再開に向けた対応状況について

< 参 考 資 料 >
2019年10月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

- 3号機の燃料取扱設備（FHM）については、燃料取り出し再開に向けた事前準備を実施しているところであり、現在の状況についてお知らせいたします。
- 3号機FHMのマストについては、水圧モータのシール部から駆動用流体（水グリコール）のリークを確認していたことから交換を実施しております。併せて、マスト周りにある水圧ホース及び電気ケーブルについて、マスト旋回の支障にならないように位置を整える作業も実施しており、マストがスムーズに旋回する状態であることを確認しています。
- 現在、5回目の燃料取り出しに向けた準備作業を実施しているところであり、明日（10月16日）より燃料取り出し作業を開始する予定です。

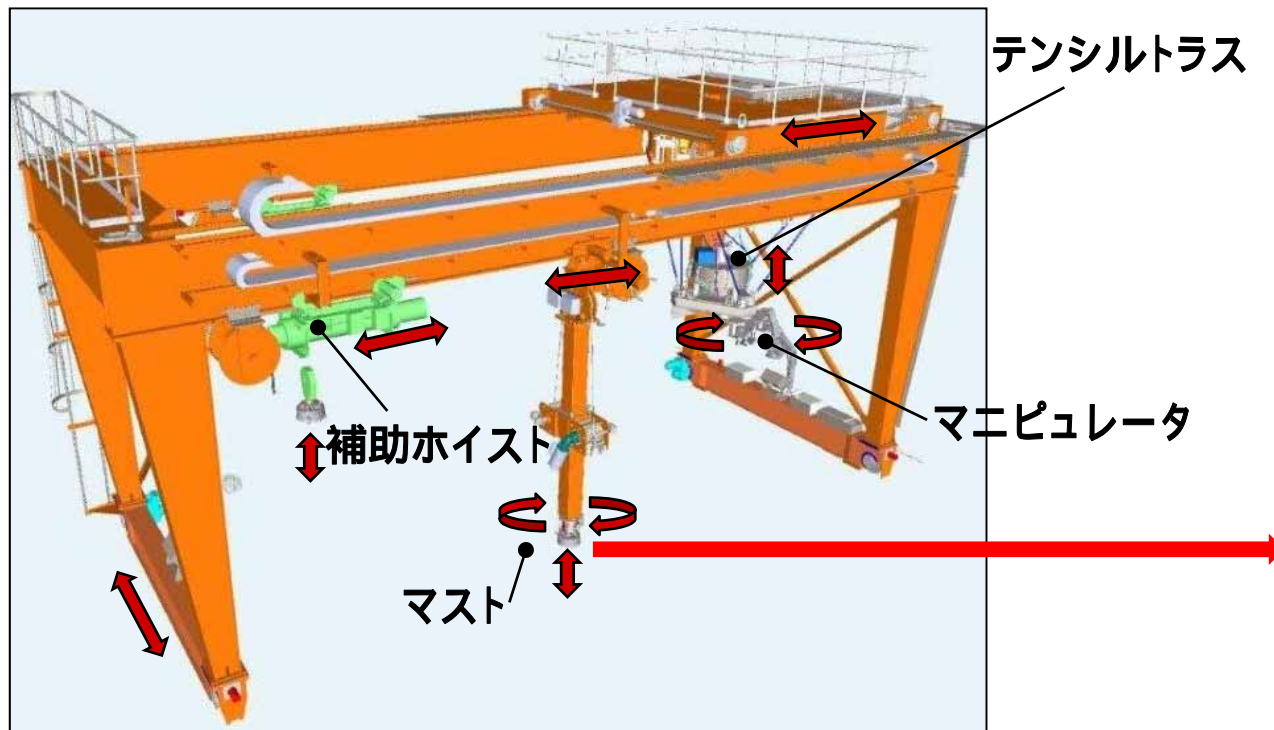

出典元: HELAC CORPORATION
Helical Hydraulic Rotary Actuators
L10 Series Service & Repair Manual
<https://www.helac.com/>

水圧モータ立体断面図



マスト周りの
ホース・ケーブル類
