循環注水冷却スケジュール（1/1）
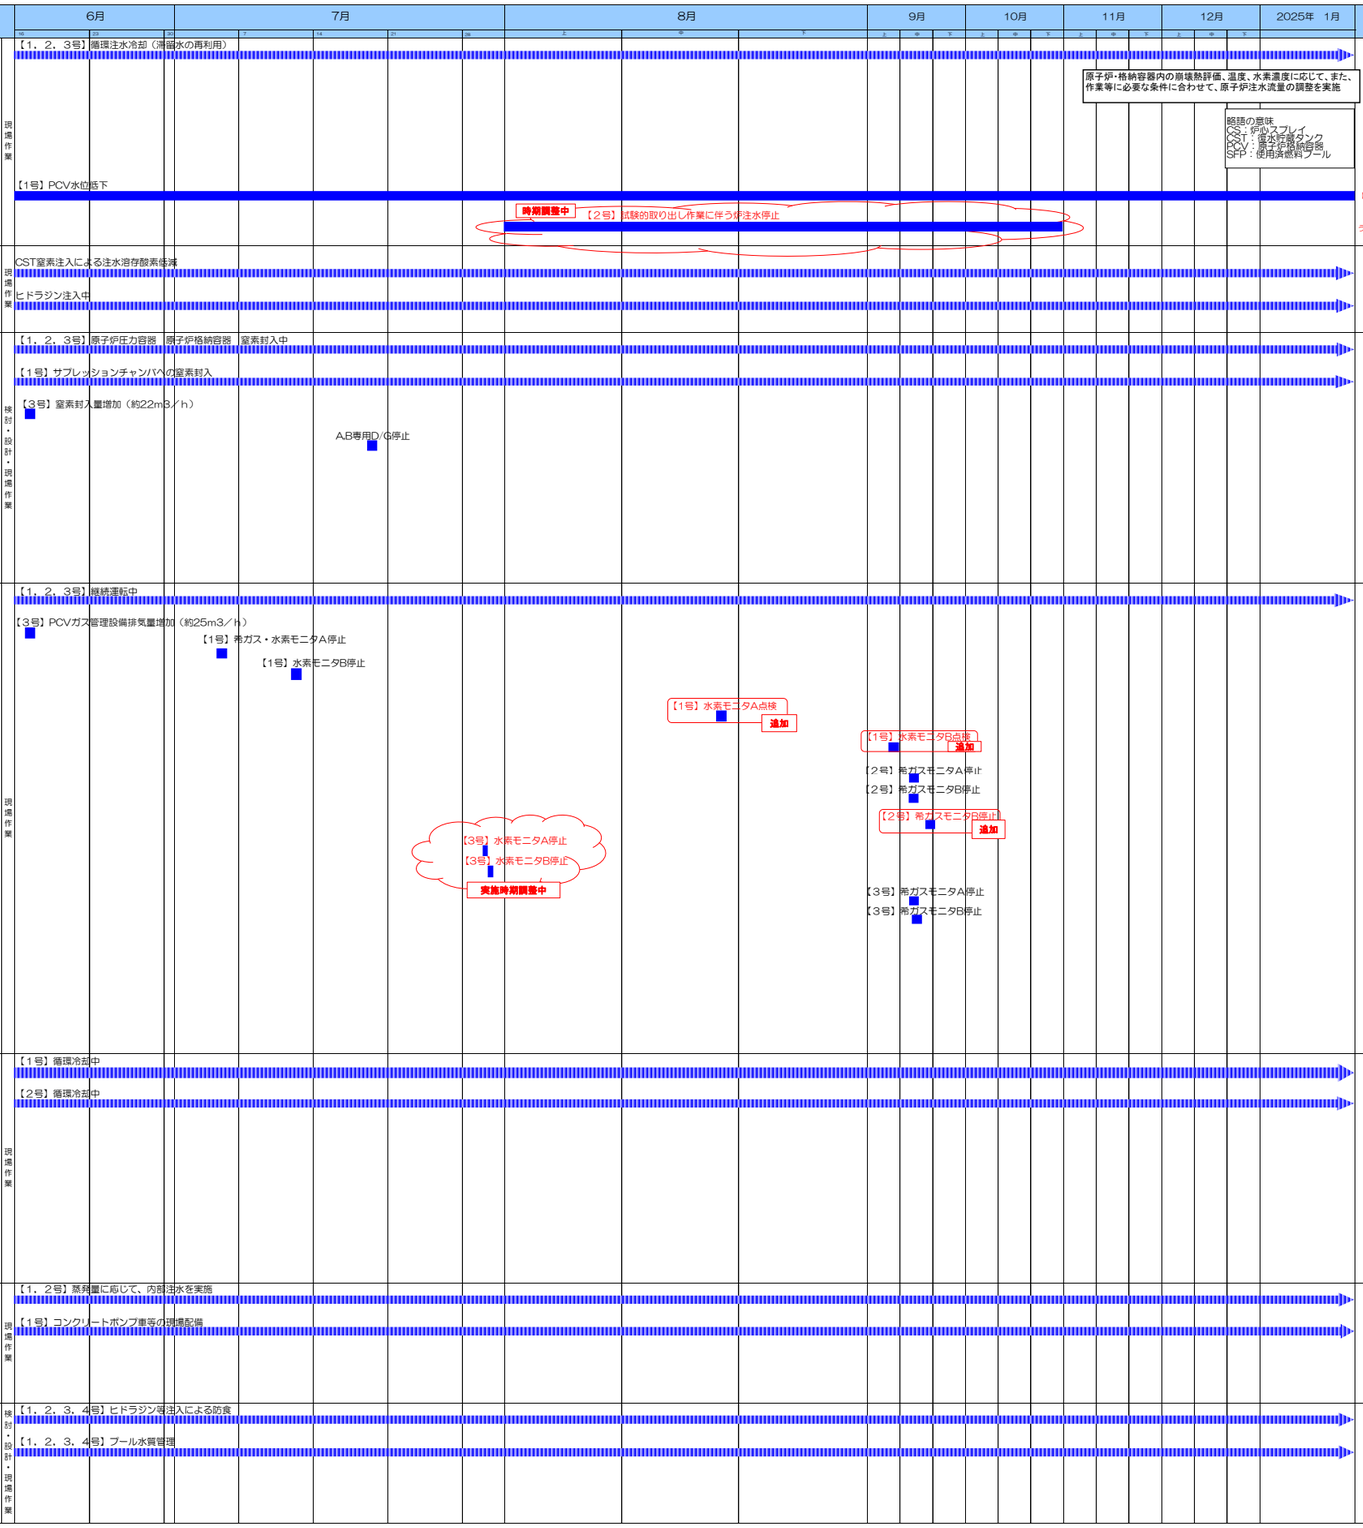
分野名	区切り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		備　考
循環注水冷却	原子炉関連	循環注水冷却	（実　績） ・【共通】循環注水冷却中（継続） （予　定） ・【1号】格納容器水位低下 原子炉注水量の減少による水位低下（3/26～） 完了時期は水位低下の進捗に応じて適宜見直し ・【2号】試験的取り出し作業に伴う炉注水停止（8月～10月）	現場作業	【実績】6/13~6/29ホールドポイント3に向けた水位低下操作を実施 6/29~約1カ月　水位維持期間（ホールドポイント3） うち2日程度（日々変位）停止予定時間　5：00～14：00
		海水腐食及び塩分除去対策	（実　績） ・CST窒素注入による注水溶存酸素低減（継続） ・ヒドラジン注入中（2013/8/29~）	現場作業	
原子炉格納容器関連		窒素充填	（実　績） ・【1号】サプレッションチャンバへの窒素封入 －連続窒素封入へ移行（2013/9/9～）（継続） ・【3号】窒素封入量増加（約19⇒約22m3／h）2024/6/17 ・窒素ガス分離装置A,B専用ディーゼル発電機点検 ・A,B専用ディーゼル発電機停止　2024/7/19	検討・設計・現場作業	
		PCVガス管理	（実　績） ・【3号】PCVガス管理設備排気量増加（約22⇒約25m3／h）2024/6/17 ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止　A系：2024/7/5 ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止　　B系：2024/7/12 （予　定） ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止　　A系：2024/8/19 ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止　　B系：2024/9/10 ・【2号】PCVガス管理システム 伝送回路修理 ・希ガスモニタ停止　A系：2024/9/中旬 ・希ガスモニタ停止　B系：2024/9/中旬 ・【2号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・希ガスモニタB系点検（9／中旬） ・【3号】PCVガス管理システム 水素モニタ警報設定値変更 ・水素モニタ停止　A系：2024/7/下旬以降 ・水素モニタ停止　B系：2024/7/下旬以降 ・【3号】PCVガス管理システム 伝送回路修理 ・希ガスモニタ停止　A系：2024/9/中旬 ・希ガスモニタ停止　B系：2024/9/中旬	現場作業	
使用済燃料プール関連		使用済燃料プール循環冷却	（実　績） ・【共通】循環冷却中（継続） （予　定）	現場作業	
		使用済燃料プールへの注水冷却	（実　績） ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段として コンクリートポンプ車等の現場配備（継続）	現場作業	
		海水腐食及び塩分除去対策（使用済燃料プール薬注＆塩分除去）	（実　績） ・【共通】プール水質管理中（継続）	検討・設計・現場作業
