

工程見える化システム 操作ガイド



1章

概要

1-1. 工程見える化システムとは

1. システム導入の目的、システム概要	5
2. 利用環境	6
3. システム機能	7
4. 公開対象範囲	9
5. 画面遷移イメージ	10

2章

操作手順

2-1. システムへのログイン	11
2-2. 留意事項確認	13
2-3. 総合メニュー	15
2-4. 工程進捗状況の確認	
1. 工程進捗一覧画面	17
2. 工程進捗詳細画面	21
3. スマートフォン画面	23
2-5. 工期シミュレーション	
1. シミュレーション条件入力画面	27
2. 番札の確認方法	31
3. 電柱標識の入力方法	32
4. 柱番号の入力方法（上3桁）	33
5. 柱番号の入力方法（下1桁）	33
6. 契約容量の(kVA)の入力方法	35
7. 確認方法、入力方法 まとめ	36
8. 結果画面	37
9. スマートフォン画面	41

3章

補助説明

3-1. よくある質問	47
-------------------	--------------------

改訂履歴	52
------------	--------------------

キャラクター紹介



名前:フクリー(Fukuri)

- ◆ 工程見える化システムのオリジナルキャラクター
- ◆ みなさまによりわかりやすくシステムの案内ができるよう、操作ガイドに登場します



～名前の由来～

「フクロウ(Fukurou)」と親しみやすさを表す「リー」を組み合わせた名前



～フクリーの特徴～


- 【知恵】 フクロウの知恵を持ち、作業工程を洞察する能力を持っています
- 【可視化】 情報をシンプルかつわかりやすく見せる魔法を使います
- 【守護者】 電力会社を象徴し、電力の安定と情報公開の効率性を守ります
- 【性格】 温かさと包容力を持ち、ユーザーと円滑なコミュニケーションを築きます

1-1. 工程見える化システムとは

1 システム導入の目的、システム概要



- 東京電力パワーグリッドでは、電気工事店のみなさまの利便性向上のため、「工程見える化システム」を導入します。
- このシステムでは、Web申込システムへ申込後の「工程進捗状況確認」や、申込前に「工期のシミュレーション」を可能にし、弊社へ電話でお問い合わせをいただく手間を低減することを目的にしています。

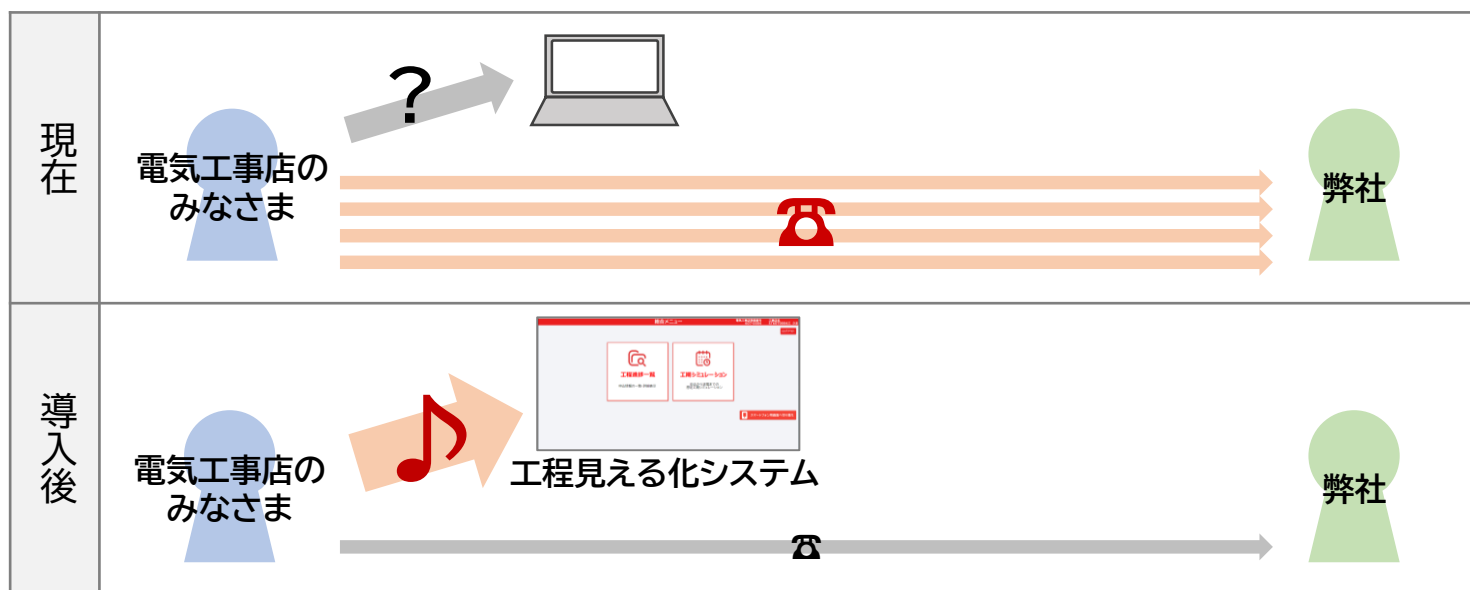

システム機能（工程進捗公開）

申込後の工程状況や各種予定日などを確認いただけます。
公開対象範囲は、低圧需要側のみです。（高圧、発電側は対象外です）



システム機能（工期シミュレーション）

対象設備（引込柱）や負荷容量を指定し、送電完了までの想定期間を試算いただけます。
対象範囲は、低圧の架空需要側のみです。（発電側や地中は対象外です）



利用可能ユーザー

「Web申込システム」のご利用登録がお済みの電気工事店さまがご利用になれます。
※ID・パスワードは、Web申込システムと同様です。

2 利用環境

工程見える化システムは、以下の時間および環境でご利用いただけます。

利用可能時間

- 工程進捗公開機能 : 毎日6時から24時まで
- 工期シミュレーション機能 : 毎日8時から22時まで

システム推奨環境

● パソコン

OS	ブラウザ
Windows10/11	Edge、Chrome、Firefox
macOS13	Safari

● スマートフォン

OS	ブラウザ
Android	Chrome
iOS	Safari

OS、ブラウザともに最新バージョンでのご利用を推奨します。



注意事項

- 前画面に戻る場合は、システムの「〇〇に戻る」ボタンを使用ください
- ブラウザの戻るボタンを使用すると、正しく画面遷移できない場合があります

3 システム機能



- 工程見える化システムでは、「工程進捗公開」と「工期シミュレーション」の機能を提供します。

工程進捗公開機能

- 一覧画面と詳細画面の2階層構成で、一覧で選択した申込を詳細画面で表示します。
- 情報を更新した箇所には、「New」マークを表示します。
- 公開対象範囲は、「1-1-4. 公開対象範囲」(9ページ)を参照ください。

工程進捗一覧画面

申込の切り替え箇所

「New」マーク

< 総合メニューへ戻る

工程進捗一覧

電機工事設計管理
R07-0004

工区番号
(00000004) 工区名

マーク

住所建物名申込番号設計番号進捗状況担当者

例)東京、豊田県アパート・マンション名、その他12345678901231AA1234

代表申込のみすべての申込

検索

検索項目を非表示

検索結果 60 件

詳細に表示簡略に表示更新あり(New)

申込受付完了	新設	設計番号:3BA1124	申込番号:1212400004257	受付	設計	用地	工事	消込
東京都東久留米市田無町1丁目 1-1	既設打設4	2025/02/14	済	なし			なし	
申込受付完了	新設	設計番号:2AAA252	申込番号:1222400003977	受付	設計	用地	工事	消込
東京都東久留米市小山3丁目 1-1	研削1	2025/01/23	済					
申込受付完了	新設	設計番号:2AAA253	申込番号:1222400003978	受付	設計	用地	工事	消込
東京都東久留米市小山3丁目 1-1	研削2	2025/01/23	済					
落成登録取消	新設	設計番号:2AAA256	申込番号:1222400003981	受付	設計	用地	工事	消込
東京都東久留米市小山3丁目 1-1	研削5	2025/01/23	済	済	なし			
落成登録待ち	新設	設計番号:2AAA258	申込番号:1222400003989	受付	設計	用地	工事	消込
東京都東久留米市小山3丁目 1-1	研削7	2025/01/23	済	済	なし			
落成登録待ち	新設	設計番号:2AAA260	申込番号:1222400003992	受付	設計	用地	工事	消込
東京都東久留米市小山3丁目 1-1	研削9	2025/01/23	済	済	なし			

© TEPCO Power Grid, Inc.

- 対象となる申込を一覧表示します
- 「代表申込のみ」と「すべての申込」を切り替えできます
- 情報更新がある申込に「New」マークを表示します



工程進捗詳細画面

「New」マーク

＜工程進捗一括入る戻る

工程進捗詳細

電気工事費負担金償還番号
607-0004

工事番号
576070004工事
詳細メニュー

「マーク」

受付完了

新設

設計番号:3BA1124

申込番号:1212400004257

設計

済

設計

なし

用地

なし

工事

なし

調査

なし

東京都東久留米市田無町1丁目 1-1

既設打設4

2025/02/14

設計判定

現場確認省略

工事現場

東電PG工事なし(調査のみ)

設計完了予定日

設計なし

用地交渉完了予定日

工事予定日

東電PG工事なし

工事費負担金

屋内配線工事の落成登録

お待ちください

調査予定日

引込線工事

対象外

計検宅配予定日

宅配なし

～工程進捗詳細機能の注意点～

- 表示内容は検索時点の予定であり、その内容や期日を確約するものではありません。

表示欄がない

- 工程進捗一覧画面で選択した申込の詳細を表示します
- 情報更新箇所に「New」マークを表示します



工期シミュレーション機能

- 申込前に、設計の要否や送電完了までの想定期間をシミュレーションいただけます。
- 占用申請が必要な場合の想定期間も表示します。
- 対象範囲は、「1-1-4. 公開対象範囲」(9ページ)を参照ください。

工期シミュレーション画面

＜総合メニューへ戻る＞ **工期シミュレーション** 電気工事店登録番号 715-1999 東京電力株式会社 託出サービス開始 さま

・ 支社が分かる方 () 支社が分からない方

支社 電柱標識 柱番号 契約種別 契約容量 (kVA) 軒数

水更津【水更津支社】 宮下 0120 電灯(昼時) 30 1 **再入力**

シミュレーション結果

設計要 変圧器工事が必要

想定期間
～東京電力パワーグリッドへの申込から送電まで～
3ヶ月程度

シミュレーション結果によらず早めにお申込ください。
[2025/02/18 13:23 時点]

▼ 占用申請等が必要な場合の想定期間

河川	+ 4ヶ月程度	官公有地	+ 3ヶ月程度
鉄道	+ 3ヶ月程度	文化財	+ 3ヶ月程度
都・県道	+ 3ヶ月程度	商店街	+ 1ヶ月程度
鉄道	+ 1ヶ月程度	砂防	+ 3ヶ月程度
民地交渉	+ 1ヶ月程度		

～工期シミュレーション機能の注意点～

- シミュレーション対象は、低圧かつ架空供給工事に限ります。高圧、太陽光、地中工事は対象外です。
- システム操作時点での想定期間をお知らせする機能であり、実際の工期と差違が出る可能性があります。
- 法令や約款上の需給地点適否判定ではないため、需給地点によっては別途協議が必要になる可能性があります。
- 小柱引込、引込線延長、上空通過などはシミュレーション結果によらず、申込後設計要となる場合があります。
- 想定期間の起算は、東京電力PGの申込受付完了日からとなります。

[重要協議申込はこちら](#) [標準工期目録はこちら](#)

© TEPCO Power Grid, Inc.

- 入力エリアに条件を入力します

- 結果エリアにシミュレーション結果と想定期間を表示します



4 公開対象範囲

工程進捗状況の公開対象



- Web申込システムに申込登録いただいた申込が対象となります。

公開対象	公開対象外
低圧	高圧
供給	発電
架空、地中	—
新設、契約変更、設備変更	撤去
進捗状況が 「申込受付完了～送電完了 ※」 までの申込 ※ 送電完了から1カ月以内	・ 申込受付完了から3年以上経過した申込 ・ 送電完了から1カ月を経過した申込

工期シミュレーションの対象範囲



- Web申込システムへの申込有無に関わらず利用可能です。

利用対象	利用対象外
低圧	高圧
供給	発電
架空	地中
新設、契約変更(増設)	契約変更(減設)、撤去

- 工程見える化システムは、弊社ホームページからご利用いただけます。
- 工程見える化システムでは、以下のように画面を移動します。

工程見える化システム

留意事項確認

工程進捗一覽

工期シミュレーション 入力

工程進捗詳細

工期シミュレーション 結果

- 前画面に戻る場合は、システムの「〇〇に戻る」ボタンを使用ください
- ブラウザの戻るボタンを使用すると、正しく画面遷移できない場合があります

2章

操作手順

2-1. システムへのログイン

東京電力パワーグリッド

企業情報 一般のお客さま 発電事業者さま・小売電気事業者さま 電気工事店さま・電気主任技術者さま その他お手続き・ご案内

でんき予報 停電情報 雨量・雷観測情報 よくあるご質問 プレスリリース・お知らせ LANGUAGE クイックリンク

工程見える化システム

サービス概要

電気工事店のみなさまに向け、新增設申込の工程などをWebにて確認できるサービスです。

＼工程状況を今すぐチェック！

工程見える化システム ログイン

ユーザーIDをお忘れの方 [>こちら](#)
パスワードをお忘れの方 [>こちら](#)

フクリー (Fukuri) ©東京電力パワーグリッド(株)

ご利用の手引き

操作ガイド	>印刷用 印刷してご確認くださいやすいレイアウトになっています。
	>閲覧用 パソコンやタブレット画面でご確認くださいやすいレイアウトになっています。
動画	>概要編 システム概要をご案内します。(約3分)
	>操作説明編 システムの操作説明をご案内します。(約12分)
その他	>占用申請等事例集 工事内容によって、官公庁などへの申請や土地の権利者さまとの交渉が必要になる場合があります。 官公庁などへの申請や、土地の権利者さまとの交渉が必要なケースをご紹介します。

画面はイメージです
実際の画面と異なる場合がございます

東京電力パワーグリッドホームページ内の、工程見える化システムページで「工程見える化システム ログイン」をクリックします。

- 工程見える化システムページ
<https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/demand/process/index-j.html>
- 工程見える化システムログイン画面
<https://www32.tepco.co.jp/J201/dfw/J2-koutei/mieruka>

ログイン

東京電力パワーグリッド

工程見える化システム

②

ユーザーID

パスワード

③

ログイン

①

④

○セキュリティ上の観点から、パスワードは定期的に変更いただくことをおすすめします。

- 当サービスの利用にあたっては、Web申込システムでの事前登録が必要です。
- パスワード変更などもWeb申込システムから行ってください。

～Web申込システムはこちら～

0001

© TEPCO Power Grid, Inc.

- ② [ユーザーID]、[パスワード]を入力します。(※1)
- ③ [ログイン]をクリックします。
→留意事項画面へ遷移します。



※1

ユーザーID・パスワードは、Web申込システムと同様のものを使用します。
サービス利用にあたって事前にWeb申込システムの利用登録が必要です。

入力項目説明

	項目名称	内容
A	ユーザーID	Web申込システムと同様のユーザーIDを入力してください。
B	パスワード	Web申込システムと同様のパスワードを入力してください。

ボタン・リンク説明

	項目名称	内容
C	ログイン	工程見える化システムにログインします。
D	Web申込システムはこちら	Web申込システムのログイン画面へ遷移します。 ※ パスワード変更はWeb申込システムへログイン後、パスワード変更画面から行えます。

2-2. 留意事項確認

The screenshot shows a web interface for '留意事項' (Notes). At the top, there are two red boxes: '電気工事店登録番号 607-0004' (A) and '工事店名 ST6070004工 さま' (B). The main content area is titled '工程見える化システム利用にあたっての留意事項' (Notes for using the Engineering Visibility System). It contains two sections: '1 工程情報照会機能' (1. Engineering Information Inquiry Function) and '2 工期シミュレーション' (2. Schedule Simulation). At the bottom, there is a red button labeled '確認' (D). A blue arrow labeled '1' points to the title, and another blue arrow labeled '2' points to the '確認' button. Green circles A, B, and C are also present, with C pointing to the main content area.

留意事項

電気工事店登録番号 607-0004

工事店名 ST6070004工 さま

工程見える化システム利用にあたっての留意事項

東京電力パワーグリッド株式会社が提供する「工程見える化システム」のご利用にあたっては、別途定める利用規約に同意のうえ、下記留意事項をご確認いただけますようお願い申し上げます。
内容をご確認いただけましたら、確認ボタンを押下してください。(メインメニュー画面へ遷移します)

1 工程情報照会機能

- 対象申込は、低圧かつ供給工事のみです。高圧や太陽光は対象外です。
- 表示内容は検索時点の予定であり、その内容や期日を確約するものではありません。
- 用地交渉期間には行政への申請(国道、河川、官公有地、鉄道など)期間を含みます。
- 他社の申込情報はご確認いただけません。

2 工期シミュレーション

- シミュレーション対象は、低圧かつ架空供給工事に限ります。高圧、太陽光、地中工事は対象外です。
- システム操作時点での想定期間をお知らせする機能であり、実際の工期と差違が出る可能性があります。
- 法令や約款上の需給地点適否判定ではないため、需給地点によっては別途協議が必要になる可能性があります。
- 小柱引込、引込線互長、上空通過などはシミュレーション結果によらず、申込後設計要となる場合があります。
- 想定期間の起算は、東京電力PGの申込受付完了日からとなります。

確認



注目!

留意事項を確認し、
内容をご理解いただいた上でご利用ください。

- ① 留意事項を確認します。
- ② [確認]をクリックします。
→総合メニュー画面へ遷移します。

表示項目説明

	項目名称	内容
A	電気工事店登録番号	ログイン中の電気工事店登録番号を表示します。 ※以降、すべての画面に表示します。
B	電気工事店名 ユーザー名	ログイン中の電気工事店名およびユーザー名を表示します。 ※以降、すべての画面に表示します。
C	留意事項	工程見える化システム利用にあたっての留意事項を表示します。

ボタン・リンク説明

	項目名称	内容
D	確認	総合メニューへ遷移します。

2-3. 総合メニュー



① 利用する機能をクリックします。

■ 工程情報状況を確認する

[工程進捗一覧]をクリックします。
→工程進捗一覧画面へ遷移します。

[詳細は「2-4.工程進捗状況の確認」\(17ページ\)を参照ください。](#)

■ 工期シミュレーションを利用する

[工期シミュレーション]をクリックします。
→工期シミュレーション画面へ遷移します。

[詳細は「2-5.工期シミュレーション」\(27ページ\)を参照ください。](#)

■ スマートフォン画面に切り替える

② [スマートフォン用画面へ切り替え]をクリックします。
→スマートフォン画面に切り替わります。

ボタン・リンク説明

	項目名称	内容
A	工程進捗一覧	工程進捗一覧へ遷移します。
B	工期シミュレーション	工期シミュレーションへ遷移します。
C	ログアウト	工程見える化システムからログアウトします。
D	スマートフォン用画面へ切り替え	操作画面をスマートフォン用画面に切り替えます。

スマートフォン画面



ボタン・リンク説明

	項目名称	内容
A	工程進捗一覧	工程進捗一覧へ遷移します。
B	工期シミュレーション	工期シミュレーションへ遷移します。
C	ログアウト	工程見える化システムからログアウトします。
D	パソコン用画面へ切り替え	操作画面をパソコン用画面に切り替えます。

2-4. 工程進捗状況の確認

1 工程進捗一覧画面

※ 申込表示の切り替え

電気工事店登録番号 607-0004 工事店名 ST6070004エ さま

工程進捗一覧

＜総合メニューへ戻る＞

名義 住所 建物名 申込番号 設計番号 進捗状況 担当者

例) 東電太郎 例) 東京、葛飾区 アパート・マンション名、その他 1234567890123 1AA1234

検索

検索結果 60 件

検索項目を非表示

昇順に表示 降順に表示 更新あり(New)

申込受付完了 新設 設計番号:3BA1124 申込番号:1212400004257

東京都西東京市田無町1丁目 1-1 託サ打鍵4

2025/02/14

受付 設計 用地 工事 調査

済 なし なし

2025/01/23

受付 設計 用地 工事 調査

済

2025/01/23

受付 設計 用地 工事 調査

済

2025/01/23

受付 設計 用地 工事 調査

済 済 なし

2025/01/23 2025/02/13

落成登録取消 新設 設計番号:2AAA256 申込番号:1222400003981

東京都東久留米市小山3丁目 1-1 研修5

2025/01/23 2025/01/27

落成登録待ち 新設 設計番号:2AAA258 申込番号:1222400003989

東京都東久留米市小山3丁目 1-1 研修7

2025/01/23 2025/01/27

① 各工程の進捗状況を確認します。

■ 検索条件を指定する

- ② 検索条件を入力します。
- ③ [検索]をクリックします。
→ 検索結果を表示します。

■ 進捗状況の詳細を確認する

詳細を確認する申込の行をクリックします。
→ 工程進捗詳細画面へ遷移します。

詳細は「2-4-2. 工程進捗詳細画面」(21ページ)を参照ください。

※ 申込表示の切り替え

初期設定では[代表申込のみ]になっています。
検索結果にすべての申込を表示させる場合は、[すべての申込]を選択してから
[検索]をクリックしてください。



表示項目説明

	項目名称	内容
A	更新通知	情報更新がある申込に「New」を表示します。(表示期間は翌営業日まで) 例:金曜に変更→土曜から月曜まで表示
B	進捗状況	申込の進捗状況を表示します。
C	申込種別	申込の種別を表示します。
D	設計番号	設計番号(7桁)を表示します。
E	申込番号	申込番号(13桁)を表示します。
F	住所・建物名・部屋番号	需要場所住所、需要場所建物名、部屋番号を表示します。
G	需要者名	需要者名義を表示します。
H	各工程進捗状況	工程ごとの進捗状況を表示します。
I	各工程完了日	工程ごとの完了日を表示します。

入力項目説明

	項目名称	内容
J	名義	申込の需要者名義を入力してください。
K	住所	申込の需要場所住所を入力してください。
L	建物名	申込の需要場所建物名を入力してください。
M	申込番号	申込の申込番号(13桁)を入力してください。
N	設計番号	申込の設計番号(7桁)を入力してください。 設計番号の英字は大文字で入力してください。
O	進捗状況	申込の進捗状況を選択してください。
P	担当者	申込の担当者を選択してください。

ボタン・リンク説明


	項目名称	内容
Q	総合メニューへ戻る	総合メニューへ遷移します。
R	代表申込のみ ／すべての申込	一覧表示の表示範囲を切り替えます。 ・代表申込のみ 一括申込の代表申込のみを表示します。 ・すべての申込 すべての申込を表示します。
S	検索	入力した条件で検索結果を表示します。
T	検索項目を非表示	検索条件を非表示にします。
U	昇順／降順	検索結果表示の昇順／降順を、選択した方法で並べ替えます。
V	ソート順	検索結果表示の並べ替え方法を選択します。

進捗状況(ステータス)表示方法

- Web申込システムの工程状況に合わせて工程見える化の進捗状況を表示します。

	Web申込システム 工程状況	工程見える化 進捗状況
1	申込受付完了	申込受付完了
2		設計中
3		設計完了
4		用地交渉中
5		用地交渉完了
6	支払情報登録待ち	入金待ち
7	支払情報登録完了	
8	入金連絡待ち	
9	入金連絡完了	
10	入金再確認	
11	入金確認完了	入金確認完了
12	落成登録待ち	落成登録待ち
13	落成登録完了	落成登録完了
14	落成登録取消	落成登録取消
15	落成受付完了	工事・調査手配済
16	調査結果連携待ち	送電完了
17	異動連携エラー	
18	送電完了	

2 工程進捗詳細画面

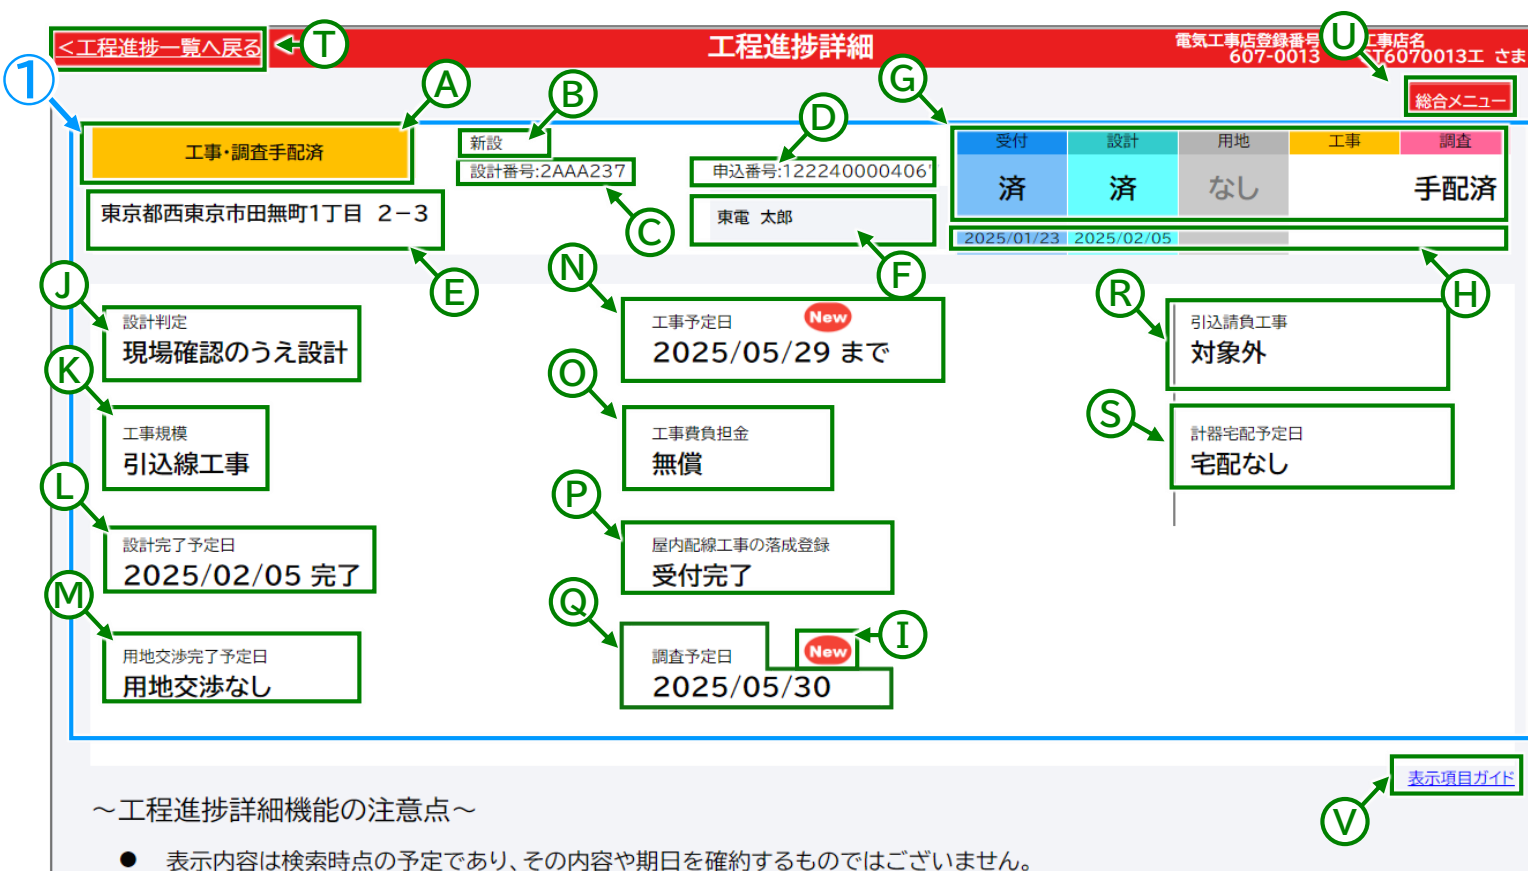

① 進捗状況の詳細を確認します。



注目!

表示している日付や期間は、検索時点での情報です。
表示内容を確認するものではありません。

表示項目説明

	項目名称	内容
A	進捗状況	申込の進捗状況を表示します。
B	申込種別	申込の種別を表示します。
C	設計番号	設計番号(7桁)を表示します。
D	申込番号	申込番号(13桁)を表示します。
E	住所・建物名・部屋番号	需要場所住所、需要場所建物名、部屋番号を表示します。
F	需要者名	需要者名義を表示します。
G	各工程進捗状況	工程ごとの進捗状況を表示します。
H	各工程完了日	工程ごとの完了日を表示します。
I	更新通知	情報更新箇所に「New」マークを表示します。(表示期間は翌営業日まで) 例:金曜に変更→土曜から月曜まで表示
J	設計判定	設計判定結果を表示します。
K	工事規模	工事内容を表示します。
L	設計完了予定日	設計完了予定日を表示します。
M	用地交渉完了予定日	用地交渉完了予定時期を表示します。
N	工事予定日	工事予定日を表示します。
O	工事費負担金	工事費負担金の有無を表示します。
P	屋内配線工事の 落成登録	屋内配線工事の落成登録状況を表示します。
Q	調査予定日	調査予定日、調査結果を表示します。
R	引込請負工事	引込請負工事内容を表示します。対象外の場合は対象外と表示します。
S	計器宅配予定日	引込請負工事で計器宅配がある場合に計器到着予定日を表示します。

ボタン・リンク説明

	項目名称	内容
T	工程進捗一覧へ戻る	工程進捗一覧画面へ遷移します。
U	総合メニュー	総合メニューへ遷移します。
V	表示項目ガイド	表示項目ガイドを表示します。

3 スマートフォン画面

■ 工程進捗一覧画面

スマートフォン画面の「工程進捗一覧」画面のスクリーンショット。画面には、検索項目、検索結果、申請一覧、申請詳細などが表示されています。各項目には、AからMまでのラベルが付けられています。

画面構成要素とラベル:

- A: 電気工事店名・ユーザー名
- B: 更新通知
- C: 進捗状況
- D: 申込種別
- E: 住所・建物名・部屋番号
- F: 申込番号
- G: 設計番号
- H: 需要者名
- I: 各工程進捗状況
- J: 各工程完了日
- K: 昇順／降順
- L: ソート順
- M: 戻る
- N: 検索項目を表示

検索項目: 検索項目を表示 (N)

検索結果: 36 件

昇順 (K) / 更新あり (New) (F)

申請一覧:

- 申請番号: 1222400004067
- 設計番号: 2AAA237
- 新設
- 東京都西東京市田無町1丁目 2-3
- 東電 太郎
- 受付: 済 (25/01/23)
- 設計: 済 (25/02/05)
- 用地: なし
- 工事: 手配済
- 調査: 済

申請詳細:

- 申請受付完了
- 申請番号: 1222400004105
- 設計番号: 2AAA245
- 新設
- 東京都西東京市田無町1丁目 1
- 北木挽ビル 1F
- キタコピキビル 1F
- 受付: 済 (25/01/23)
- 設計: 済
- 用地: 済
- 工事: 済
- 調査: 済

申請詳細:

- 申請受付完了
- 申請番号: 1222400004113
- 設計番号: 2AAA247
- 新設
- 東京都西東京市田無町1丁目 1
- 北木挽ビル 3F
- キタコピキビル 3F
- 受付: 済 (25/01/23)
- 設計: 済
- 用地: 済
- 工事: 済
- 調査: 済

申請詳細:

- 申請受付完了
- 申請番号: 1222400004098
- 設計番号: 2AAA244
- 新設
- 東京都西東京市田無町1丁目 1
- 北木挽ビル 共用
- 北木挽ビル
- 受付: 済 (25/01/23)
- 設計: 済
- 用地: 済
- 工事: 済
- 調査: 済

申請詳細:

- 申請受付完了
- 申請番号: 1222400004193
- 設計番号: 2AAA859
- 新設
- 東京都西東京市田無町1丁目 1
- 北木挽ビル 共用
- 北木挽ビル
- 受付: 済 (25/02/04)
- 設計: 済
- 用地: 済
- 工事: 済
- 調査: 済

表示項目説明

	項目名称	内容
A	電気工事店名・ユーザー名	ログイン中の電気工事店名およびユーザー名を表示します。
B	更新通知	情報更新がある申込に「New」を表示します。(表示期間は翌営業日まで)例:金曜に変更→土曜から月曜まで表示
C	進捗状況	申込の進捗状況を表示します。
D	申込種別	申込の種別を表示します。
E	住所・建物名・部屋番号	需要場所住所、需要場所建物名、部屋番号を表示します。
F	申込番号	申込番号(13桁)を表示します。
G	設計番号	設計番号(7桁)を表示します。
H	需要者名	需要者名義を表示します。
I	各工程進捗状況	工程ごとの進捗状況を表示します。
J	各工程完了日	工程ごとの完了日を表示します。

入力項目説明

	項目名称	内容
K	昇順／降順	検索結果表示の昇順／降順を、選択した方法で並べ替えます。
L	ソート順	検索結果表示の並べ替え方法を選択します。

ボタン・リンク説明

	項目名称	内容
M	戻る	総合メニューへ遷移します。
N	検索項目を表示	検索条件を表示します。 詳細は「工程進捗一覧画面(検索条件)」(24ページ)を参照。

■ 工程進捗一覧画面(検索条件)

工程進捗一覧

工事店名 ST607001 さま

代表申込のみ ☒ すべての申込 ☐

名義 住所

例)東電太郎 例)東京、葛飾区

建物名

アパート・マンション名、その他

申込番号 設計番号

1234567890123 1AA1234

進捗状況 担当者

検索

検索項目を非表示

入力項目説明

	項目名称	内容
A	名義	申込の需要者名義を入力してください。
B	住所	申込の需要場所住所を入力してください。
C	建物名	申込の需要場所建物名を入力してください。
D	申込番号	申込の申込番号(13桁)を入力してください。
E	設計番号	申込の設計番号(7桁)を入力してください。
F	進捗状況	申込の進捗状況を選択してください。
G	担当者	申込の担当者を選択してください。

ボタン・リンク説明

	項目名称	内容
H	代表申込のみ ／すべての申込	一覧表示の表示範囲を切り替えます。 ・代表申込のみ 一括申込の代表申込のみを表示します。 ・すべての申込 すべての申込を表示します。
I	検索	入力した条件で検索結果を表示します。
J	検索項目を非表示	検索条件を非表示にします。

■ 工程進捗詳細画面

<戻る

工程進捗詳細

工事店名
ST607001 さま

総合メニュー

工事・調査手配済

申込番号:1222400004067

新設

設計番号:2AAA237

東京都西東京市田無町1丁目 2

東電 太郎

-3

受付

設計

用地

工事

調査

済

済

なし

手配済

25/01/23

25/02/05

設計判定
現場確認のうえ設計

設計完了予定日
2025/02/05 完了

工事規模
引込線工事

用地交渉完了予定日
用地交渉なし

工事予定日
2025/05/29 まで

工事費負担金
無償

屋内配線工事の落成登録
受付完了

調査予定日
2025/05/30

引込請負工事
対象外

計器宅配予定日
宅配なし

表示項目ガイド

～工程進捗詳細機能の注意点～
表示内容は検索時点の予定であり、その内容や期日を
確認するものではありません。

© TEPCO Power Grid, Inc.

表示項目説明

	項目名称	内容
A	進捗状況	申込の進捗状況を表示します。
B	申込種別	申込の種別を表示します。
C	住所・建物名・ 部屋番号	需要場所住所、需要場所建物 名、部屋番号を表示します。
D	申込番号	申込番号(13桁)を表示します。
E	設計番号	設計番号(7桁)を表示します。
F	需要者名	需要者名義を表示します。
G	各工程進捗 状況	工程ごとの進捗状況を表示し ます。
H	各工程完了日	工程ごとの完了日を表示しま す。
I	設計判定	設計判定を表示します
J	工事規模	工事内容を表示します。
K	工事予定日	工事予定日を表示します。
L	更新通知	情報更新箇所に「New」マーク を表示します。(表示期間は翌 営業日まで)例:金曜に変更→ 土曜から月曜まで表示
M	屋内配線工事 の落成登録	屋内配線工事の落成登録状 況を表示します。
N	引込請負工事	引込請負工事内容を表示しま す。対象外の場合は対象外と 表示します。
O	設計完了 予定日	設計完了予定日を表示します。
P	用地交渉完了 予定日	用地交渉完了予定時期を表示 します。
Q	工事費負担金	工事費負担金有無を表示しま す。
R	調査予定日	調査予定日を表示します。
S	計器宅配 予定日	引込請負工事で計器宅配があ る場合に計器到着予定日を表 示します。
T	表示項目ガイド	表示項目ガイドを表示します。

ボタン・リンク説明

	項目名称	内容
U	戻る	工程進捗一覧画面へ遷移しま す。
V	総合メニュー	総合メニューへ遷移します。

2-5. 工期シミュレーション

1 シミュレーション条件入力画面

■ 支社が分かる方

詳細は以下の「支社が分かる方」を参照ください。

■ 支社が分からない方

詳細は「支社が分からない方」(29ページ)を参照ください。

支社が分かる方

<総合メニューへ戻る (A) 工期シミュレーション 電気工事店登録番号 607-0004 工事店名 ST6070004工 さま

支社が分かる方 (G) 支社が分からない方 (H)

支社 (A) 電柱標識 (B) 柱番号 (C) 契約種別 (D) 契約容量(kVA) (E) 軒数 (F) 実行 (I) クリア (J)

入力エリアにシミュレーション情報を入力してください

- シミュレーション対象は、低圧かつ架空供給工事に限ります。高圧、太陽光、地中工事は対象外です。
- システム操作時点での想定期間をお知らせする機能であり、実際の工期と差違が出る可能性がございます。
- 法令や約款上の需給地点適否判定ではないため、需給地点によっては別途協議が必要になる可能性がございます。
- 小柱引込、引込線亘長、上空通過などはシミュレーション結果によらず、申込後設計要となる場合があります。
- 想定期間の起算は、東京電力PGの申込受付完了日からとなります。

事前入力理由を入力 (K) 標準工程日数はこちら (L)

入力項目説明

	項目名称	内容
A	支社	支社を入力してください。
B	電柱標識	電柱標識を入力してください。 具体的な入力方法は「電柱標識の入力方法」(32ページ)を参照ください。
C	柱番号	柱番号を入力してください。 具体的な入力方法は「柱番号の入力方法」(33ページ)を参照ください。
D	契約種別	契約種別を選択してください。
E	契約容量(kVA)	契約容量(kVA)を入力してください。 ※1kVA=10Aです。 具体的な入力方法は「契約容量(kVA)の入力方法」(35ページ)を参照ください。
F	軒数	軒数を入力してください。

ボタン・リンク説明

	項目名称	内容
G	総合メニューへ戻る	総合メニューへ遷移します。
H	支社が分かる方／ 支社が分からない方	検索入力項目を切り替えます。
I	実行	入力した条件でシミュレーション結果を表示します。
J	クリア	入力内容を削除します。
K	事前協議申込はこちら	「供給事前協議申込WEB受付サービス」を表示します。
L	標準工程日数はこちら	「託送供給申込におけるお申込み受付から送電までの所要日数」を表示します。

支社が分からない方

電気工事店登録番号 607-0004 工事店名 ST6070004工 さま

入力エリアにシミュレーション情報を入力してください

- シミュレーション対象は、低圧かつ架空供給工事に限ります。高圧、太陽光、地中工事は対象外です。
- システム操作時点での想定期間をお知らせする機能であり、実際の工期と差違が出る可能性がございます。
- 法令や約款上の需給地点適否判定ではないため、需給地点によっては別途協議が必要になる可能性がございます。
- 小柱引込、引込線巨長、上空通過などはシミュレーション結果によらず、申込後設計要となる場合があります。
- 想定期間の起算は、東京電力PGの申込受付完了日からとなります。

※ 事前確認は必須です。

入力項目説明

	項目名称	内容
A	エリア	エリア(都県)をプルダウンから選択してください。
B	電柱標識	電柱標識を入力してください。 具体的な入力方法は「電柱標識の入力方法」(32ページ)を参照ください。
C	支社	該当する支社を、プルダウンから選択してください。
D	柱番号	柱番号を入力してください。 具体的な入力方法は「柱番号の入力方法」(33ページ)を参照ください。
E	契約種別	契約種別を選択してください。
F	契約容量(kVA)	契約容量(kVA)を入力してください。 ※1kVA=10Aです。 具体的な入力方法は「契約容量(kVA)の入力方法」(35ページ)を参照ください。
G	軒数	軒数を入力してください。

ボタン・リンク説明



	項目名称	内容
H	総合メニューへ戻る	総合メニューへ遷移します。
I	支社が分かる方／ 支社が分からない方	検索入力項目を切り替えます。
J	実行	入力した条件でシミュレーション結果を表示します。
K	クリア	入力内容を削除します。
L	事前協議申込はこちら	「供給事前協議申込WEB受付サービス」を表示します。
M	標準工程日数はこちら	「託送供給申込におけるお申込み受付から送電までの所要日数」を表示します。

2 番札の確認方法

- 東京電力の番札に記載された、標識と柱番号をご確認ください
- 標識は「漢字」や「ひらがな」、「カタカナ」、「数字」のものがあります
- 柱番号は「数字」や「アルファベット」のものがあります
- 他社の番札に記載された情報ではシミュレーションできません

東京電力の番札


他社の番札

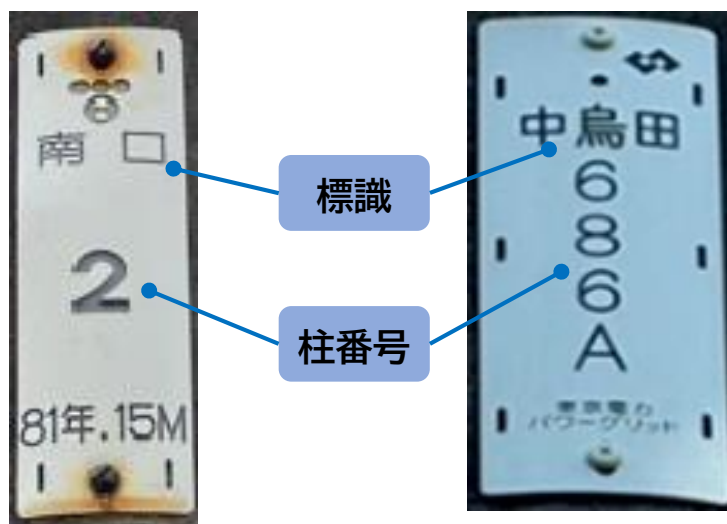


他社の番札に記載された情報を確認いただく必要はございませんが、東京電力の番札と他社の番札の設置順(どちらが上に設置されているか)をご確認ください



東京電力の番札が下

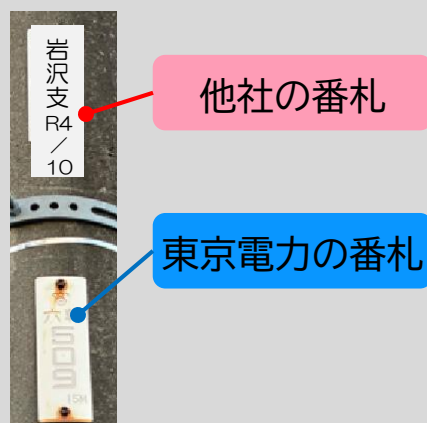

東京電力の番札が上

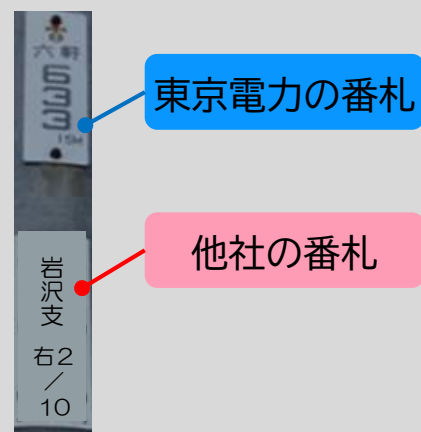

3 電柱標識の入力方法

<総合メニューへ戻る

工期シミュレーション

電気工事店登録番号
607-0004

工事店名
ST6070004工 さま

● 支社が分かる方

○ 支社が分からない方

支社

例)千葉(幕張)

電柱標識

柱番号

契約種別

契約容量(kVA)

軒数

実行

クリア

A

入力エリアにシミュレーション情報を入力してください

● シミュレーション対象は、低圧かつ架空供給工事に限ります。高圧、太陽光、地中工事は対象外です。

● システム操作時点での想定期間をお知らせする機能であり、実際の工期と差違が出る可能性がございます。

● 法令や約款上の需給地点適否判定ではないため、需給地点によっては別途協議が必要になる可能性がございます。

● 小柱引込、引込線亘長、上空通過などはシミュレーション結果によらず、申込後設計要となる場合があります。

● 想定期間の起算は、東京電力PGの申込受付完了日からとなります。

事前協議申込はこちら

標準工期日数はこちら

電柱標識

南口

中烏田

アヤメ

阿北5

入力項目説明

	項目名称	内容
A	電柱標識	電柱標識を入力してください。 番札に記載されている文字を入力してください。 「漢字」、「ひらがな」、「カタカナ」、「数字」のまま入力してください。 ※システムには部分一致の予測変換機能があります。

2025.9 目的外使用・複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社

32

4 柱番号の入力方法（上3桁）

[<総合メニューへ戻る](#)

工期シミュレーション

電気工事店登録番号
607-0004
 工事店名
ST6070004エ さま

☒ 支社が分かる方
 ☐ 支社が分からない方

支社

電柱標識

柱番号

契約種別

契約容量(kVA)

軒数

実行

クリア




例)千葉(幕張)

入力エリアにシミュレーション情報を入力してください

- シミュレーション対象は、低圧かつ架空供給工事に限ります。高圧、太陽光、地中工事は対象外です。
- システム操作時点での想定期間をお知らせする機能であり、実際の工期と差違が出る可能性がございます。
- 法令や約款上の需給地点適否判定ではないため、需給地点によっては別途協議が必要になる可能性がございます。
- 小柱引込、引込線亘長、上空通過などはシミュレーション結果によらず、申込後設計要となる場合があります。
- 想定期間の起算は、東京電力PGの申込受付完了日からとなります。

[事前協議申込はこちら](#)
[標準工期日数はこちら](#)

柱番号

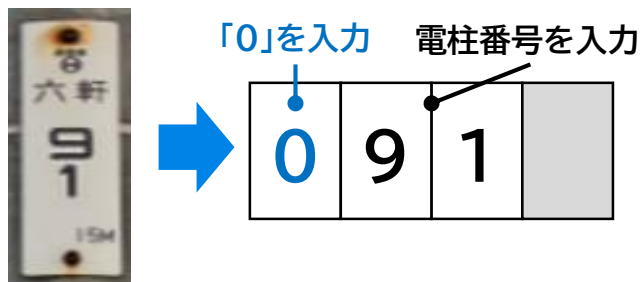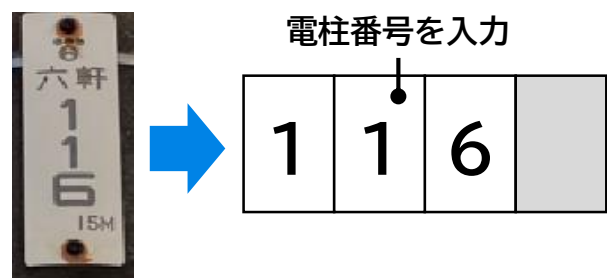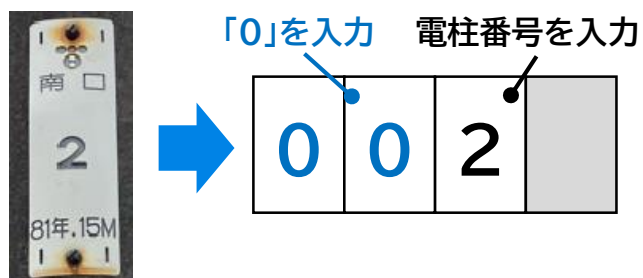

入力項目説明

	項目名称	内容
B	柱番号(上3桁)	電柱番号が1桁の場合は、1桁目と2桁目に「0」を入力してください。 電柱番号が2桁の場合は、1桁目に「0」を入力してください。 電柱番号が3桁の場合は、左詰めで3桁の数字を入力してください。

5 柱番号の入力方法（下1桁）

<総合メニューへ戻る

工期シミュレーション

電気工事店登録番号
607-0004

工事店名
ST6070004工 さま

☒ 支社が分かる方

☐ 支社が分からない方

支社

例)千葉(幕張)

電柱標識

柱番号

契約種別

契約容量(kVA)

軒数

実行

クリア

B

入力エリアにシミュレーション情報を入力してください

●シミュレーション対象は、低圧かつ架空供給工事に限ります。高圧、太陽光、地中工事は対象外です。

●システム操作時点での想定期間をお知らせする機能であり、実際の工期と差違が出る可能性があります。

●法令や約款上の需給地点適否判定ではないため、需給地点によっては別途協議が必要になる可能性があります。

●小柱引込、引込線亘長、上空通過などはシミュレーション結果によらず、申込後設計要となる場合があります。

●想定期間の起算は、東京電力PGの申込受付完了日からとなります。

事前協議申込はこちら

標準工期日数はこちら

東京電力の番札が下

5 0 9 0

下1桁に「0」

東京電力の番札が上

6 3 3 A

下1桁に「A」

柱番号が4桁の場合

6 8 6 A

柱番号をそのまま

入力項目説明

	項目名称	内容
B	柱番号(下1桁)	東京電力の番札が下にある場合は、下1桁に0を入力してください。 東京電力の番札が上にある場合は、下1桁にアルファベットの大文字Aを入力してください。 柱番号が4桁の場合は、番札の位置に関わらず柱番号をそのまま入力してください。

2025.9 目的外使用・複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社

34

6 契約容量(kVA)の入力方法

<総合メニューへ戻る
工期シミュレーション

電気工事店登録番号
607-0004
工事店名
ST6070004エ さま

☒ 支社が分かる方 ☐ 支社が分からない方

支社	電柱標識	柱番号	契約種別	契約容量(kVA)	軒数	
例)千葉(希張)						実行 クリア



C

入力エリアにシミュレーション情報を入力してください

- シミュレーション対象は、低圧かつ架空供給工事に限ります。高圧、太陽光、地中工事は対象外です。
- システム操作時点での想定期間をお知らせする機能であり、実際の工期と差違が出る可能性がございます。
- 法令や約款上の需給地点適否判定ではないため、需給地点によっては別途協議が必要になる可能性がございます。
- 小柱引込、引込線亘長、上空通過などはシミュレーション結果によらず、申込後設計要となる場合があります。
- 想定期間の起算は、東京電力PGの申込受付完了日からとなります。

[事前協議申込はこちら](#)
[標準工期日数はこちら](#)

参考: 契約容量変換表

電灯		動力	→	システム 入力値
A	kVA	kW		
5	0.5	0.5		1
10	1	1		1
15	1.5	1.5		2
20	2	2		2
30	3	3		3
40	4	4		4
50	5	5		5
60	6	6		6
	7~49	7~49		7~49

入力項目説明

	項目名称	内容
C	契約容量(kVA)	入力する単位は、キロボルトアンペア、またはキロワットです。 アンペアの場合は、キロボルトアンペアへ変換して入力してください。 容量に合わせて表のとおり入力してください。 ※小数点以下は繰り上げて整数で入力してください

7 確認方法、入力方法 まとめ

確認方法	ポイント
番札の確認方法	➤ 東京電力の番札に記載された、標識と柱番号を確認 ➤ 標識は「漢字」や「ひらがな」、「カタカナ」、「数字」があります ➤ 柱番号は「アルファベット」が書かれている場合があります ➤ 「東京電力」と「他社」どちらの番札が上に設置されているか確認
入力方法	ポイント
標識の入力方法	➤ 番札の文字をそのまま入力（漢字、ひらがな、カタカナ、数字）
柱番号の入力方法 上3桁	➤ 電柱番号が1桁の場合は、1、2桁目に0を入力 ➤ 電柱番号が2桁の場合は、1桁目に0を入力 ➤ 電柱番号が3桁の場合はそのまま入力
柱番号の入力方法 下1桁	➤ 東京電力の番札が他社の番札より下にある場合は、下1桁に「0」を入力 ➤ 東京電力の番札が他社の番札より上にある場合は、下1桁に「A」を入力 ➤ 柱番号が4桁の場合は、番札の位置に関わらず柱番号を入力
契約容量	➤ アンペアの場合は、キロボルトアンペアへ変換して入力 ➤ 小数点以下は繰り上げて整数で入力

8 結果画面



注意!

ご案内する期間はシミュレーション時点での「想定」です。
送電希望日がお決まりの場合は、シミュレーション結果に関わらず早めの申込をお願いいたします。

■設計が必要となる場合

詳細は以下の「工期シミュレーション結果(設計要)」を参照ください。

■設計が不要となる場合

詳細は「工期シミュレーション結果(引込線以下工事)」(39ページ)を参照ください。

■入力した条件でシミュレーションができない場合

詳細は「工期シミュレーション結果(対象設備なし)」(40ページ)を参照ください。

工期シミュレーション結果(設計要)

<総合メニューへ戻る
工期シミュレーション

電気工事店登録番号
715-1999
東京電力株式会社
託送サービス総括 さま

● 支社が分かる方 ○ 支社が分からない方

支社 木更津【木更津支社】

電柱標識 宮下

柱番号 0120

契約種別 電灯(臨時)

契約容量(kVA) 30

軒数 1

再入力

シミュレーション結果

設計要 変圧器工事が必要

想定期間

3ヶ月程度

～東京電力パワーグリッドへの申込から送電まで～

シミュレーション結果によらず早めにお申込ください

【2025/02/18 13:23 時点】

▼ 占用申請等が必要な場合の想定期間

河川	+ 4ヶ月程度	官公有地	+ 3ヶ月程度
国道	+ 3ヶ月程度	文化財	+ 3ヶ月程度
都・県道	+ 3ヶ月程度	商店街	+ 1ヶ月程度
鉄道	+ 1ヶ月程度	砂防	+ 3ヶ月程度
民地交渉	+ 1ヶ月程度		

～工期シミュレーション機能の注意点～

- シミュレーション対象は、低圧かつ架空供給工事に限ります。高圧、太陽光、地中工事は対象外です。
- システム操作時点での想定期間をお知らせする機能であり、実際の工期と差違が出る可能性があります。
- 法令や約款上の需給地点適否判定ではないため、需給地点によっては別途協議が必要になる可能性があります。
- 小柱引込、引込線亘長、上空通過などはシミュレーション結果によらず、申込後設計要となる場合があります。
- 想定期間の起算は、東京電力PGの申込受付完了日からとなります。

再前協議申込はこちら

標準工程日数はこちら

表示項目説明

	項目名称	内容
A	シミュレーション結果	設計要否／設計理由を表示します。
B	想定期間	申込受付完了※から送電完了までの想定期間を表示します。 ※東京電力パワーグリッドが申込を受付した時点
C	シミュレーション 実施日時	シミュレーションを実施した時点の日時を表示します。
D	占用申請等が必要な場 合の想定期間	占用申請等が必要な場合の想定期間を表示します。

ボタン・リンク説明

	項目名称	内容
E	再入力	シミュレーション条件を再入力できるよう、入力項目を活性化します。
F	事前協議申込はこちら	「供給事前協議申込WEB受付サービス」を表示します。
G	標準工程日数はこちら	「託送供給申込におけるお申込み受付から送電までの所要日数」を表示します。

工期シミュレーション結果(引込線以下工事)

[<総合メニューへ戻る](#)

工期シミュレーション

電気工事店登録番号
715-1999

東京電力株式会社
託送サービス総括 さま

☒ 支社が分かる方

☐ 支社が分からない方

支社

木更津【木更津支社】

電柱標識

宮下

柱番号

0120

契約種別

電灯(臨時)

契約容量(kVA)

10

軒数

1

再入力

A

シミュレーション結果

引込線以下工事

B

現場確認が必要な場合があるため、
シミュレーション結果によらず早めにお申込ください。

【2025/02/18 13:35 時点】

C

▼ 占用申請等が必要な場合の想定期間

河川	+ 4ヶ月程度	官公有地	+ 3ヶ月程度
国道	+ 3ヶ月程度	文化財	+ 3ヶ月程度
都・県道	+ 3ヶ月程度	商店街	+ 1ヶ月程度
鉄道	+ 1ヶ月程度	砂防	+ 3ヶ月程度
民地交渉	+ 1ヶ月程度		

D

～工期シミュレーション機能の注意点～

- シミュレーション対象は、低圧かつ架空供給工事に限ります。高圧、太陽光、地中工事は対象外です。
- システム操作時点での想定期間をお知らせする機能であり、実際の工期と差違が出る可能性がございます。
- 法令や約款上の需給地点適否判定ではないため、需給地点によっては別途協議が必要になる可能性がございます。
- 小柱引込、引込線亘長、上空通過などはシミュレーション結果によらず、申込後設計要となる場合がございます。
- 想定期間の起算は、東京電力PGの申込受付完了日からとなります。

E

事前協議申込はこちら

F

標準工程日数はこちら

表示項目説明

	項目名称	内容
A	シミュレーション結果	工事内容を表示します。
B	シミュレーション 実施日時	シミュレーションを実施した時点の日時を表示します。
C	占用申請等が必要な場合の 想定期間	占用申請等が必要な場合の想定期間を表示します。

ボタン・リンク説明

	項目名称	内容
D	再入力	シミュレーション条件を再入力できるよう、入力項目を活性化します。
E	事前協議申込はこちら	「供給事前協議申込WEB受付サービス」を表示します。
F	標準工程日数はこちら	「託送供給申込におけるお申込み受付から送電までの所要日数」を表示します。

工期シミュレーション結果(対象設備なし)

[<総合メニューへ戻る](#)

工期シミュレーション

電気工事店登録番号
607-0004

工事店名
ST6070004エ さま

☐ 支社が分かる方

☒ 支社が分からない方

エリア

電柱標識

支社

柱番号

契約種別

契約容量(kVA)

軒数

再入力

多摩

武蔵野

武蔵野(清瀬)【多摩総支社】

604A

動力(臨時)

10

1

A

シミュレーション結果

入力いただいた供給設備を確認できませんでした

お手数ですが入力内容をご確認ください

B

【2025/04/28 10:18 時点】

C

再入力

D

事前協議申込はこちら

標準工程日数はこちら

E

● シミュレーション対象は、低圧かつ供給工事の申込に限ります。高圧、太陽光、地中工事は対象外です。

● システム操作時点での想定期間をお知らせする機能であり、実際の工期と差違が出る可能性がございます。

● 法令や約款上の需給地点適否判定ではないため、需給地点によっては別途協議が必要になる可能性がございます。

● 電柱設備容量を確認する機能であり、引込線巨長、小柱引込、上空通過などのケースはシミュレーション対象外となります。

● 想定期間の起算は、東京電力PGの申込受付完了日からとなります。

- シミュレーションができない場合は、以下をお試しください
- ・「再入力」ボタンを押下し、シミュレーション条件を再入力。
 - ・入力に誤りがないか確認。

表示項目説明

	項目名称	内容
A	シミュレーション結果	シミュレーション結果を表示します。
B	シミュレーション実施日時	シミュレーションを実施した時点の日時を表示します。

ボタン・リンク説明

	項目名称	内容
C	再入力	シミュレーション条件を再入力できるよう、入力項目を活性化します。
D	事前協議申込はこちら	「供給事前協議申込WEB受付サービス」を表示します。
E	標準工程日数はこちら	「託送供給申込におけるお申込み受付から送電までの所要日数」を表示します。

9 スマートフォン画面

■ シミュレーション条件入力画面

シミュレーション条件を入力する際、支社が分かる/分からないによって手順が異なります。

■ 支社が分かる方

[詳細は「支社が分かる方」\(42ページ\)を参照ください。](#)

■ 支社が分からない方

[詳細は「支社が分からない方」\(43ページ\)を参照ください。](#)

支社が分かる方

入力エリアにシミュレーション情報を入力してください

シミュレーション対象は、低圧かつ架空供給工事に限ります。高圧、太陽光、地中工事は対象外です。システム操作時点での想定期間をお知らせする機能であり、実際の工期と差違が出る可能性がございます。

法令や約款上の需給地点適否判定ではないため、需給地点によっては別途協議が必要になる可能性がございます。

小柱引込、引込線亘長、上空通過などはシミュレーション結果によらず、申込後設計要となる場合があります。

想定期間の起算は、東京電力PGの申込受付完了日からとなります。

[事前協議申込はこちら](#)
[標準工程日数はこちら](#)
 © TEPCO Power Grid, Inc.

表示項目説明

	項目名称	内容
A	電気工事店名・ユーザー名	ログイン中の電気工事店名およびユーザー名を表示します。

入力項目説明

	項目名称	内容
B	支社	支社を入力してください。
C	電柱標識	電柱標識を入力してください。
D	柱番号	柱番号を入力してください。
E	契約種別	契約種別を選択してください。
F	契約容量(kVA)	契約容量(kVA)を入力してください。 ※1kVA=10Aです。
G	軒数	軒数を入力してください。

ボタン・リンク説明

	項目名称	内容
H	戻る	総合メニューへ遷移します。
I	支社が分かる方／支社が分からない方	入力項目を切り替えます。
J	実行	入力した条件でシミュレーション結果を表示します。
K	クリア	入力内容を削除します。
L	事前協議申込はこちら	「供給事前協議申込WEB受付サービス」を表示します。
M	標準工程日数はこちら	「託送供給申込におけるお申込み受付から送電までの所要日数」を表示します。

支社が分からない方

① 戻る ② 工期シミュレーション ③ 工事店名 ST607001 さま

④ ☐ 支社が分かる方 ☒ 支社が分からない方

⑤ エリア ⑥ 電柱標識 ⑦ 支社 ⑧ 柱番号 ⑨ 契約種別 ⑩ 契約容量 (kVA) ⑪ 軒数 ⑫ 実行 ⑬ クリア

⑭ 事前協議申込はこちら
⑮ 標準工程日数はこちら

© TEPCO Power Grid, Inc.

入力エリアにシミュレーション情報を入力してください

シミュレーション対象は、低圧かつ架空供給工事に限ります。高圧、太陽光、地中工事は対象外です。システム操作時点での想定期間をお知らせする機能であり、実際の工期と差違が出る可能性がございます。

法令や約款上の需給地点適否判定ではないため、需給地点によっては別途協議が必要になる可能性がございます。

小柱引込、引込線亘長、上空通過などはシミュレーション結果によらず、申込後設計要となる場合があります。

想定期間の起算は、東京電力P Gの申込受付完了日からとなります。

表示項目説明

	項目名称	内容
A	電気工事店名・ユーザー名	ログイン中の電気工事店名およびユーザー名を表示します。

入力項目説明

	項目名称	内容
B	エリア	エリア(都県)を選択してください。
C	電柱標識	電柱標識を入力してください。
D	支社	エリア(都県)を選択してください。
E	柱番号	柱番号を入力してください。
F	契約種別	契約種別を選択してください。
G	契約容量(kVA)	契約容量(kVA)を入力してください。 ※1kVA=10Aとなります。
H	軒数	軒数を入力してください。

ボタン・リンク説明

	項目名称	内容
I	戻る	総合メニューへ遷移します。
J	支社が分かる方／支社が分からない方	検索入力項目を切り替えます。
K	実行	入力した条件でシミュレーション結果を表示します。
L	クリア	入力内容を削除します。
M	事前協議申込はこちら	「供給事前協議申込WEB受付サービス」を表示します。
N	標準工程日数はこちら	「託送供給申込におけるお申込み受付から送電までの所要日数」を表示します。

■ 結果画面

設計の要否によって、表示内容を変更します。

■ 設計が必要となる場合

詳細は以下の「工期シミュレーション結果(設計要)」を参照ください。

■ 設計が不要となる場合

詳細は「[工期シミュレーション結果\(引込線以下工事\)](#)」(45ページ)を参照ください。

■ 入力した条件でシミュレーションができない場合

詳細は「[工期シミュレーション結果\(対象設備なし\)](#)」(46ページ)を参照ください。

工期シミュレーション結果(設計要)

東京電力株式会社
託送サービス総括 さま

戻る 工期シミュレーション

再入力

シミュレーション結果

設計要

変圧器工事が必要

想定期間
～東京電力パワーグリッドへの申込から送電まで～

4ヶ月程度

シミュレーション結果によらず早めにお申込ください。

【2025/01/26 13:27 時点】

▼ 占用申請等が必要な場合の想定期間

河川 +3ヶ月程度	官公有地 +3ヶ月程度
国道 +4ヶ月程度	文化財 +3ヶ月程度
都・県道 +3ヶ月程度	商店街 +1ヶ月程度
鉄道 +1ヶ月程度	砂防 +3ヶ月程度
民地交渉 +1ヶ月程度	

～工期シミュレーション機能の注意点～

- ・シミュレーション対象は、低圧かつ架空供給工事に限ります。高圧、太陽光、地中工事は対象外です。
- ・システム操作時点での想定期間をお知らせする機能であり、実際の工期と差違が出る可能性がございます。
- ・法令や約款上の需給地点適否判定ではないため、需給地点によっては別途協議が必要になる可能性がございます。
- ・小柱引込、引込線巨長、上空通過などはシミュレーション結果によらず、申込後設計要となる場合があります。
- ・想定期間の起算は、東京電力PGの申込受付完了日からとなります。

事前協議申込はこちら

標準工程日数はこちら

© TEPCO Power Grid, Inc.

表示項目説明

	項目名称	内容
A	シミュレーション結果	設計要否／設計理由を表示します。
B	想定期間	申込受付完了※から送電完了までの想定期間を表示します。 ※東京電力パワーグリッドが申込を受付した時点
C	シミュレーション実施日時	シミュレーションを実施した時点の日時を表示します。
D	占用申請等が必要な場合の想定期間	占用申請等が必要な場合の想定期間を表示します。

ボタン・リンク説明

	項目名称	内容
E	再入力	シミュレーション条件を再入力できるように、入力項目を活性化します。
F	事前協議申込はこちら	「供給事前協議申込WEB受付サービス」を表示します。
G	標準工程日数はこちら	「託送供給申込におけるお申込み受付から送電までの所要日数」を表示します。

2025.9 目的外使用・複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社

44

工期シミュレーション結果(引込線以下工事)

戻る

工期シミュレーション

東京電力株式会社
託送サービス総括 さま

D

再入力

A

シミュレーション結果

引込線以下工事

現場確認が必要な場合があるため、シミュレーション結果によらず早めにお申込ください。

B

【2025/01/26 13:28 時点】

C

▼ 占用申請等が必要な場合の想定期間

河川	+ 3ヶ月程度	官公用地	+ 3ヶ月程度
国道	+ 4ヶ月程度	文化財	+ 3ヶ月程度
都・県道	+ 3ヶ月程度	商店街	+ 1ヶ月程度
鉄道	+ 1ヶ月程度	砂防	+ 3ヶ月程度
民地交渉	+ 1ヶ月程度		

～工期シミュレーション機能の注意点～

- ・シミュレーション対象は、低圧かつ架空供給工事に限ります。高圧、太陽光、地中工事は対象外です。
- ・システム操作時点での想定期間をお知らせする機能であり、実際の工期と差違が出る可能性がございます。
- ・法令や約款上の需給地点適否判定ではないため、需給地点によっては別途協議が必要になる可能性がございます。
- ・小柱引込、引込線巨長、上空通過などはシミュレーション結果によらず、申込後設計要となる場合があります。
- ・想定期間の起算は、東京電力P Gの申込受付完了日からとなります。

E

事前協議申込はこちら

標準工程日数はこちら

F

© TEPCO Power Grid, Inc.

表示項目説明

	項目名称	内容
A	シミュレーション結果	想定工事内容を表示します。
B	シミュレーション実施日時	シミュレーションを実施した時点の日時を表示します。
C	占用申請等が必要な場合の想定期間	占用申請等が必要な場合の想定期間を表示します。

ボタン・リンク説明

	項目名称	内容
D	再入力	シミュレーション条件を再入力できるように、入力項目を活性化します。
E	事前協議申込はこちら	「供給事前協議申込WEB受付サービス」を表示します。
F	標準工程日数はこちら	「託送供給申込におけるお申込み受付から送電までの所要日数」を表示します。

工期シミュレーション結果(対象設備なし)

戻る

工期シミュレーション

工事店名
ST607001 さま

再入力

シミュレーション結果

入力いただいた供給設備を確認できませんでした

お手数ですが入力内容をご確認ください

【2025/04/29 14:22 時点】

シミュレーション対象は、低圧かつ供給工事の申込に限ります。高圧、太陽光、地中工事は対象外です。システム操作時点での想定期間をお知らせする機能であり、実際の工期と差違が出る可能性があります。法令や約款上の需給地点適否判定ではございません。需給地点によっては別途協議が必要になる可能性があります。

電柱設備容量を確認する機能であり、引込線巨長、小柱引込、上空通過などのケースはシミュレーション対象外となります。

想定期間の起算は、東京電力P Gの申込受付完了日からとなります。

事前協議申込はこちら

標準工程日数はこちら

© TEPCO Power Grid, Inc.

■シミュレーションができない場合は、以下をお試しください

- ・「再入力」ボタンを押下のうえ、条件を再入力
- ・入力に誤りがないか確認

表示項目説明

	項目名称	内容
A	シミュレーション結果	シミュレーション結果を表示します。
B	シミュレーション実施日時	シミュレーションを実施した時点の日時を表示します。

ボタン・リンク説明

	項目名称	内容
C	再入力	シミュレーション条件を再入力できるよう、入力項目を活性化します。
D	事前協議申込はこちら	「供給事前協議申込WEB受付サービス」を表示します。
E	標準工程日数はこちら	「託送供給申込におけるお申込み受付から送電までの所要日数」を表示します。

補助説明



3-1. よくある質問

【システム全般】

Q 「工程見える化システム」とは何ですか？

A 電気工事店のみなさまからお申込みいただいた、新增設申込の工程などをWebで確認できるシステムです。

Q 「工程見える化システム」を使うためには、どんな手続きが必要ですか？

A 工程見える化システムをご利用いただくには、弊社の「Web申込システム」のユーザー登録が必要です。
すでにユーザー登録がお済みで、Web申込システムをご利用中の方は、新たにユーザー登録いただく必要はありません。

Q 「工程見える化システム」には、どんな機能がありますか？

A 「工程進捗公開」と「工期シミュレーション」の2機能をご提供します。
工程進捗公開は、申込後の工程状況や各種予定日などを確認できる機能です。
工期シミュレーションは、申込前に設計の要否や送電完了までの想定期間を試算できる機能です。

Q 「工程見える化システム」は、スマートフォンやタブレットでも利用できますか？

A 推奨環境で使用しているパソコン、タブレット、スマートフォンでご利用いただけます。
スマートフォン専用の画面もご用意しています。
<推奨環境>
パソコン Windows10/11 Edge、Chrome、Firefox
 macOS13 Safari
スマートフォン Android Chrome
 iOS Safari
それぞれ最新バージョンでのご利用を推奨します。

Q 「工程見える化システム」を利用しないと、申込や落成登録ができなくなるのですか？

A 工程見える化システムを導入しても、申込登録や落成登録の作業や操作するシステムは変わりません。

Q 「工程見える化システム」の利用可能時間は？

A ご利用いただける時間は、以下のとおりです。
工程進捗公開機能 : 6時から24時まで
工期シミュレーション機能 : 8時から22時まで

Q ユーザーIDやパスワードを忘れてしまいました。どうすればいいですか？

A Web申込システムの「ユーザID照会申請画面」や「パスワード再設定申請画面」で手続きを行ってください。

Q 「工程見える化システム」に表示される期日や期間は、確約されますか？

A 表示する時期や期間は、あくまでも想定です。
送電希望時期が決まっている場合は、早めにお申込みいただきますよう、お願いします。

【工程進捗公開機能】

Q Newマークはどのような場合に表示しますか？

A 前日から変更があった項目にNewマークを表示します。
表示期間は「翌営業日まで」となります。
【例:金曜に変更→土曜から月曜までNewマークを表示します】

Q 関連申込が「工程進捗一覧画面」に表示されていない

A 工程進捗一覧画面は代表申込のみを表示する初期設定になっております。
画面右上の「すべての申込」を選択し検索ボタンを押下することで、関連申込を含んだ全ての申込を一覧表示します。

Q 他社(電気工事店)の申込情報は確認できますか？

A 他社の申込情報は確認できません。

Q 同一工事店の他ユーザーが申込した情報は確認できますか？

A 同一工事店の情報はご確認いただけます。
なお、「担当者」で表示を絞り込むことも可能です。

【工期シミュレーション機能】

Q 小柱引込や引込線こう長大(要建柱)などのケースもシミュレーションできますか？

A 電柱設備容量を確認する機能であり、特殊なケースはシミュレーション対象外となります。

Q 支社跨ぎのシミュレーションはできますか？

A 支社跨ぎのシミュレーションは実施いただけません。
「入力いただいた供給設備を確認できませんでした」とメッセージを表示します。

Q マイナスシミュレーションはできますか？

A 実施いただけません。

Q 新設柱(建替柱を含む)はいつからシミュレーション可能になりますか？

A 弊社システムに新設柱の情報が登録された後、シミュレーション可能となります。

Q シミュレーション結果「引込線以下工事」の想定期間は確認できますか？

A 引込線以下工事の想定期間は弊社HPの「託送供給申込におけるお申込み受付から送電までの所要日数」をご確認ください。
工期シミュレーション画面右下の「標準工程日数はこちら」から遷移することも可能です。

Q 最短の工事空き状況は確認できますか？

A 工事空き状況は弊社HPの「供給工事状況見える化」からご確認ください。

【ログイン機能】


Q Web申込システムと工程見える化システムは同時に使えますか？

A 2つのシステムを同時にご利用いただけます。



Q 複数のデバイスから同じユーザーIDで工程見える化システムにアクセスするとどうなりますか？

A 後からアクセスしたデバイスを優先します。先にアクセスしていたデバイスはログアウトします。




Q パスワードを何回間違えるとロックがかかりますか？

A 連続して7回間違えるとロックがかかります。

Q Web申込システム、工程見える化システムのいずれかでパスワードロックが掛かった場合、どうなりますか？

A 双方のシステムにロックが掛かります。




Q Web申込システムと工程見える化システムの、パスワード間違い回数はどうカウントしますか？

Web申込システムと工程見える化システム共通で累積します。

A


Web申込システム




連続4回
パスワード間違い



工程見える化



連続3回
パスワード間違い



計 連続7回となり
ロック

Q 工程見える化システムで利用登録、ユーザー情報変更、ユーザーID照会はできますか？

A 工程見える化システムではできません。Web申込システムで実施してください。

改訂履歴

改訂版数	改訂箇所	制定・改定年月日	改訂内容
初版	-	2025/6	制定
改訂	2-4. 工程進捗状況の確認	2025/9	「進捗状況(ステータス)表示方法」追記



フクリー(Fukuri) ©東京電力パワーグリッド(株)

この操作ガイド、キャラクター:フクリー(Fukuri)の著作権は、東京電力パワーグリッド株式会社に帰属します。複製、転載、および「工程見える化システム」の操作ガイド以外の目的での使用はご遠慮ください。



東京電力パワーグリッド
